



HANDLUNGS- UND MASSNAHMENKONZEPT ZUR RADVERKEHRSFÖRDERUNG IM STADTGEBIET ARNSBERG

Beiträge zur Stadtentwicklung | Info 39



Oeventrop

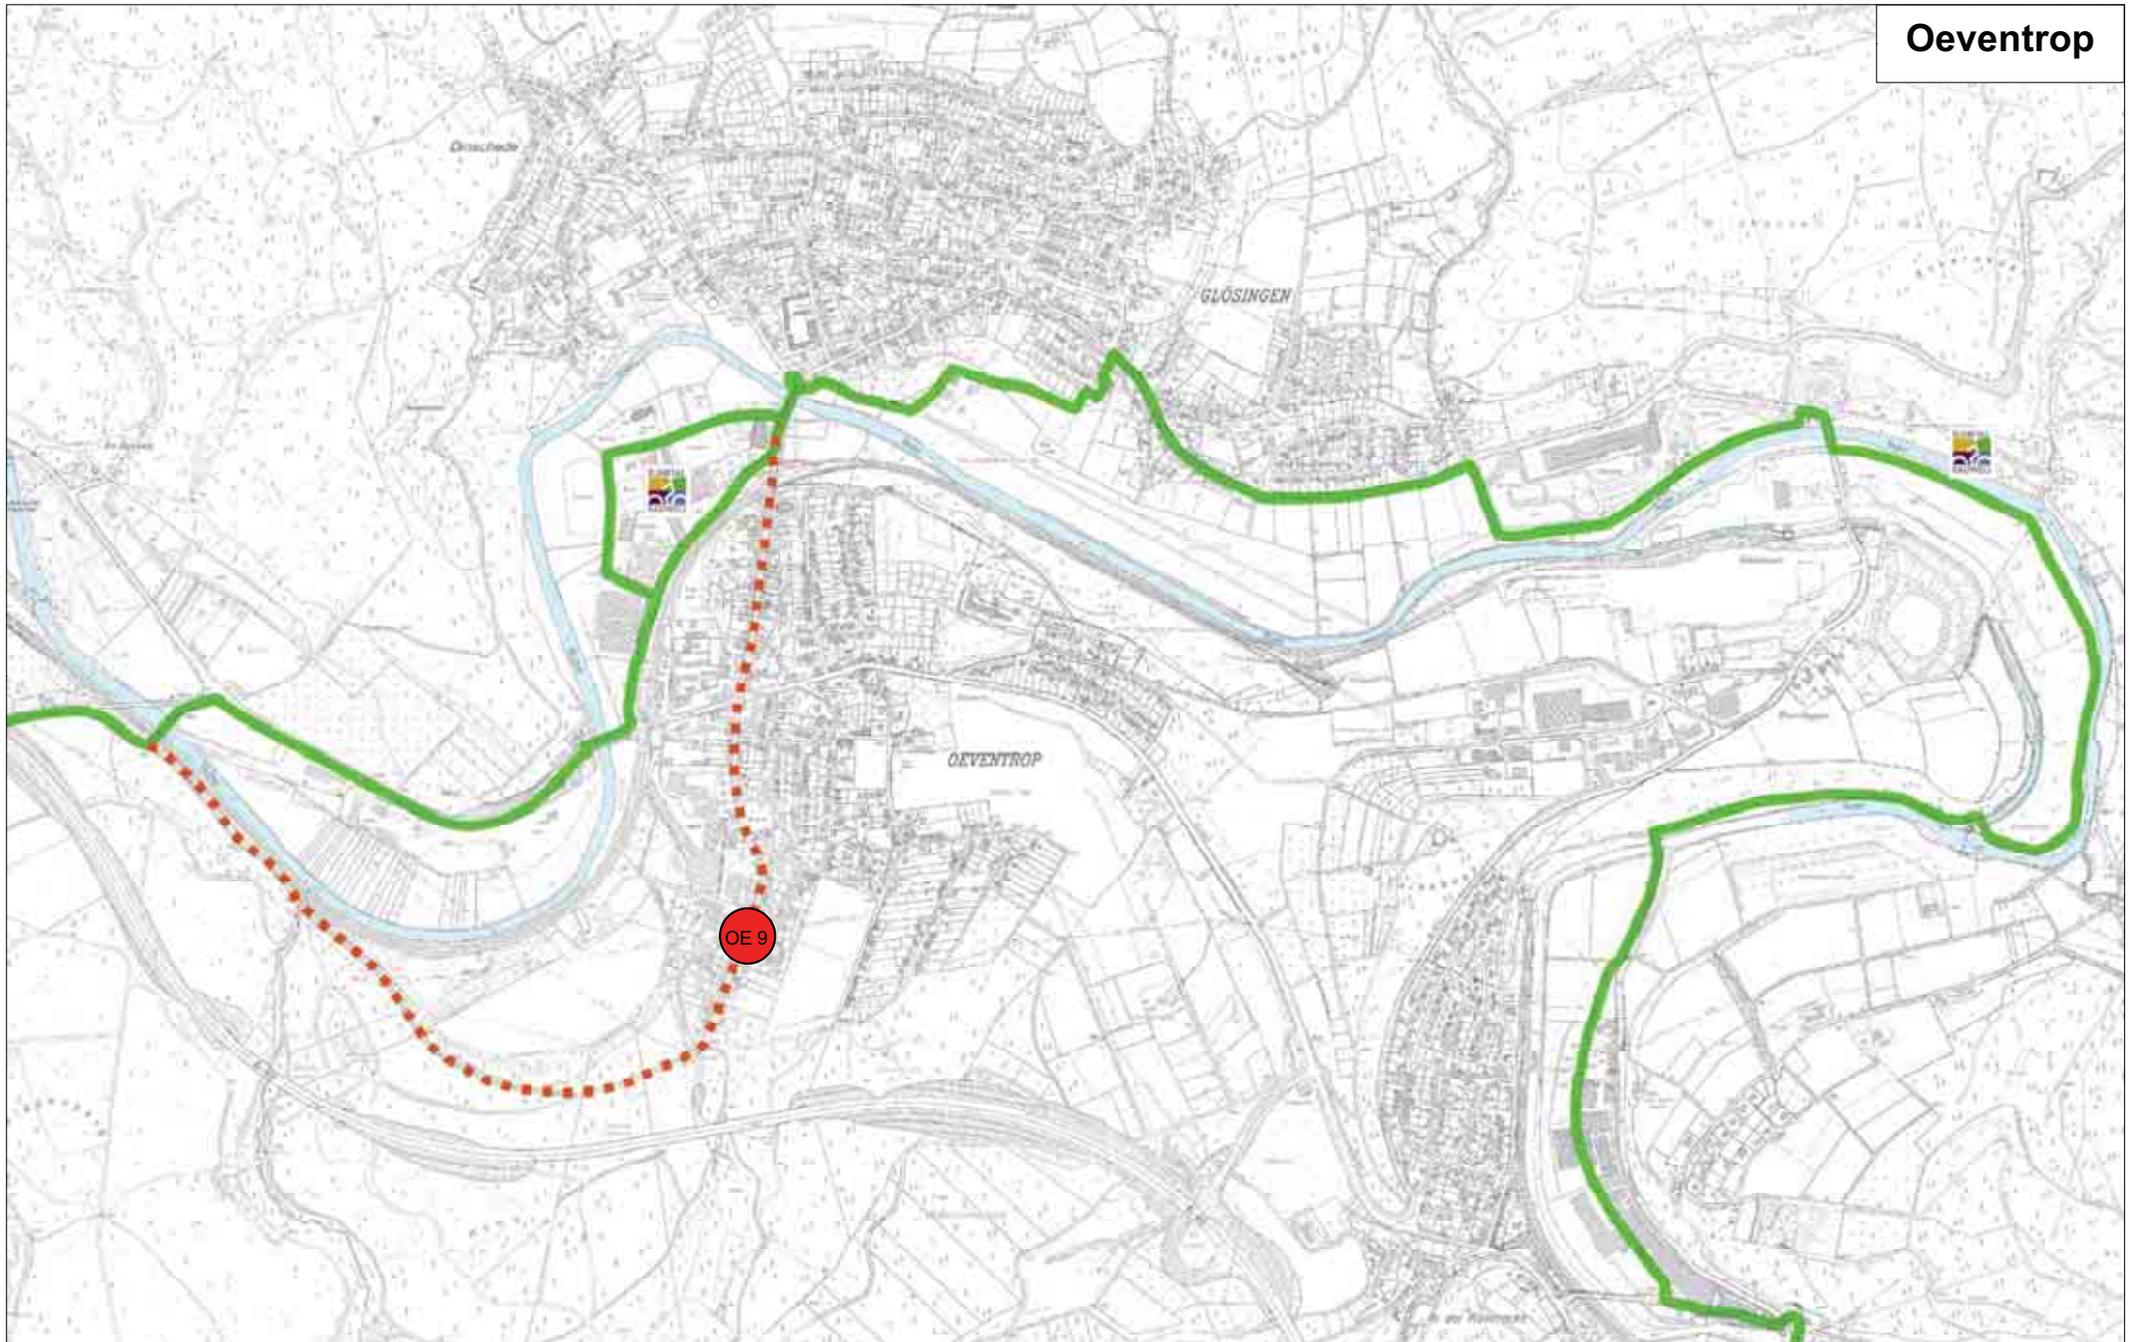


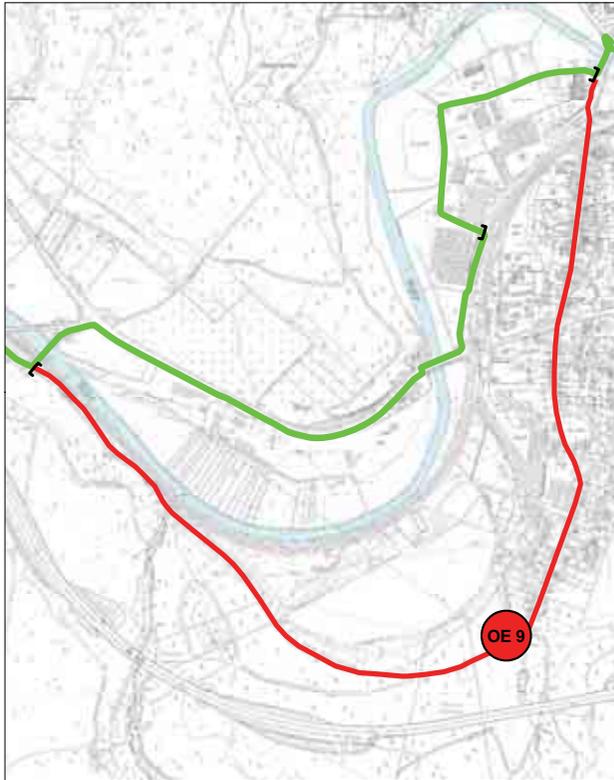

Ortsteil:	Oeventrop
Maßnahme:	OE 9
Bezeichnung:	Alternativstrecke (Nebenstrecke Landesweites Radwegnetz) „Zur Hünenburg“
Einzelprojekte:	<ul style="list-style-type: none"> - Neuausschilderung - Aufnahme im Kartenmaterial etc. - Ggf. Angebotsstreifen prüfen auf sog. Vorrangstraßen
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	<input checked="" type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input type="checkbox"/> abgeschlossen
Nächste Schritte:	Ausschilderung der Nebenstrecke
Stand der Maßnahme:	02.07.2010




Arnsberg

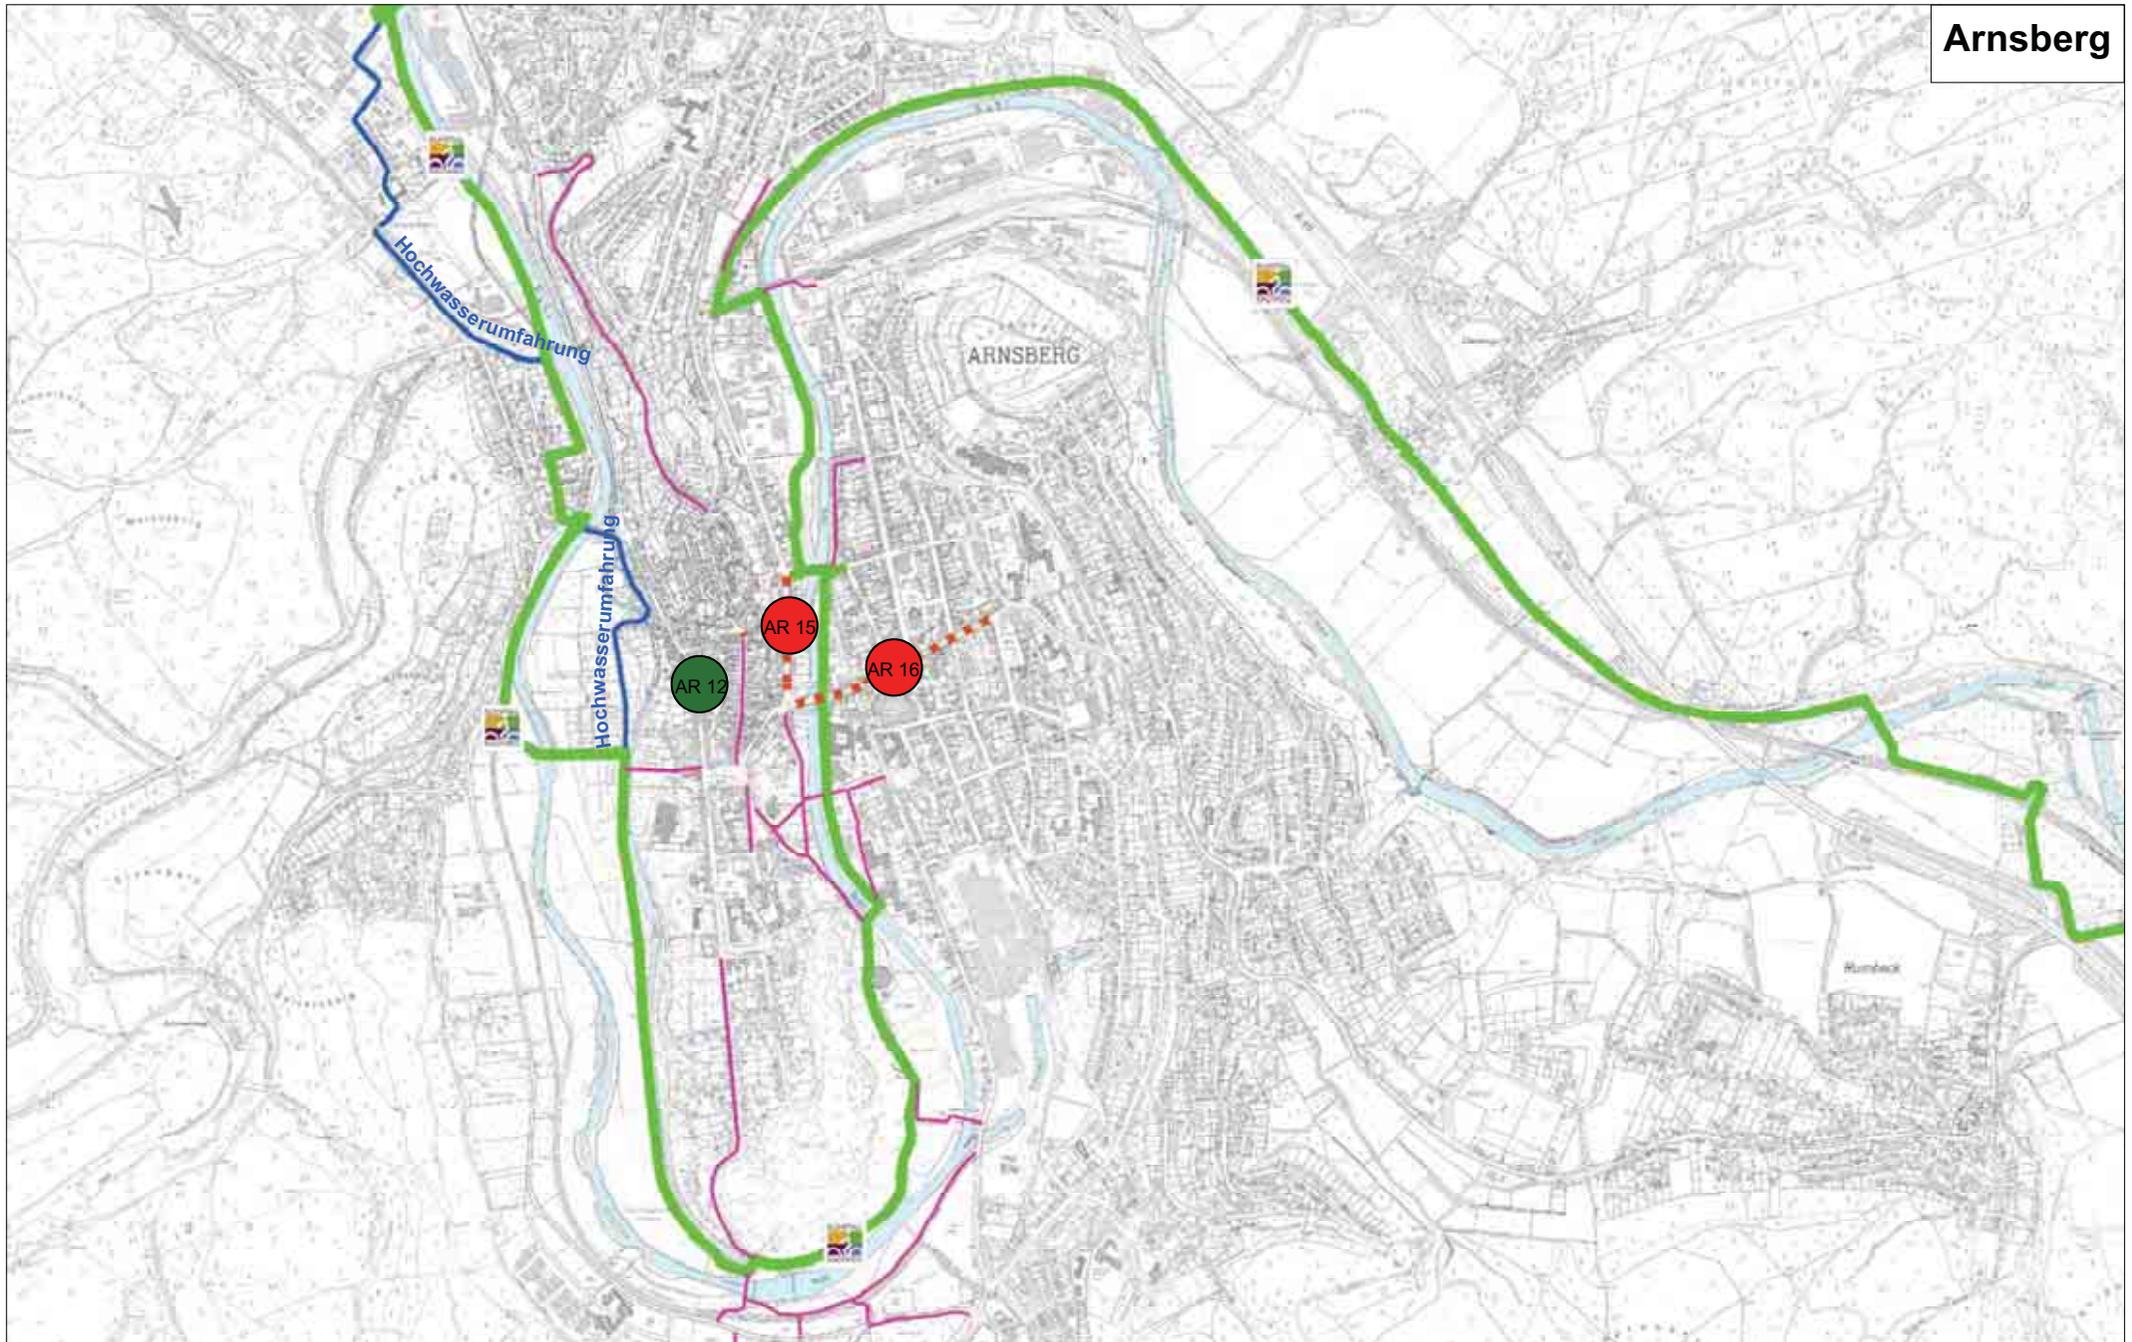





Ortsteil:	Arnsberg und Neheim
Maßnahme:	AR 12 und N 9
Bezeichnung:	Fahrradparker in den Zentren
Einzelprojekte:	a) AR Steinweg / Neumarkt / Klosterbrücke b) Mendener Straße / Fußg.-Zone
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010ff
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input checked="" type="checkbox"/> abgeschlossen Juni 2010
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	02.07.2010



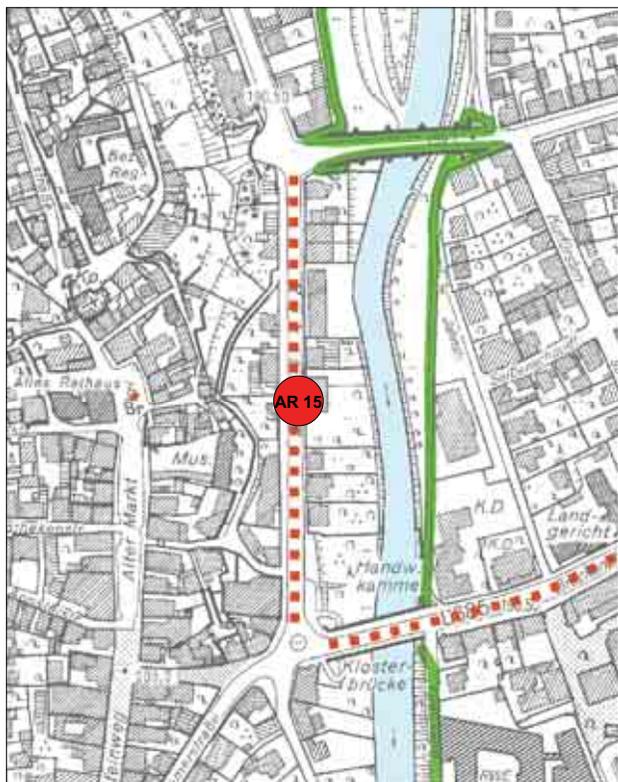


Ortsteil:	Arnsberg
Maßnahme:	AR 15
Bezeichnung:	Radverkehrsanlage zwischen Marienbrücke und Klosterbrücke
Einzelprojekte:	Angebotsstreifen für Radverkehr
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input checked="" type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input type="checkbox"/> abgeschlossen.
Nächste Schritte:	Markierungsplan
Stand der Maßnahme:	15.03.2010




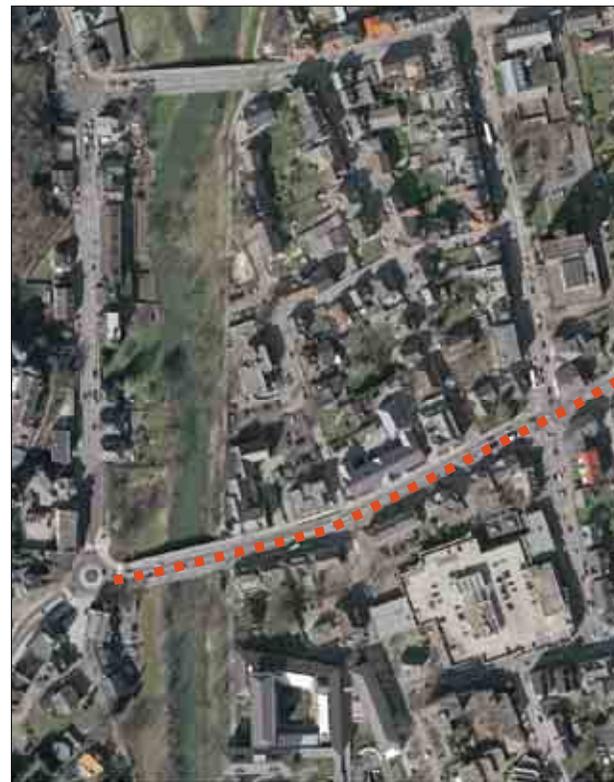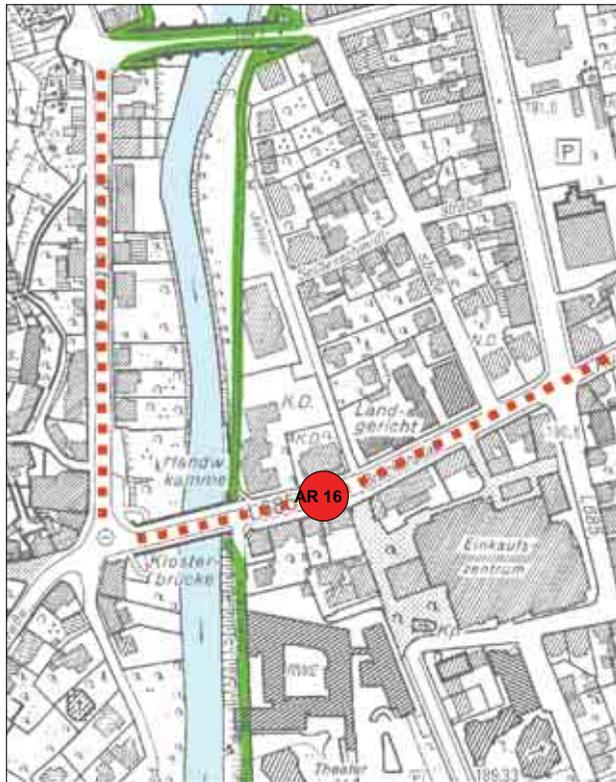

Ortsteil:	Arnsberg
Maßnahme:	AR 16
Bezeichnung:	Radverkehrsanlage zwischen Klosterbrücke und Rumbecker Straße
Einzelprojekte:	Angebotsstreifen für Radverkehr
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2013 ff
Stand der Umsetzung:	<input checked="" type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input type="checkbox"/> abgeschlossen.
Nächste Schritte:	Bauvorbereitung / Finanzierung
Stand der Maßnahme:	15.03.2010




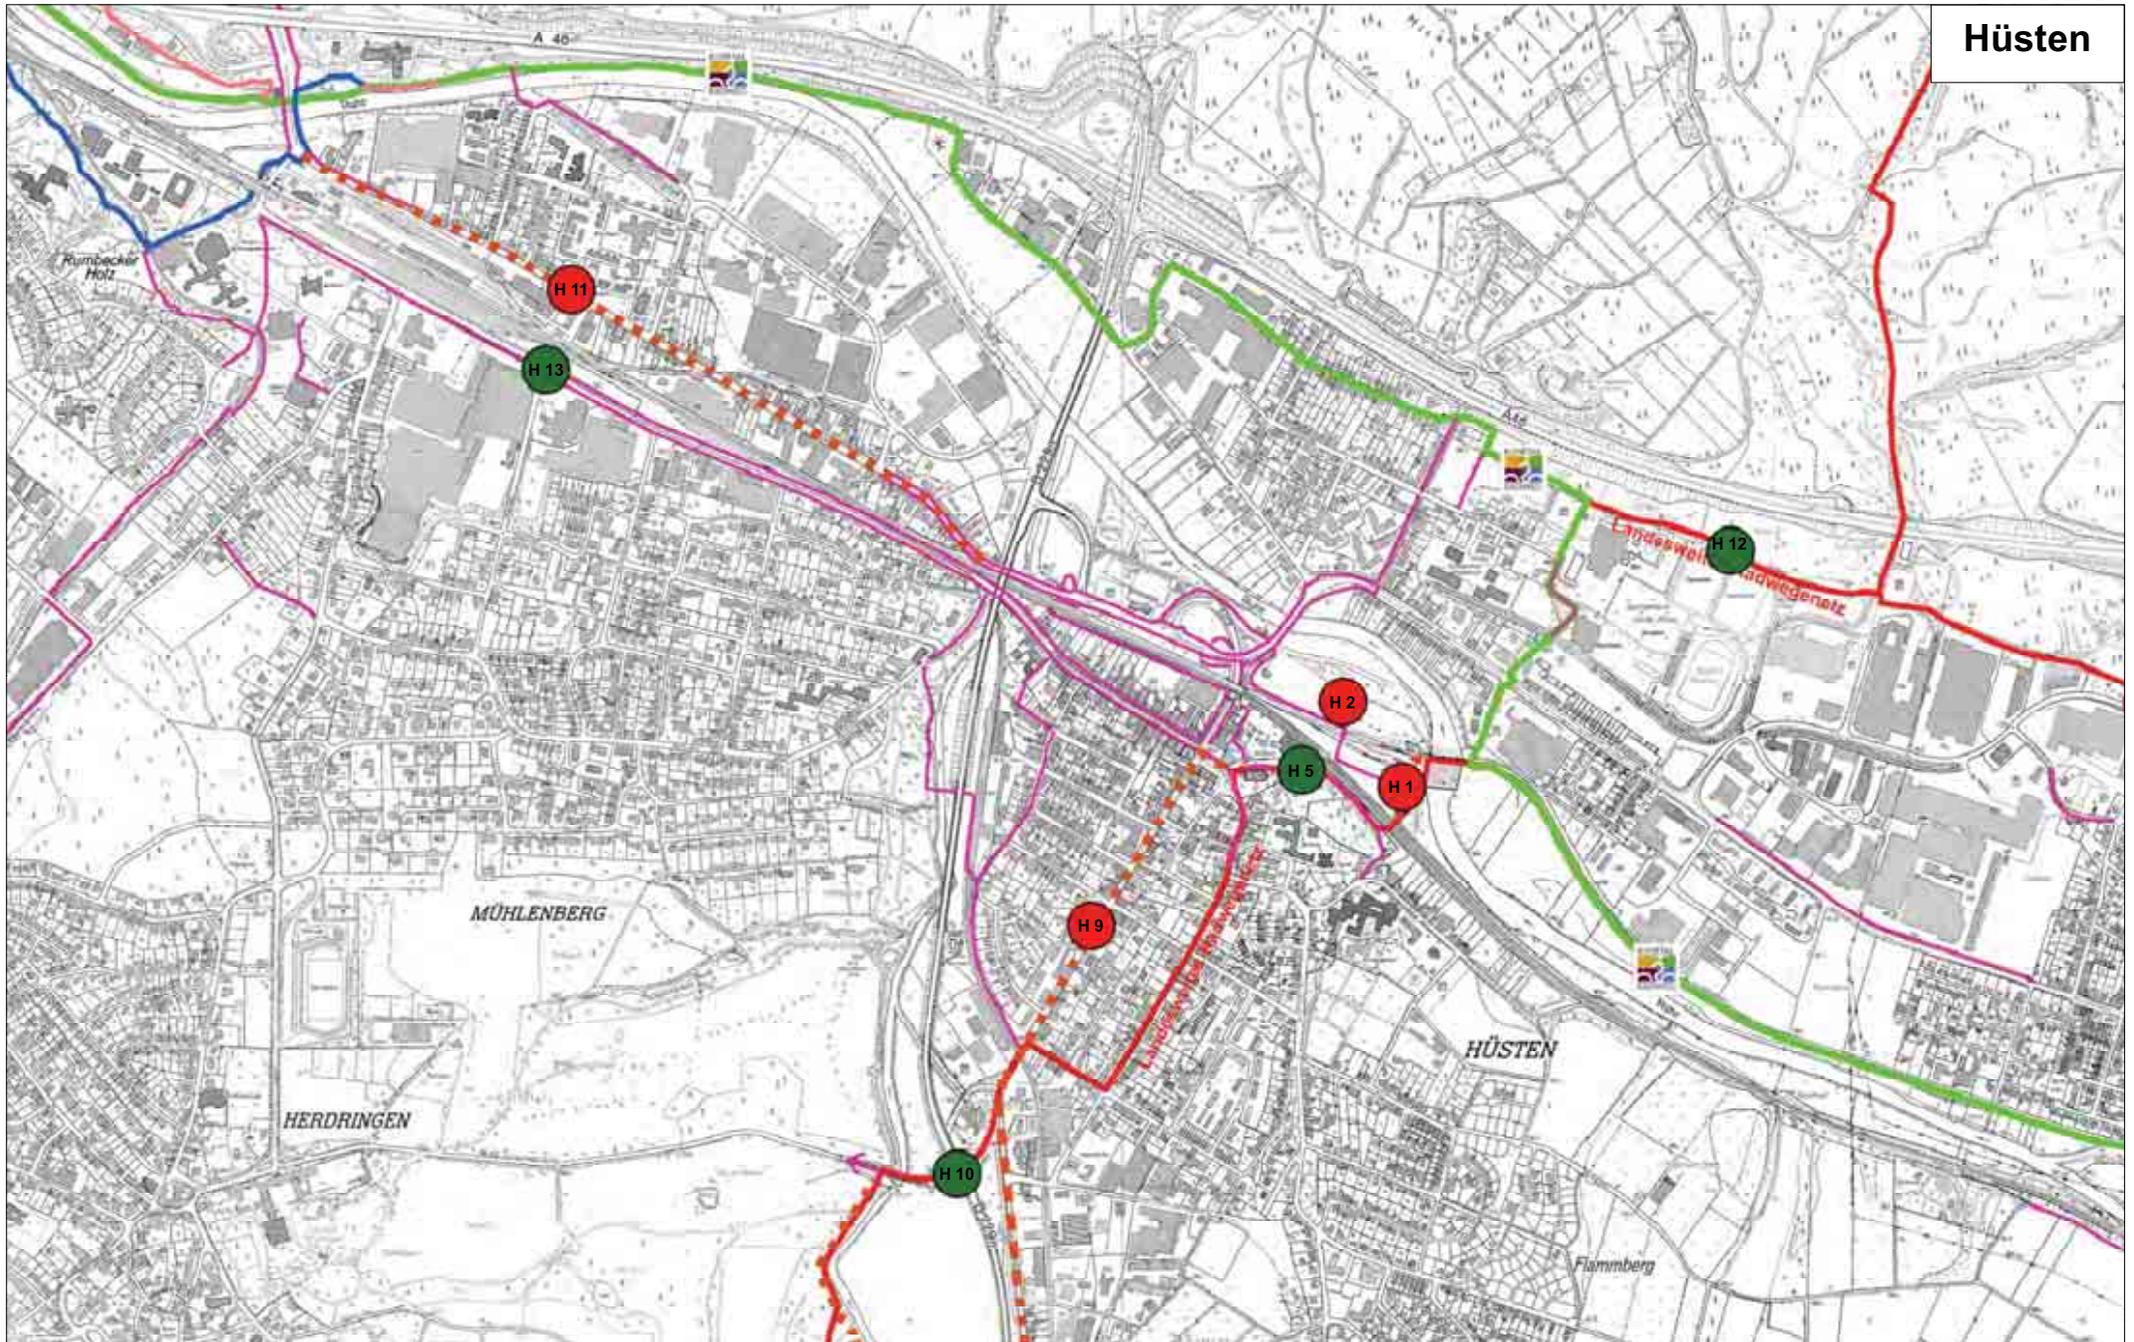

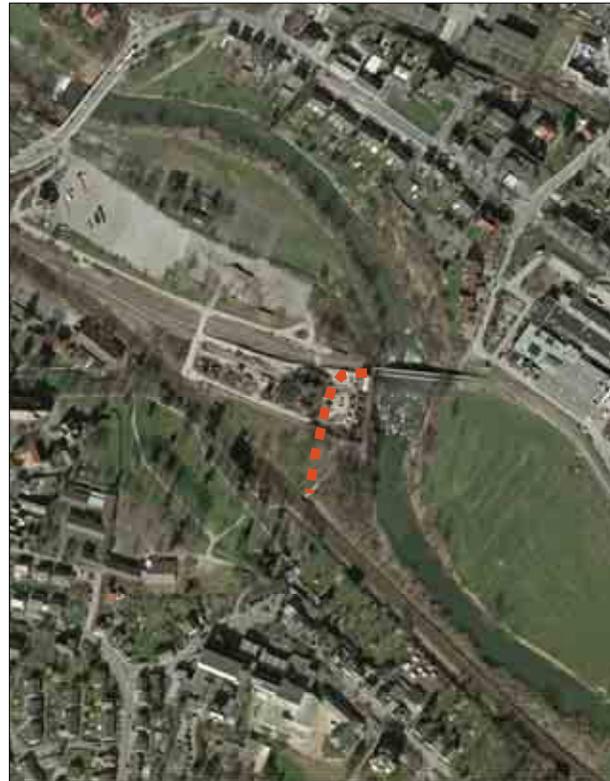



Ortsteil:	Hüsten
Maßnahme:	H 1
Bezeichnung:	Radwegeverbindung Hüsten „Hüstener Wehr“
Einzelprojekte:	a) Verlegung / Verbreiterung der Wegeführung im Bereich Riggerweide / Schrottplatz Rump b) Anlage eines Aufenthaltsbereiches an der Ruhr
Planungs- und Baurecht:	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input checked="" type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input type="checkbox"/> abgeschlossen
Nächste Schritte:	- Zuweisung des Landes wird erwartet
Stand der Maßnahme:	15.03.2010



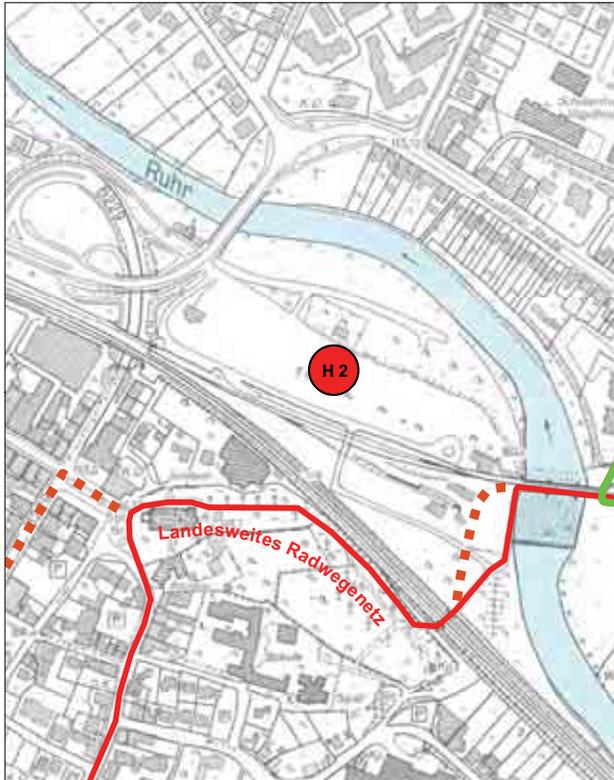



Ortsteil:	Hüsten
Maßnahme:	H 2
Bezeichnung:	Umgestaltung der Riggenweide mit Ausweisung einer Rad-/ Skaterrundstrecke
Einzelprojekte:	
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input checked="" type="checkbox"/> in Planung /Finanzierung <input type="checkbox"/> in Bau <input type="checkbox"/> abgeschlossen
Nächste Schritte:	<ul style="list-style-type: none"> - Abstimmung mit Kirmesgesellschaft - Bauvorbereitung
Stand der Maßnahme:	15.03.2010



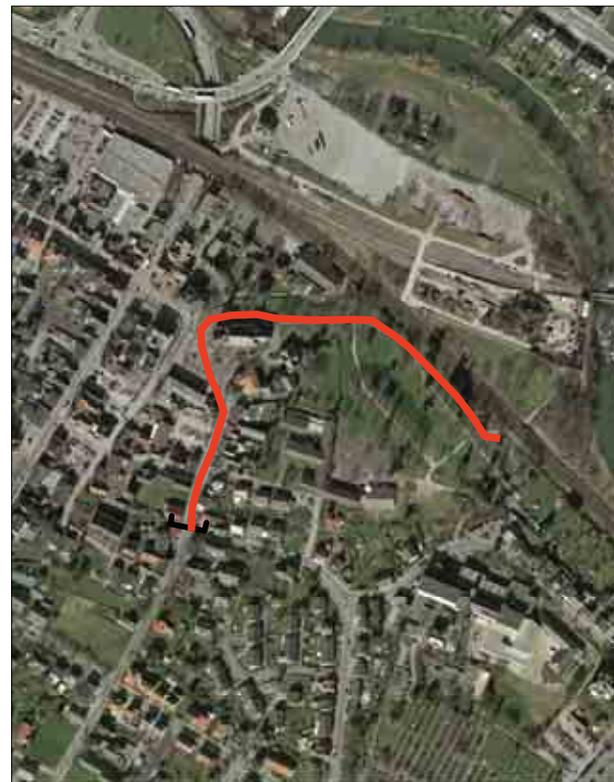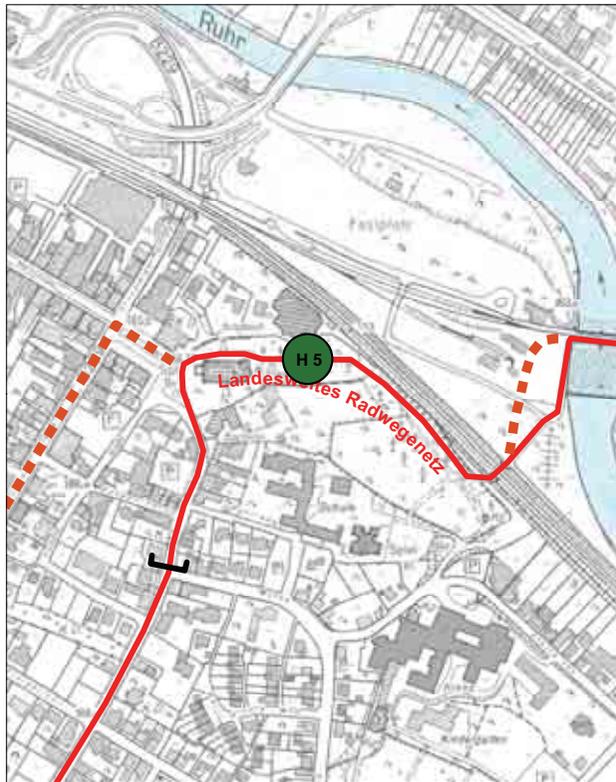


Ortsteil:	Hüsten
Maßnahme:	H 5
Bezeichnung:	Verlegung des Landesweiten Radwegesetzes in den Bereich St. Petri-Kirche / Hüstener Markt
Einzelprojekte:	- Neuausweisung mit (Beschilderung) - Übernahme in Kartenwerk
Planungs- und Baurecht:	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2008
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input checked="" type="checkbox"/> abgeschlossen März 2008
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	02.07.2010



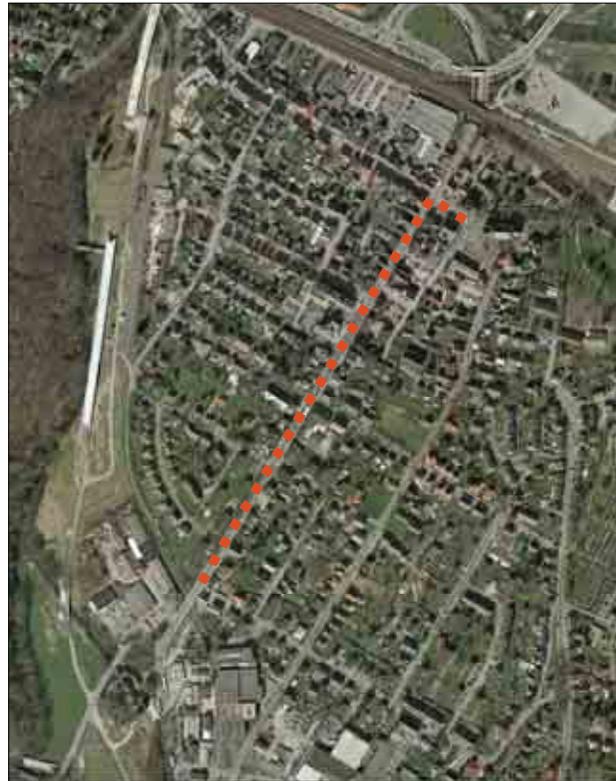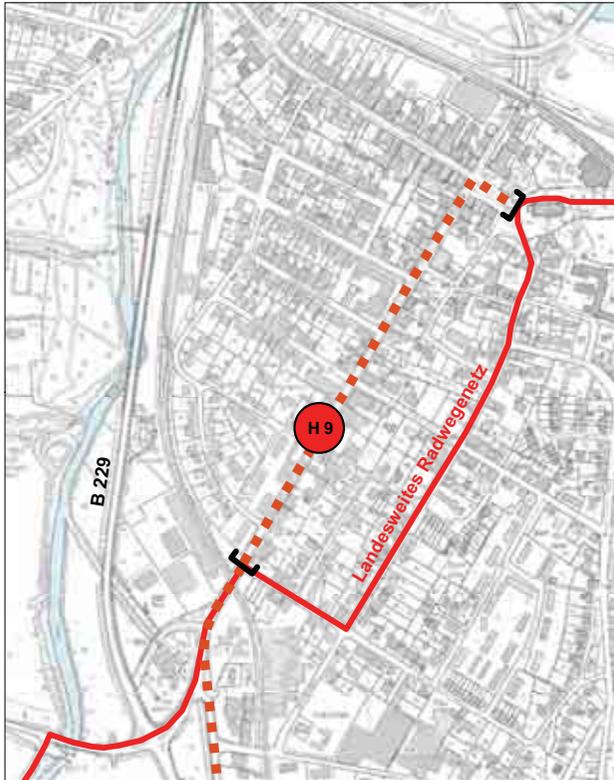



Ortsteil:	Hüsten
Maßnahme:	H 9
Bezeichnung:	Umbau der Heinrich-Lübke-Straße
Einzelprojekte:	Angebotsstreifen für Radverkehr
Planungs- und Baurecht:	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input checked="" type="checkbox"/> in Bau <input type="checkbox"/> abgeschlossen
Nächste Schritte:	- Bauausführung
Stand der Maßnahme:	15.03.2010



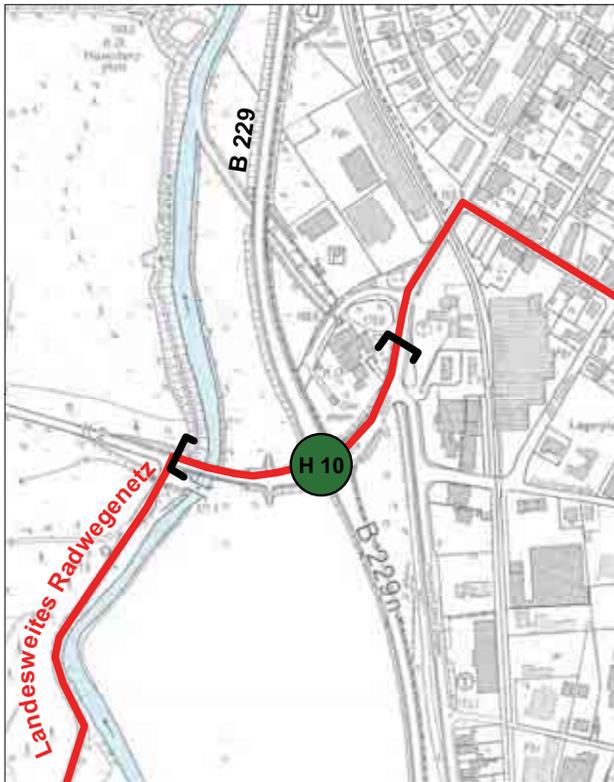


Orsteil:	Hüsten
Maßnahme:	H 10
Bezeichnung:	Radverkehrsanlage Kreisstraße K2/Heinrich-Lübke-Straße
Einzelprojekte:	a) Komb. Rad- und Fußweg
Planungs- und Baurecht:	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2008 / 2009
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input checked="" type="checkbox"/> abgeschlossen Mai 2009
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	29.05.2009



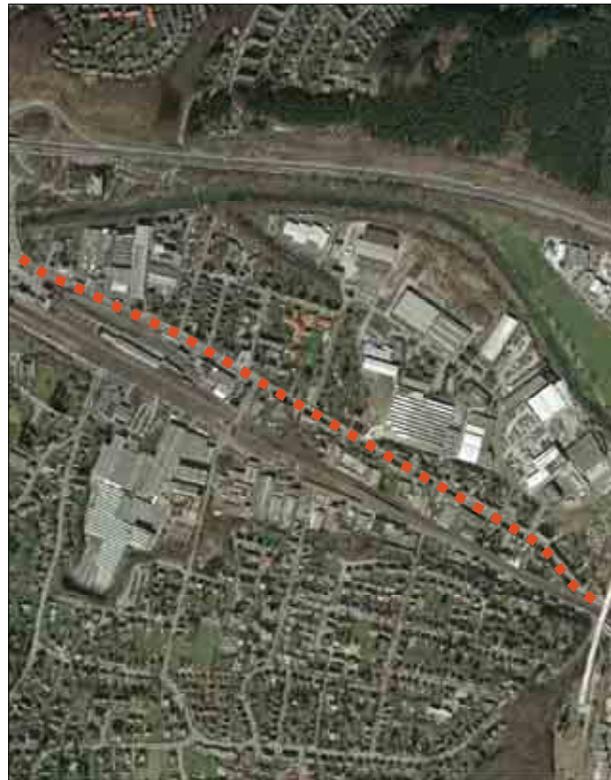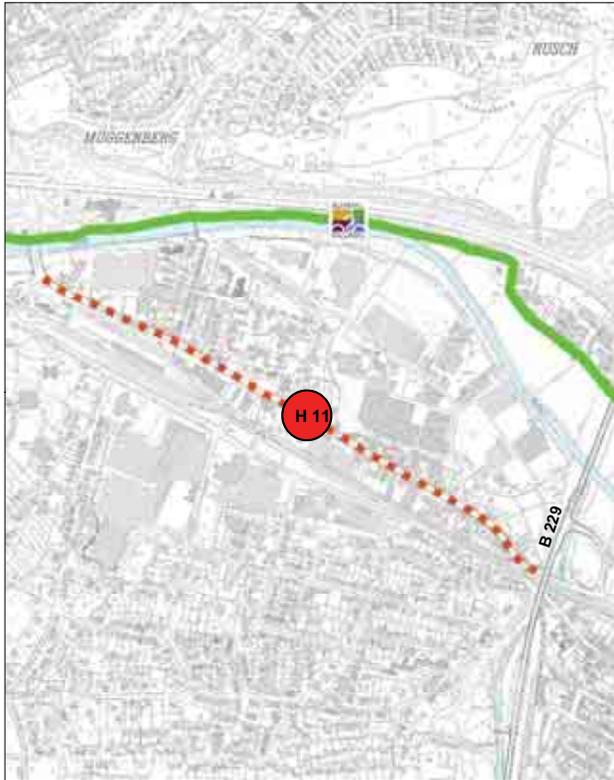

Ortsteil:	Hüsten
Maßnahme:	H 11
Bezeichnung:	Umbau der Bahnhofstraße
Einzelprojekte:	Angebotsstreifen für Radverkehr
Planungs- und Baurecht:	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 / 2011
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input checked="" type="checkbox"/> in Bau <input type="checkbox"/> abgeschlossen
Nächste Schritte:	- Bauausführung
Stand der Maßnahme:	02.07.2010



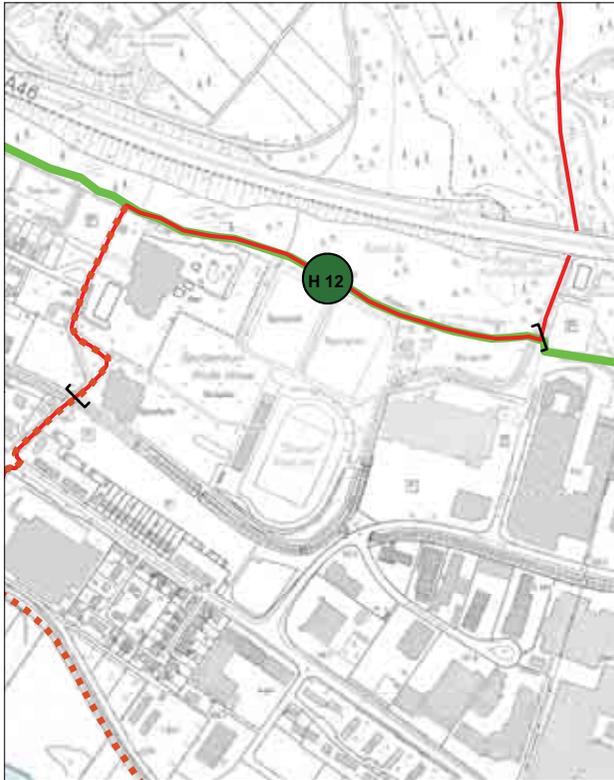

Ortsteil:	Hüsten
Maßnahme:	H 12
Bezeichnung:	Verlegung des R 41 im Bereich Hüsten - Nass
Einzelprojekte:	- Änderung der Linienführung durch Beschilderung;
Planungs- und Baurecht:	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2009
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input checked="" type="checkbox"/> abgeschlossen Mai 2009
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	18.05.2009








Ortsteil:	Hüsten
Maßnahme:	H 13
Bezeichnung:	Radverkehrsführung im Knoten Kleinbahnstraße / Heidestraße
Einzelprojekte:	Radverkehrsanlagen
Planungs- und Baurecht:	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input checked="" type="checkbox"/> abgeschlossen November 2010
Nächste Schritte:	- Radführung im Kreiseln regeln
Stand der Maßnahme:	15.03.2010



Herdringen

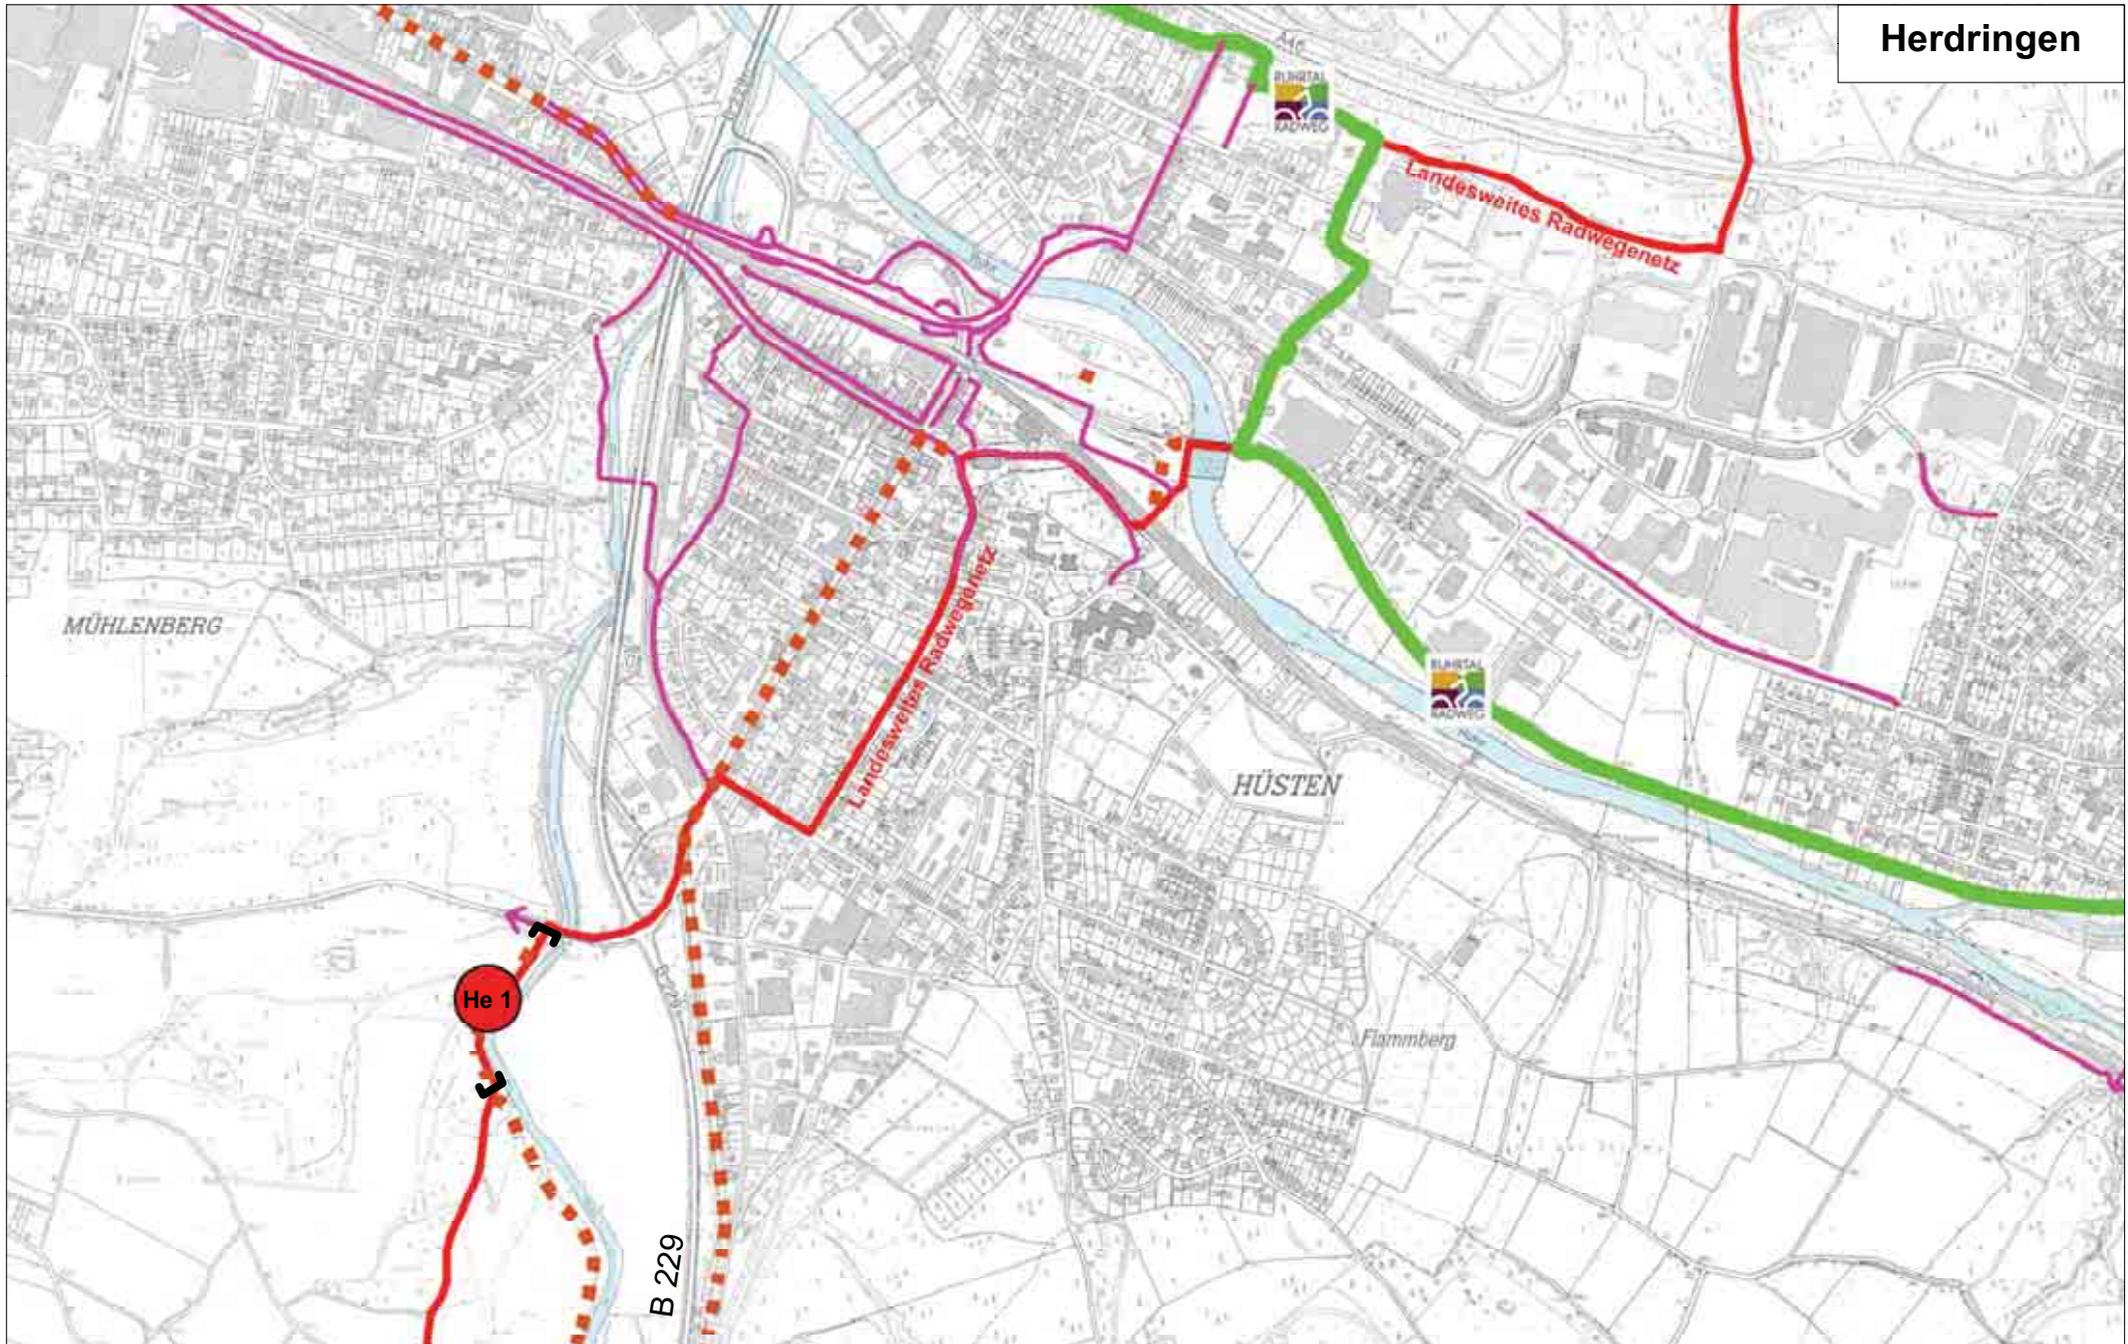


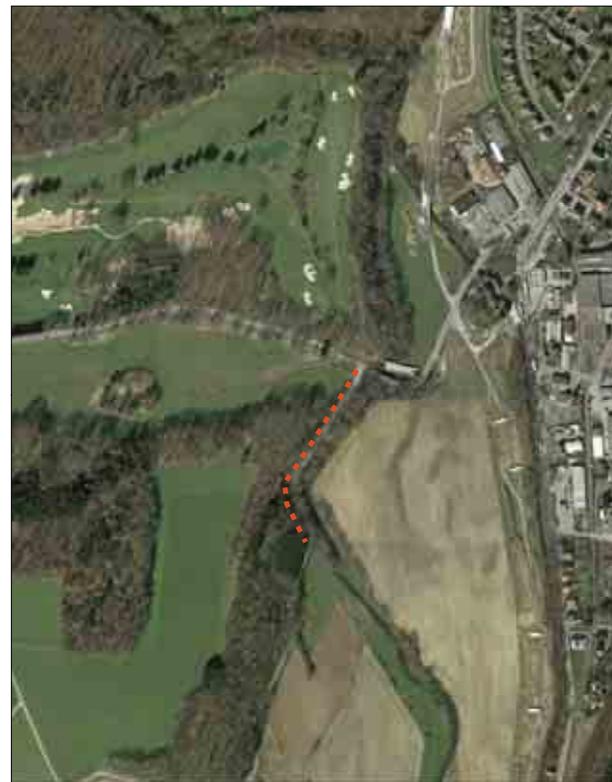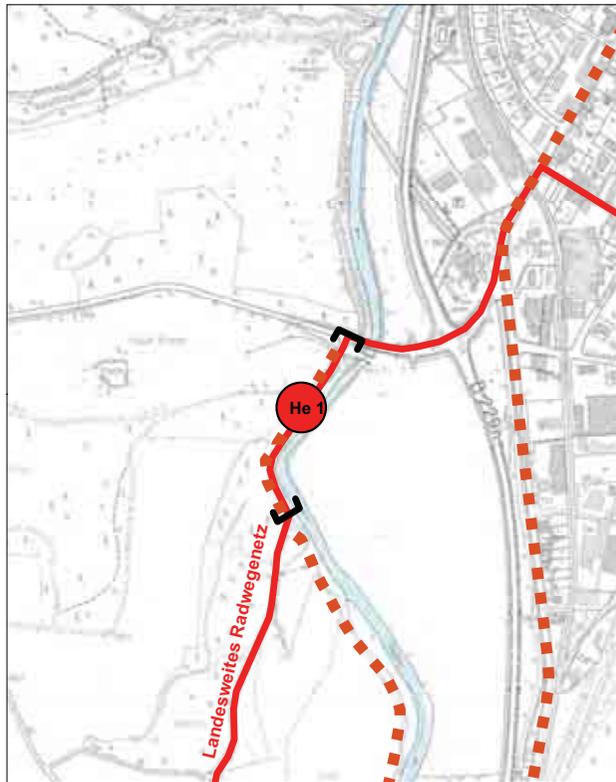


Ortsteil:	Herdringen
Maßnahme:	He 1
Bezeichnung:	Radverkehrsanlage Steinbruchstraße „Habbel“
Einzelprojekte:	Selbständiger Rad- und Fußweg
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff.
Stand der Umsetzung:	<input checked="" type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau/Ausschreibung..... <input type="checkbox"/> abgeschlossen
Nächste Schritte:	Machbarkeitsprüfung
Stand der Maßnahme:	26.10.2009




Müschede

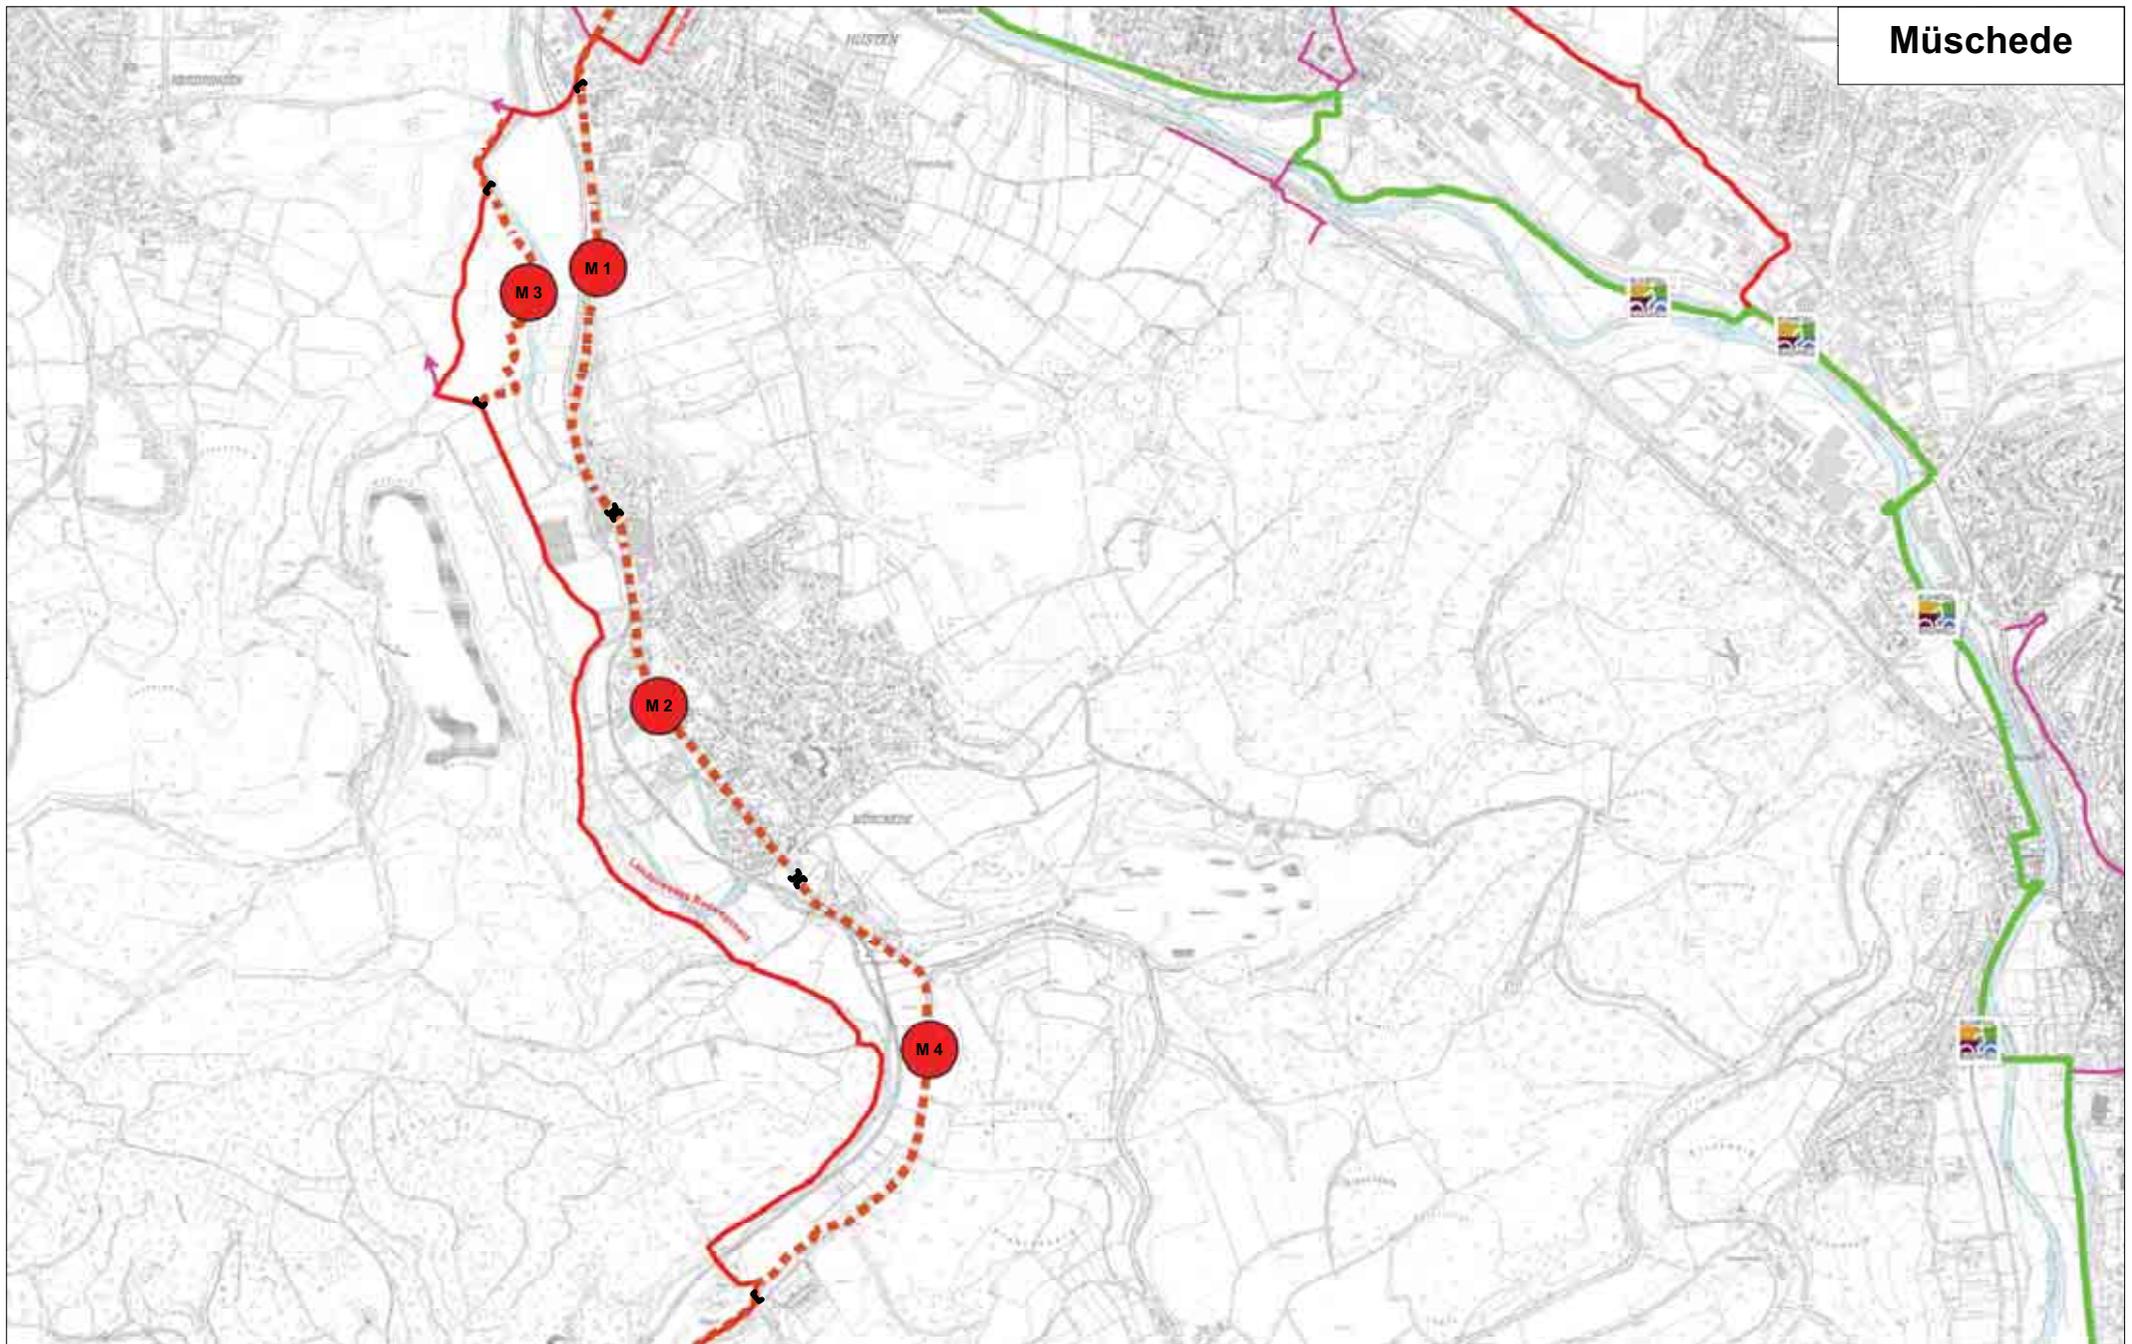

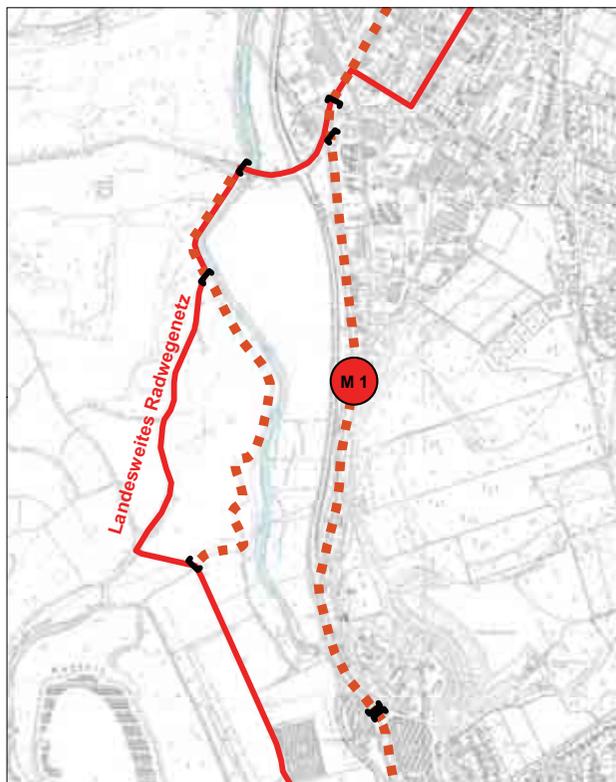


Ortsteil:	Müschede / Hüsten
Maßnahme:	M 1
Bezeichnung:	Radverkehrsanlage Müschede - Hüsten
Einzelprojekte:	a) Komb. Rad- /Fußweg + Rückbau der B 229 -alt-
Planungs- und Baurecht:	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input checked="" type="checkbox"/> in Bau Landesbetrieb Straßenbau NRW <input checked="" type="checkbox"/> abgeschlossen Teilabschnitt innerhalb der O.D Müschede
Nächste Schritte:	- Abschluss der Planung und Umsetzung
Stand der Maßnahme:	26.10.2009



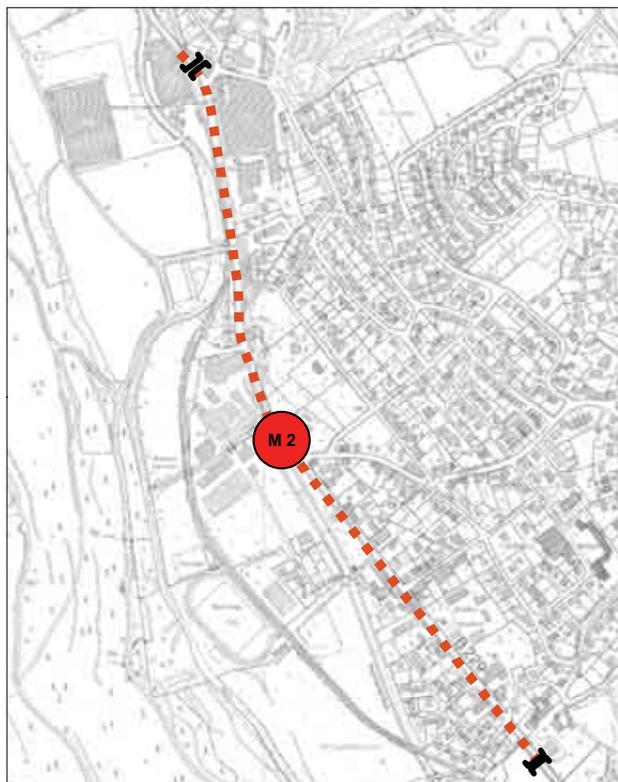


Ortsteil:	Müschede
Maßnahme:	M 2
Bezeichnung:	Radverkehrsanlage Rönkhauser Straße
Einzelprojekte:	Angebotsstreifen für Radverkehr
Planungs- und Baurecht:	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	<input checked="" type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input type="checkbox"/> abgeschlossen
Nächste Schritte:	- Machbarkeitsprüfung
Stand der Maßnahme:	26.10.2009



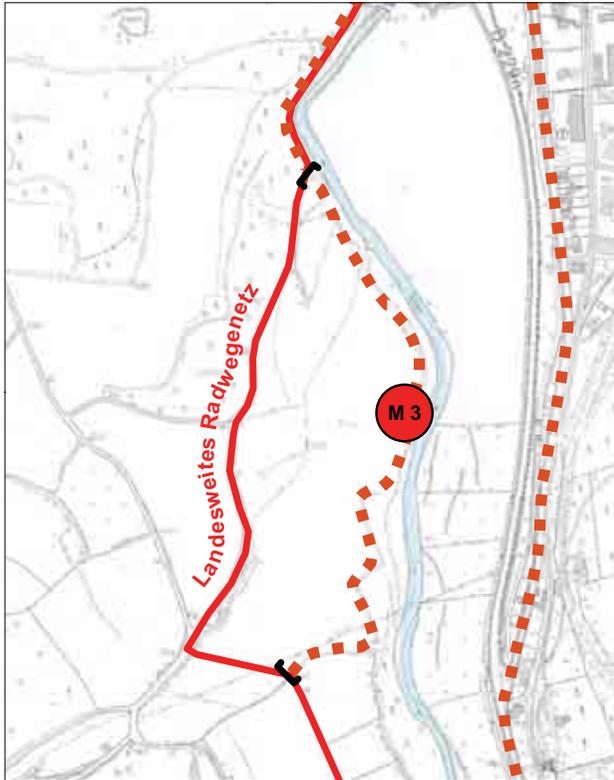


Ortsteil:	Müschede / Hüsten
Maßnahme:	M 3
Bezeichnung:	Radverkehrsanlage Müschede - Hüsten
Einzelprojekte:	Selbständiger Rad- und Fußweg
Planungs- und Baurecht:	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input checked="" type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau/Ausschreibung..... <input type="checkbox"/> abgeschlossen
Nächste Schritte:	Umsetzung (Landesbetrieb Straßen NRW)
Stand der Maßnahme:	26.10.2009

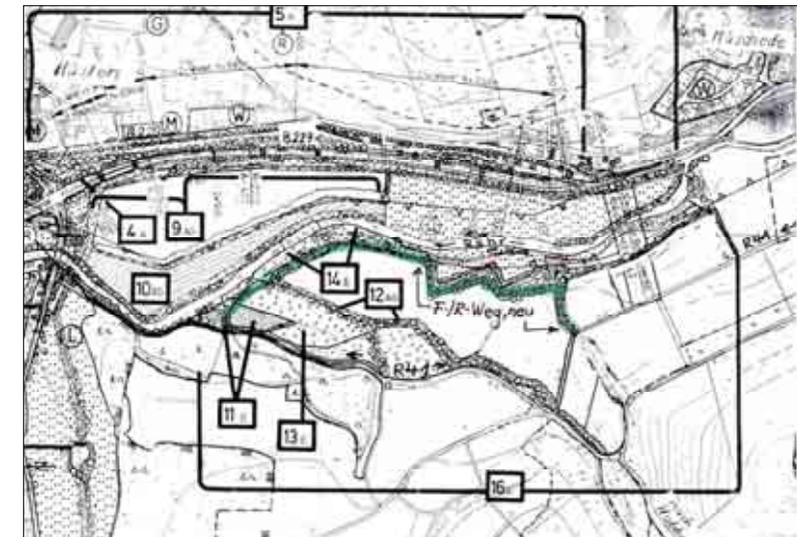



Ortsteil:	Müschede / Hachen
Maßnahme:	M 4
Bezeichnung:	Radverkehrsanlage Müschede - Hachen
Einzelprojekte:	Straßenbegleitender Fuß- und Radweg (B 229)
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	<input checked="" type="checkbox"/> in Vorbereitung Landesbetrieb Straßen NRW <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau/Ausschreibung..... <input type="checkbox"/> abgeschlossen
Nächste Schritte:	Realisierungsprüfung
Stand der Maßnahme:	26.10.2009




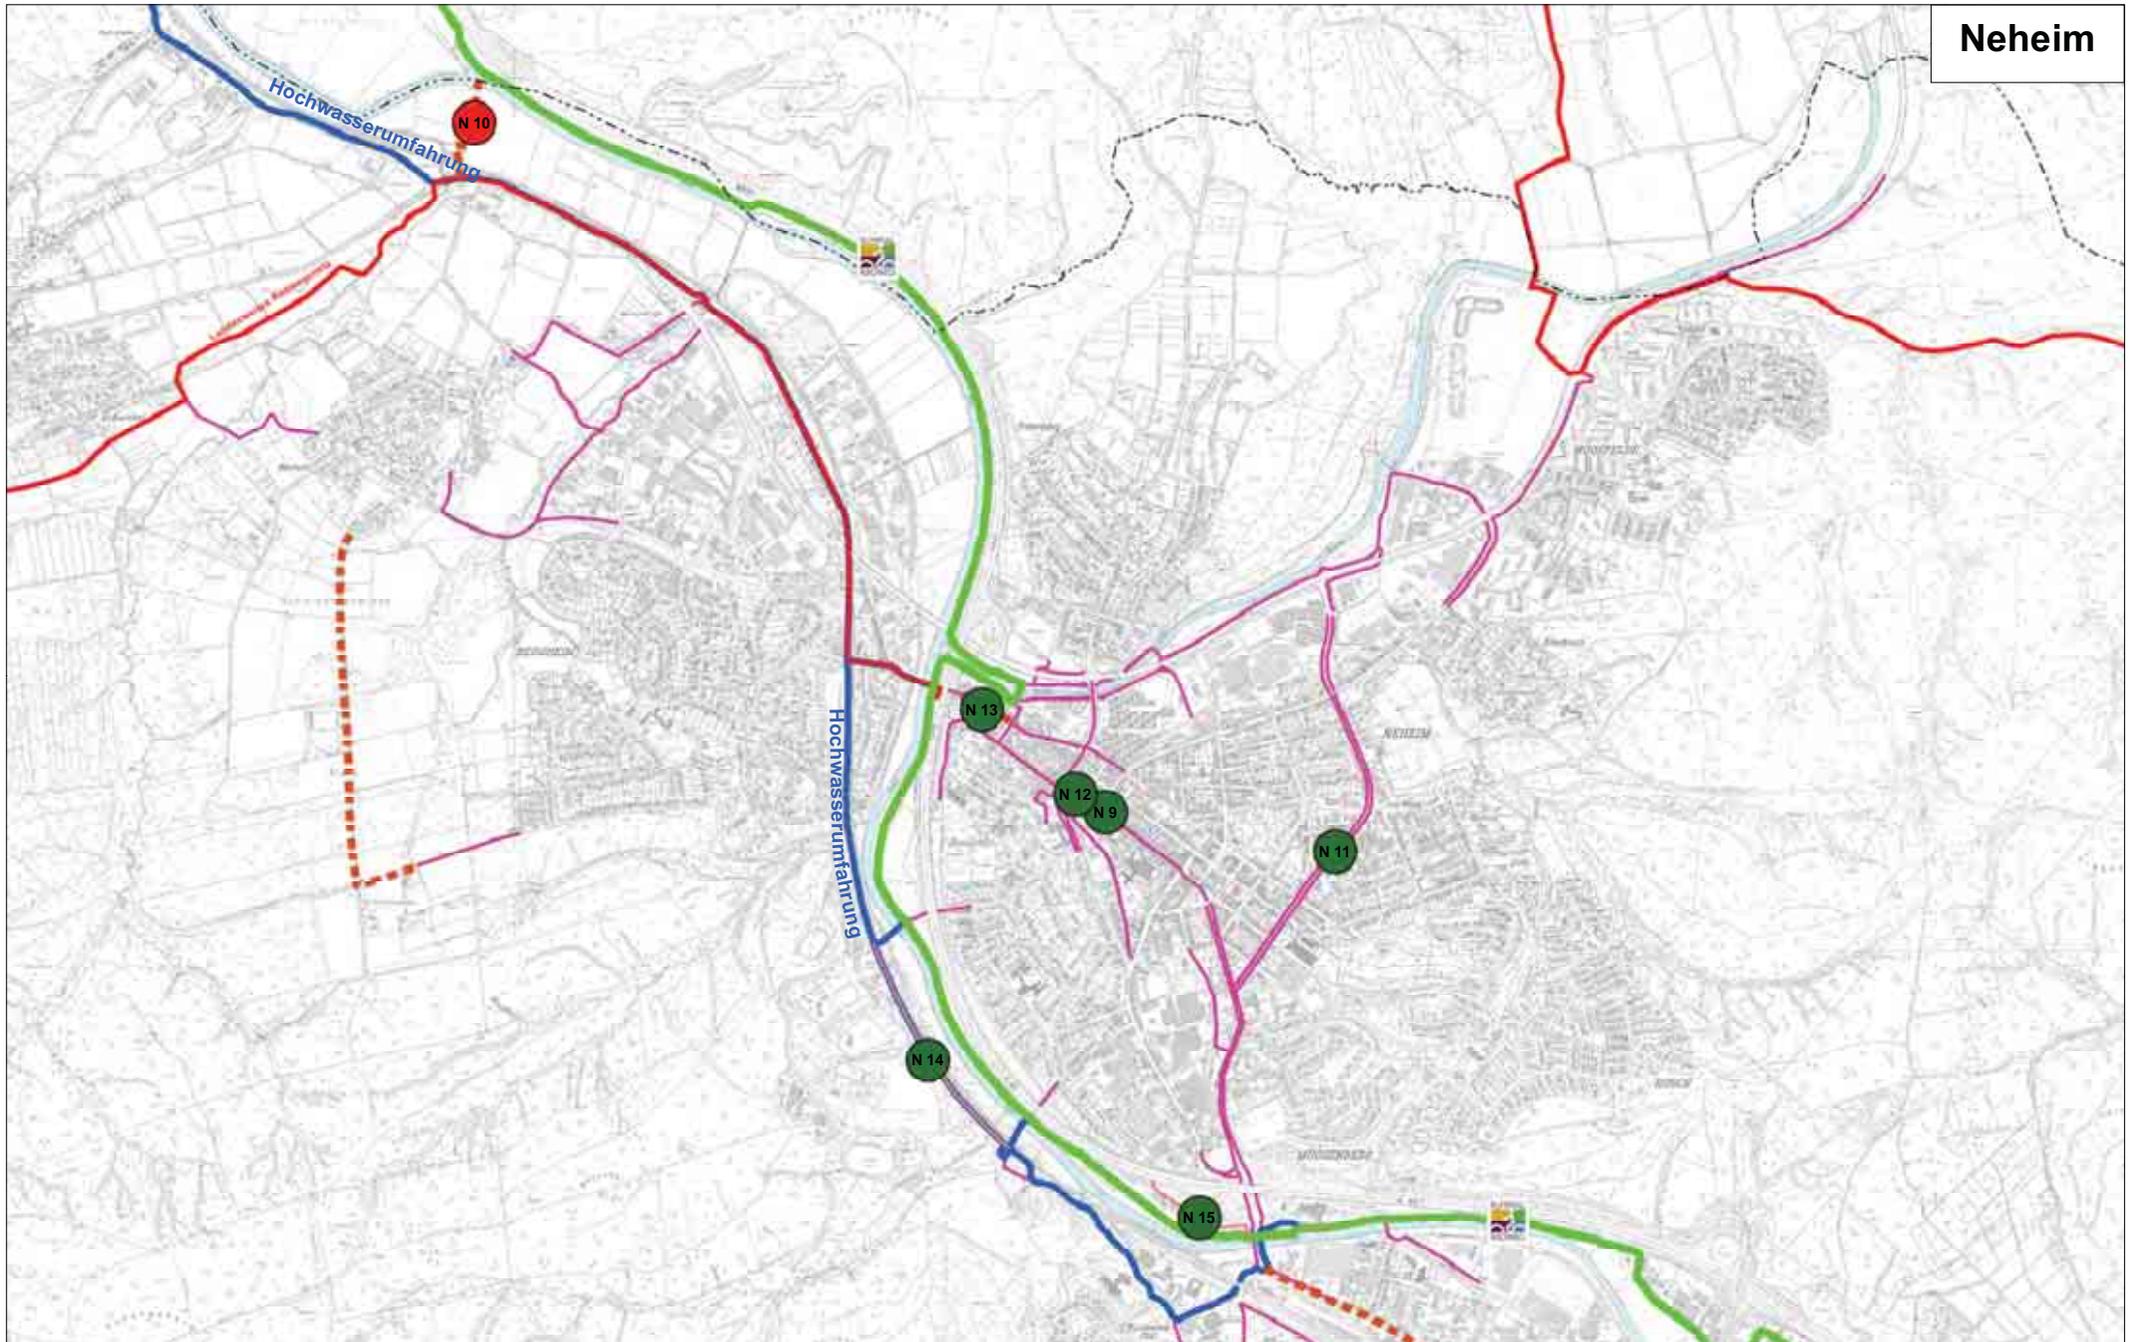





Ortsteil:	Arnsberg und Neheim
Maßnahme:	AR 12 und N 9
Bezeichnung:	Fahrradparker in den Zentren
Einzelprojekte:	a) AR Steinweg / Neumarkt / Klosterbrücke b) Mendener Straße / Fußg.-Zone
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010ff
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input checked="" type="checkbox"/> abgeschlossen Juni 2010
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	02.07.2010



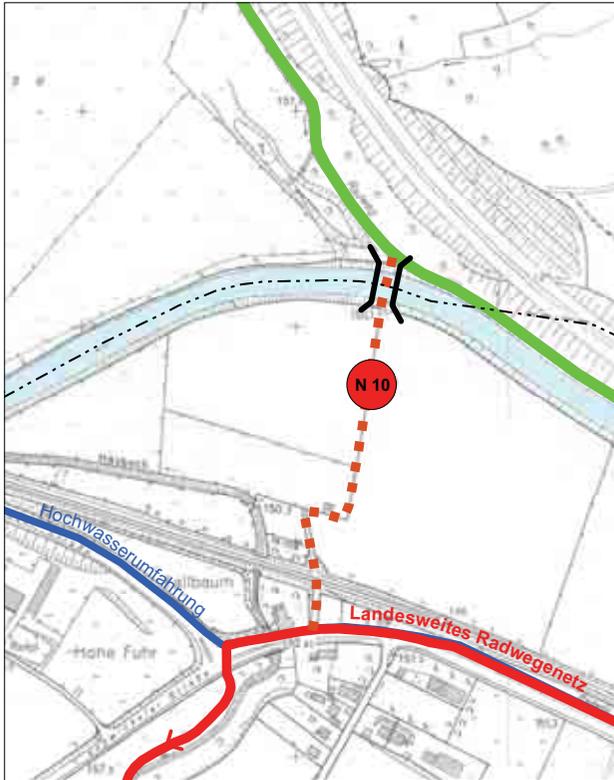


Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 10
Bezeichnung:	Anbindung der Stadtteile Bachum und Voßwinkel an den RTRW durch den Bau einer Fuß- und Radverkehrsbrücke über die Ruhr zwischen der Gemeinde Ense und der Stadt Arnsberg
Einzelprojekte:	a) Fuß- und Radverkehrsbrücke b) Wegeverbindung RuhrtalRadweg und Landesweites Radwegenetz
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff.
Stand der Umsetzung:	<input checked="" type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input type="checkbox"/> abgeschlossen
Nächste Schritte:	- Standortfrage und Finanzierung klären
Stand der Maßnahme:	30.10.2009



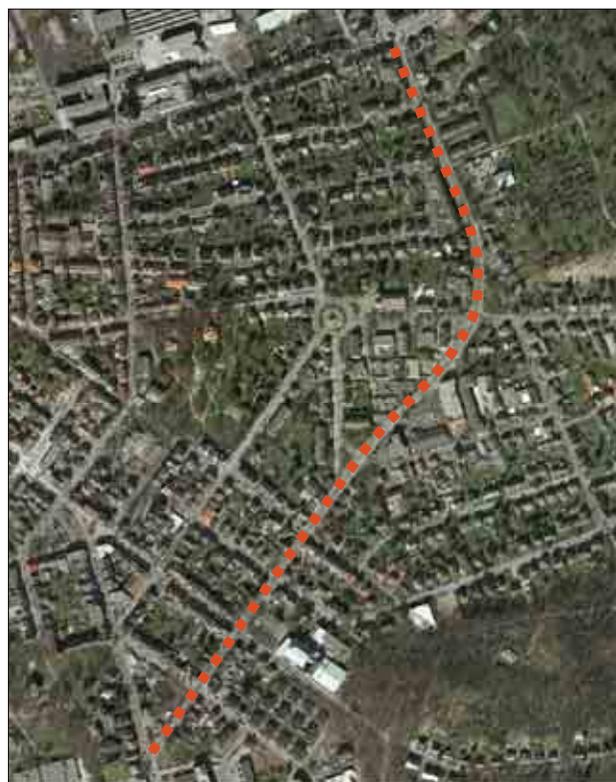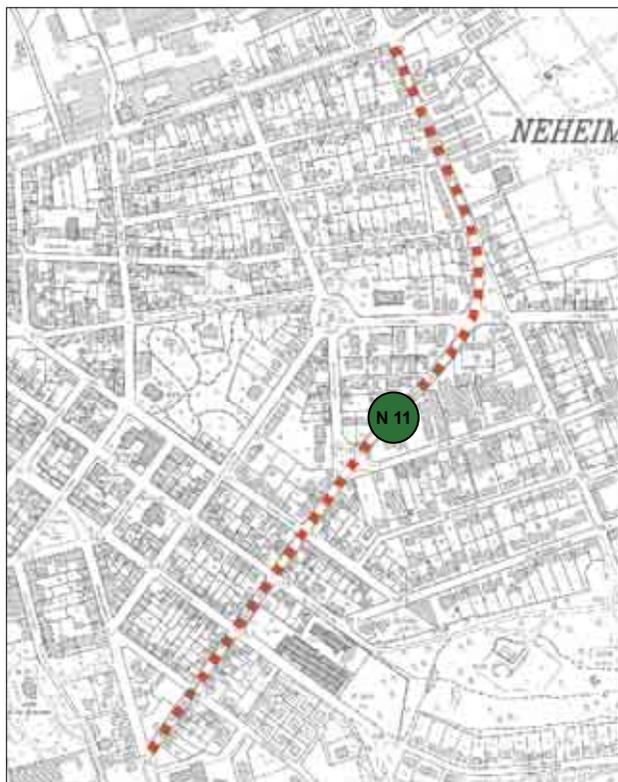




Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 11
Bezeichnung:	Umbau der Graf-Gottfried-Straße
Einzelprojekte:	Angebotsstreifen für Radverkehr
Planungs- und Baurecht:	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2009
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input checked="" type="checkbox"/> abgeschlossen Oktober 2009
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	22.10.2009



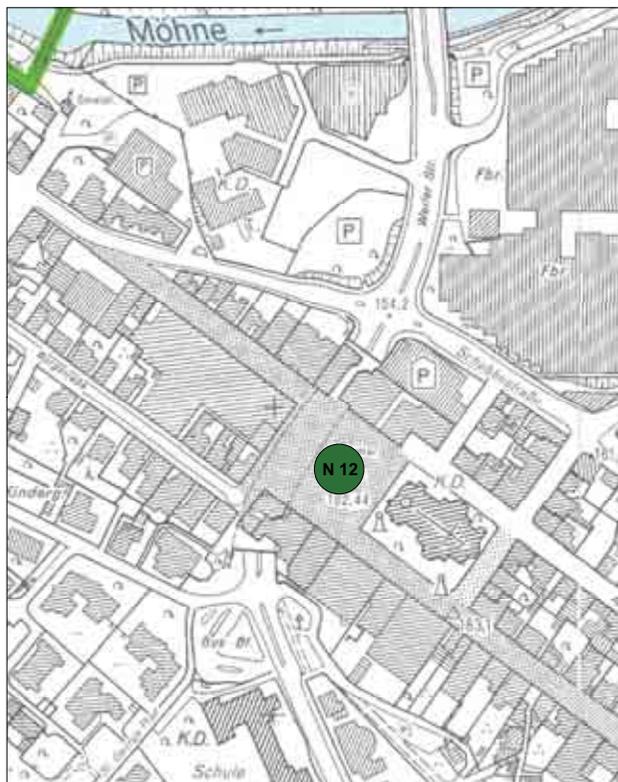


Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 12
Bezeichnung:	Radverkehr in der Fußgängerzone Neheim
Einzelprojekte:	Radverkehr auf dem Neheimer Markt
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2008
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input checked="" type="checkbox"/> abgeschlossen September 2008
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	21.10.2008

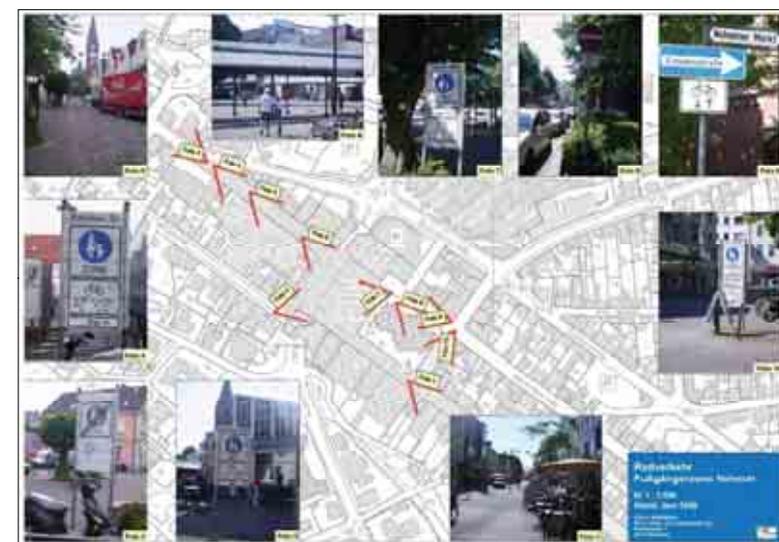

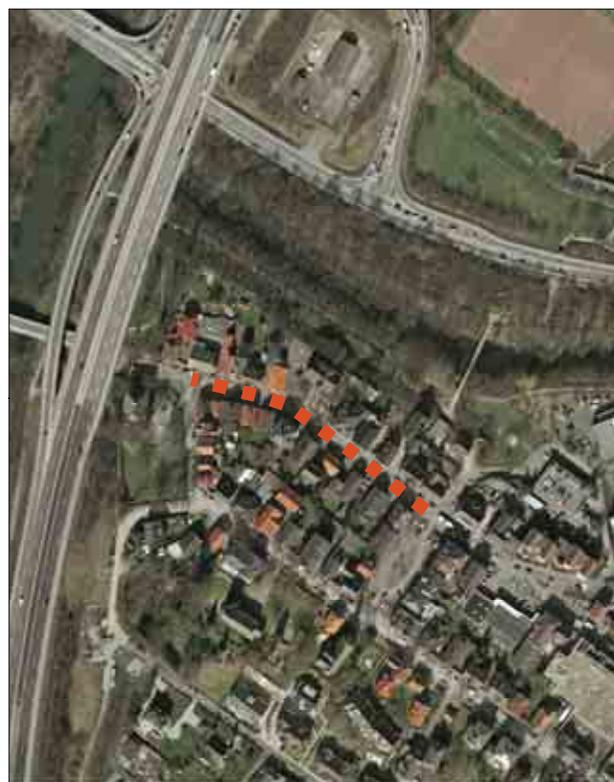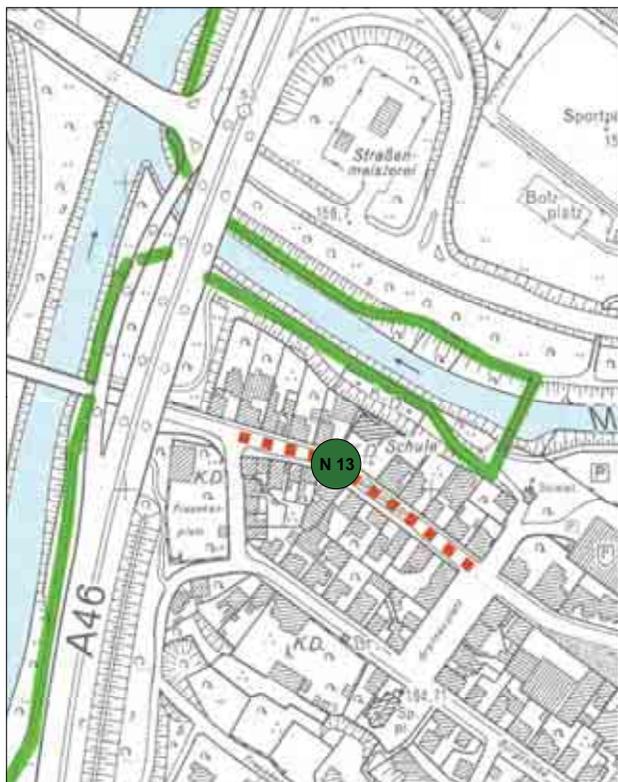


Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 13
Bezeichnung:	Radverkehrsanlage Mendener Straße
Einzelprojekte:	Neubeschilderung gem. STVO
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2008
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input checked="" type="checkbox"/> abgeschlossen. August 2008.....
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	31.08.2008



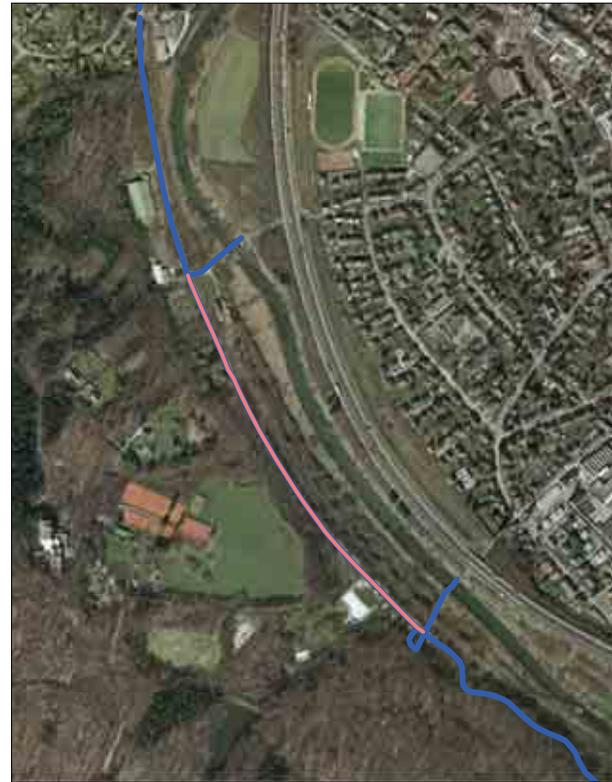

Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 14
Bezeichnung:	Radverkehrsanlage "Binnerfeld"
Einzelprojekte:	- Fahrradstraße zwischen „Denzbrücke“ und Freibad
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2008
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau/Umsetzung..... <input checked="" type="checkbox"/> abgeschlossen Juni 2008
Nächste Schritte:	- Anbindung des Bahnhofs prüfen
Stand der Maßnahme:	23.10.2009




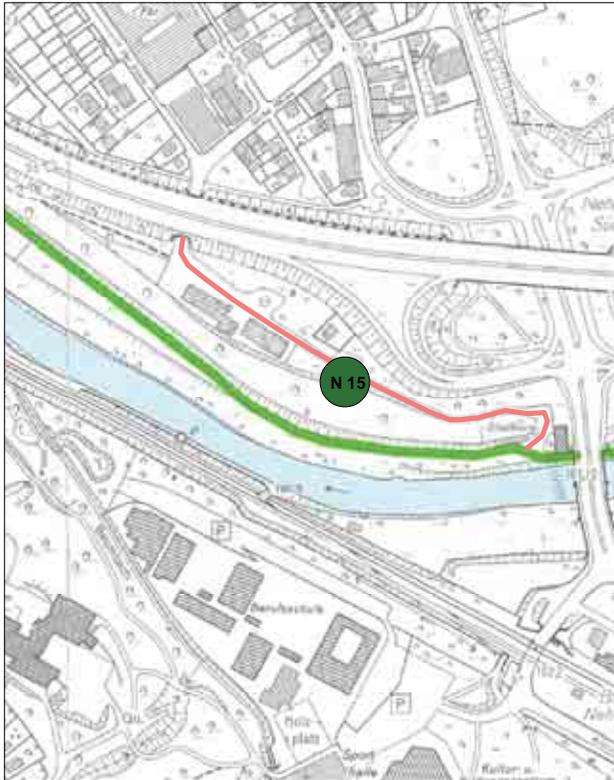

Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 15
Bezeichnung:	Anbindung Binnerfeld - RuhrtaRadweg
Einzelprojekte:	a) Anlage eines Bolzplatzes (Masterplan Ruhr) b) Fahrradstraße zwischen Dicke Hecke und Rathausplatz
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2008
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input checked="" type="checkbox"/> abgeschlossen Juni 2008
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	22.10.2009



Bachum

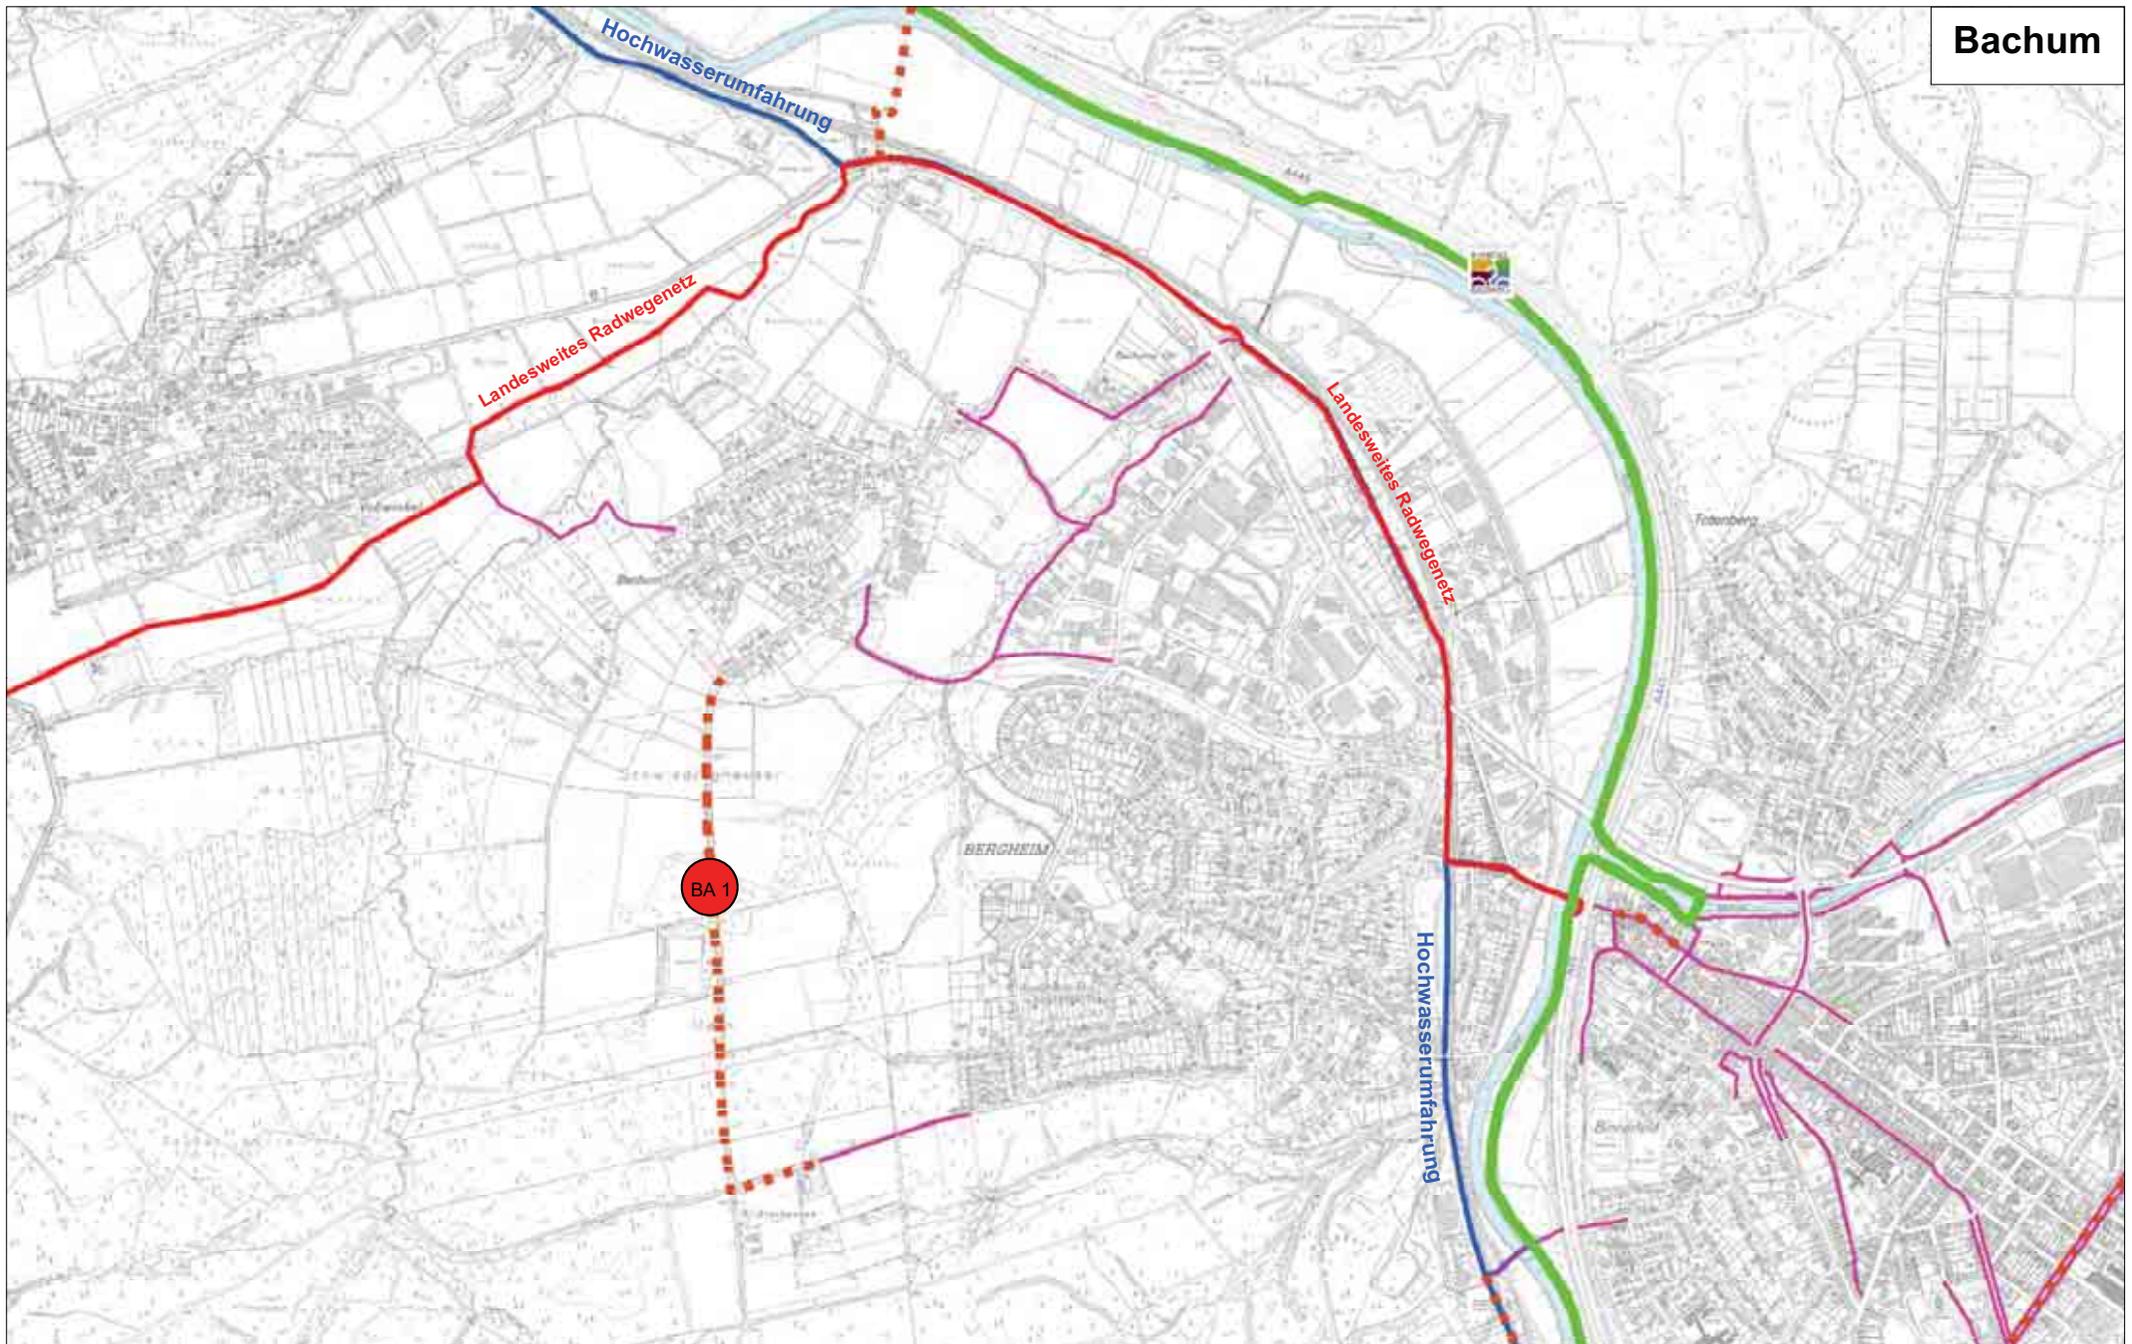





Orsteil:	Bachum
Maßnahme:	BA 1
Bezeichnung:	Fuß- und Radweg entlang der Neheimer Straße von Bachum über Sportplatz Bachum bis Dreihausen
Einzelprojekte:	Straßenbegleitender Fuß- und Radweg
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2013 ff
Stand der Umsetzung:	<input type="checkbox"/> in Vorbereitung <input checked="" type="checkbox"/> in Planung <input type="checkbox"/> in Bau <input type="checkbox"/> abgeschlossen
Nächste Schritte:	Planentwurf
Stand der Maßnahme:	05.07.2010



Holzen



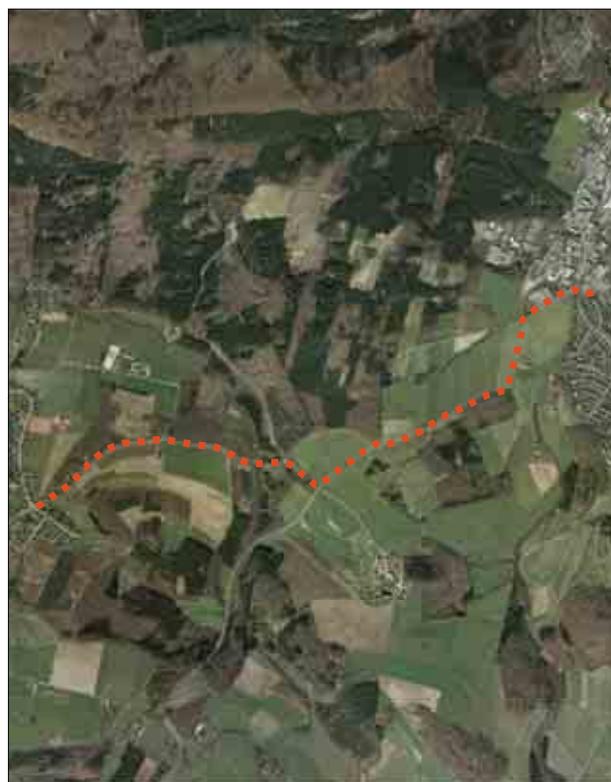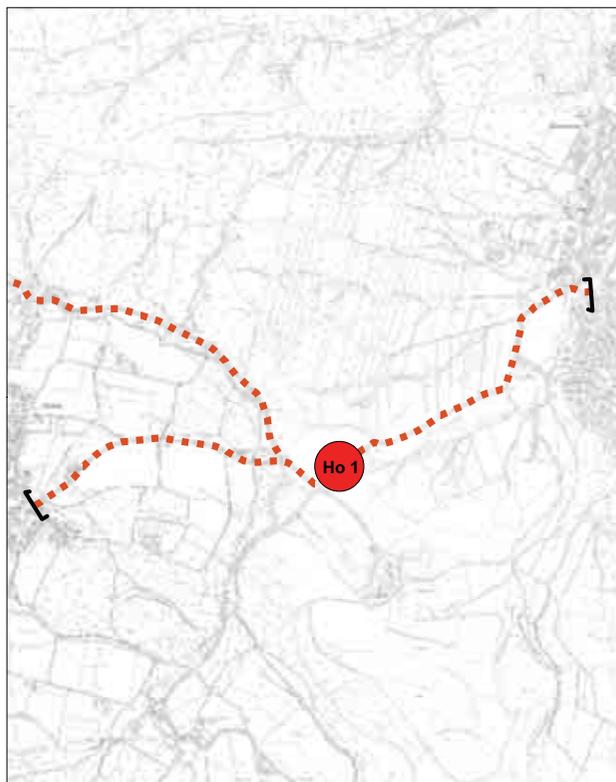

Ortsteil:	Holzen / Herdringen	
Maßnahme:	Ho 1	
Bezeichnung:	Fuß- und Radweg entlang der L 682	
Einzelprojekte:	Straßenbegleitender Fuß- und Radweg	
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich	
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2011 ff.	
Stand der Umsetzung:	<input checked="" type="checkbox"/> in Vorbereitung Baulastträger <input type="checkbox"/> in Planung Landesstraßenbau NRW <input type="checkbox"/> in Bau <input type="checkbox"/> abgeschlossen	
Nächste Schritte:	Realisierungsprüfung	
Stand der Maßnahme:	26.10.2009	





Ortsteil:	Holzen	
Maßnahme:	Ho 2	
Bezeichnung:	Fuß- und Radweg entlang der L 537	
Einzelprojekte:	Straßenbegleitender Fuß- und Radweg	
Planungs- und Baurecht:	<input type="checkbox"/> vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> nicht vorhanden <input type="checkbox"/> nicht erforderlich	
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2011 ff.	
Stand der Umsetzung:	<input checked="" type="checkbox"/> in Vorbereitung Baulastträger <input type="checkbox"/> in Planung Landesstraßenbau NRW <input type="checkbox"/> in Bau <input type="checkbox"/> abgeschlossen	
Nächste Schritte:	Realisierungsprüfung	
Stand der Maßnahme:	26.10.2009	

