



HANDLUNGS- UND MASSNAHMENKONZEPT ZUM RUHRTALRADWEG IM STADTGEBIET ARNSBERG

Beiträge zur Stadtentwicklung | Info 38





Oeventrop

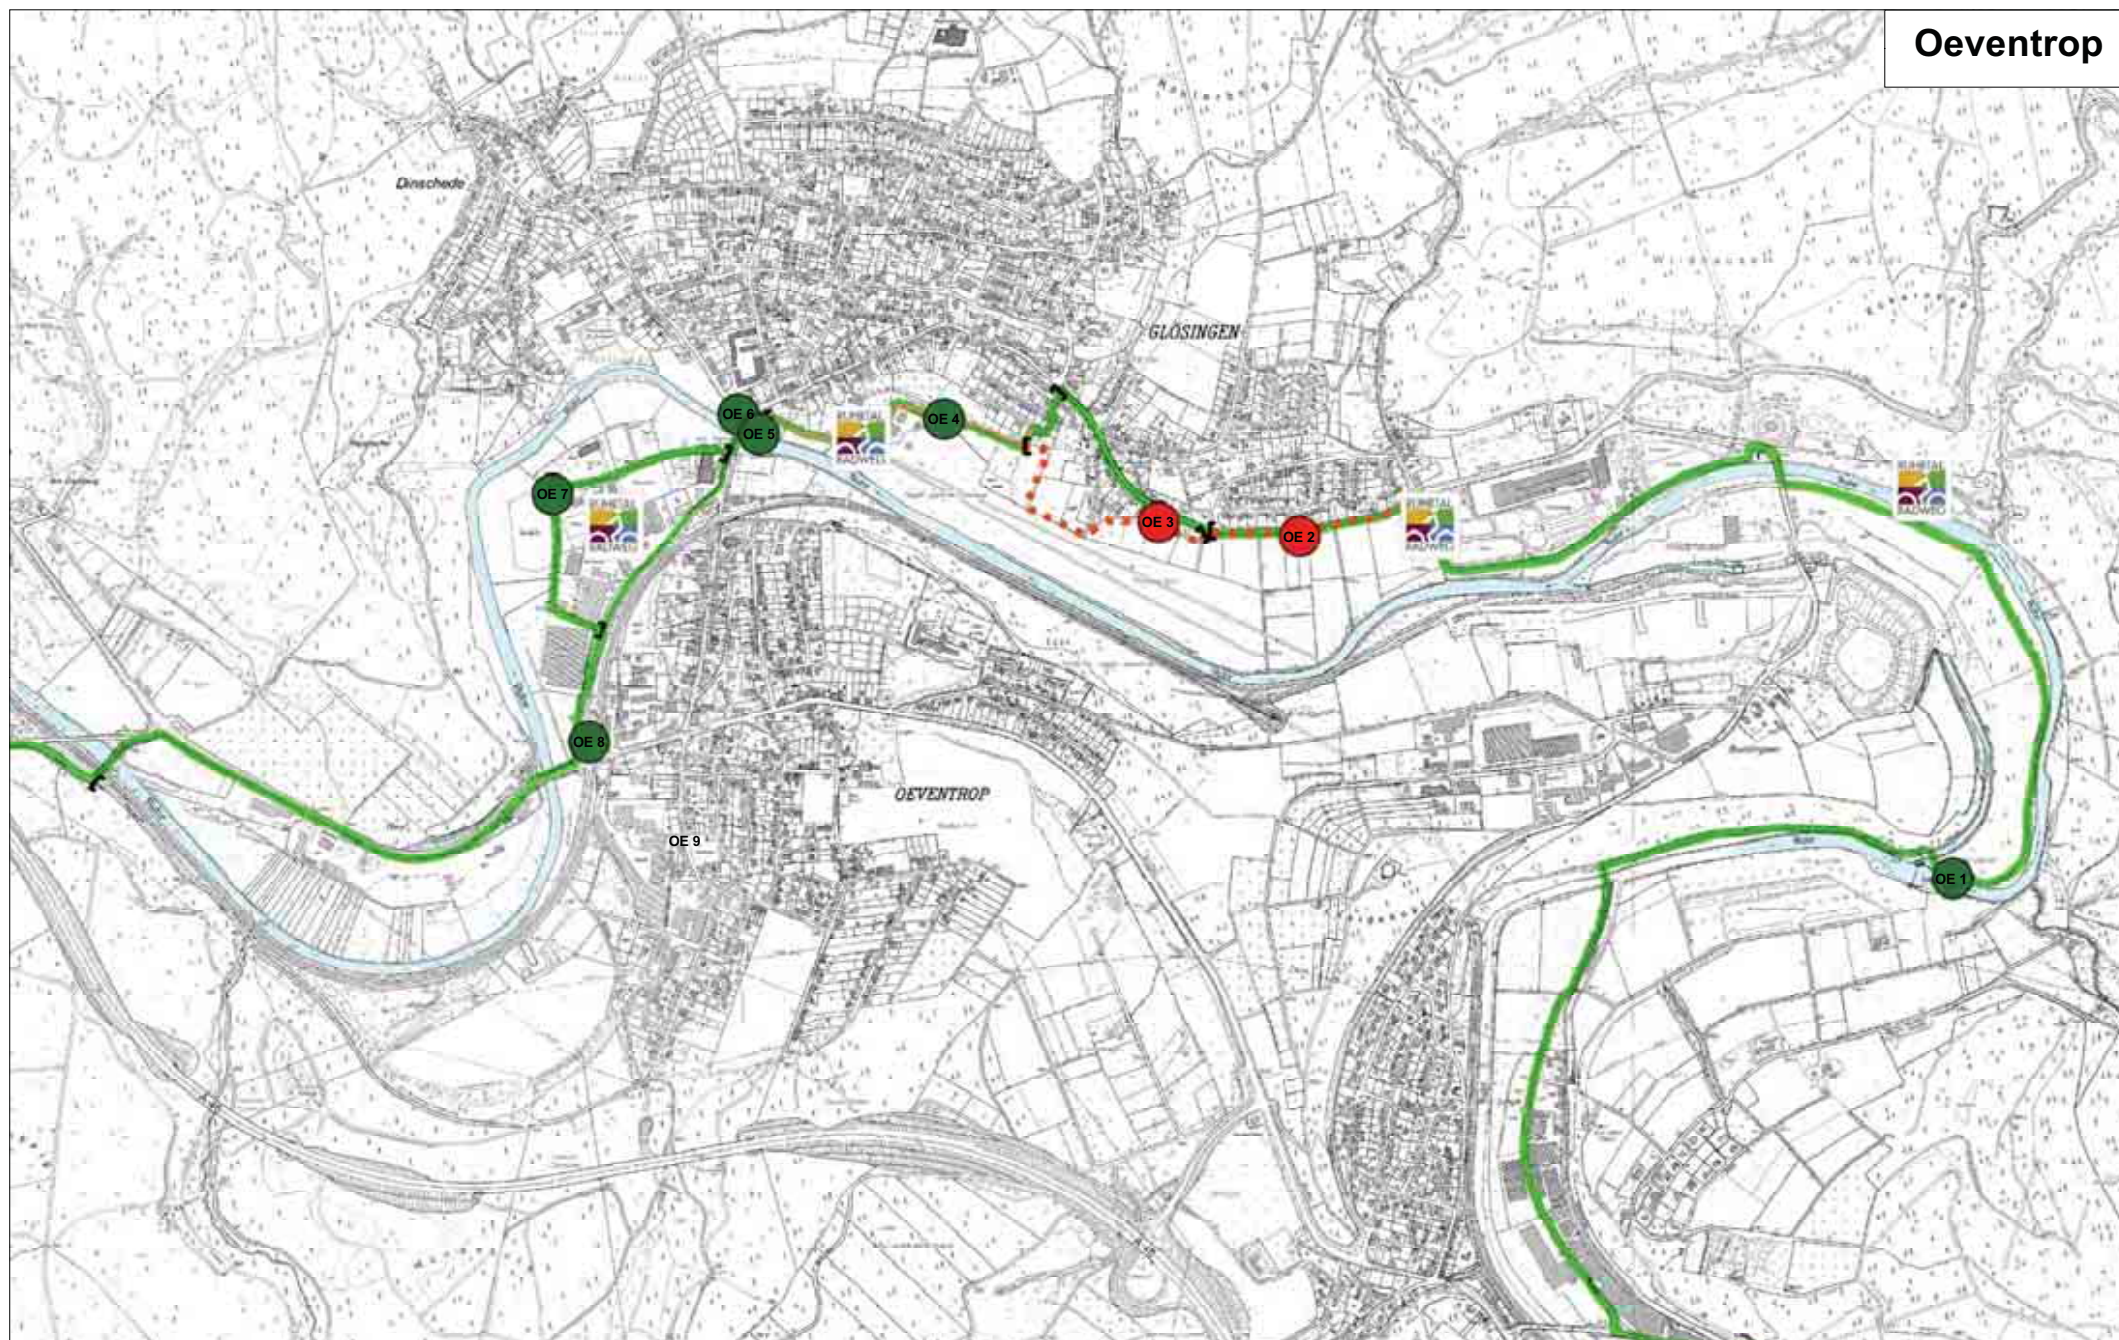

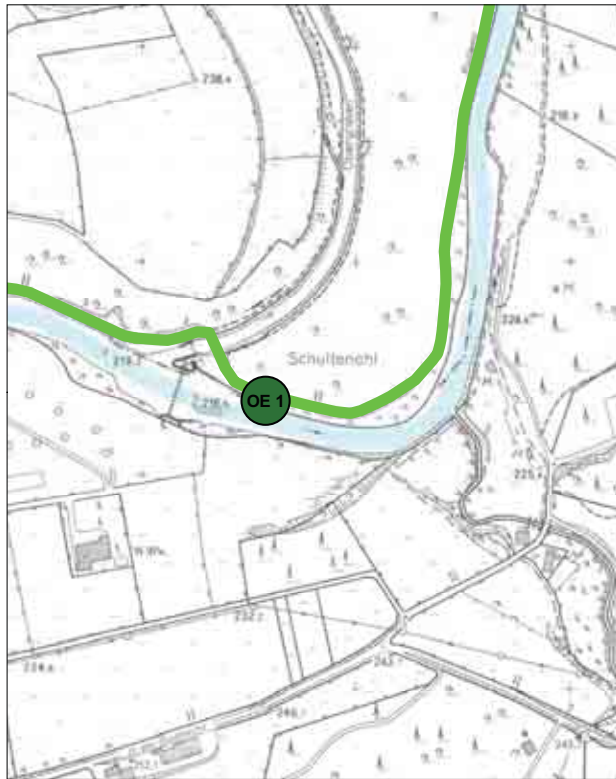


Ortsteil:	Oeventrop
Maßnahme:	OE 1
Bezeichnung:	Rastpunkt am Wildhausener Wehr / Stadteingang des RuhrtalRadweges
Einzelprojekte:	a). Einfache Sitzgelegenheiten (Steine) b). ggf. „Begrüßungsschild“, da Stadtgebietseinfahrt c.). Aufstellung einer Skulptur „Die Nixe“ aus dem Kunstsommerprojekt
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☒ nicht erforderlich
Realisierungszeitraum:	April 2007
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Sept. 2008
Nächste Schritte:	Klären, ob „Begrüßungsschild“ aufgestellt werden soll
Stand der Maßnahme:	29.05.2009



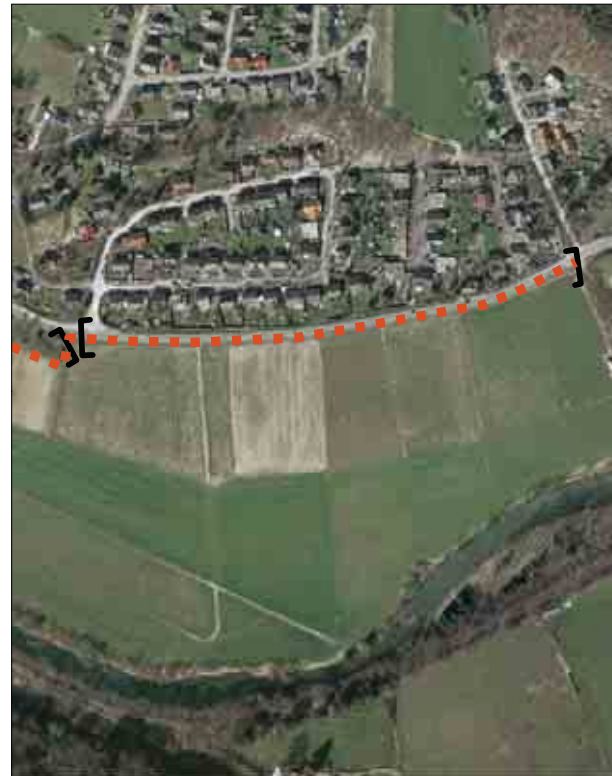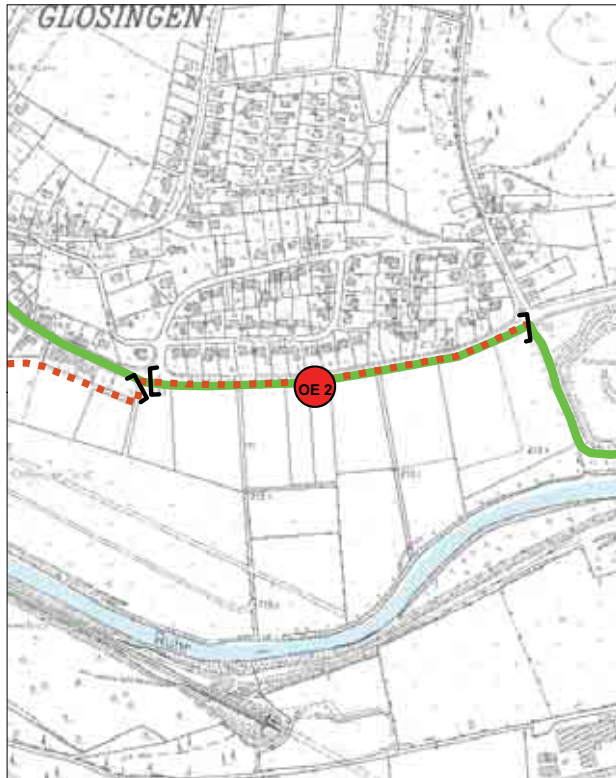


Ortsteil:	Oeventrop
Maßnahme:	OE 2
Bezeichnung:	Landesstraßenbegleitender Radweg zwischen "Filscheid" und Ortseingang (auf der Ruhrseite)
Einzelprojekte:	Neubau eines straßenbegleitenden Radweges auf ca. 400 m Länge
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☒ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	☒ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☐ abgeschlossen
Nächste Schritte:	- Programm „Bürgeradwege NRW“ (Landesbetrieb)
Stand der Maßnahme:	10.10.2009



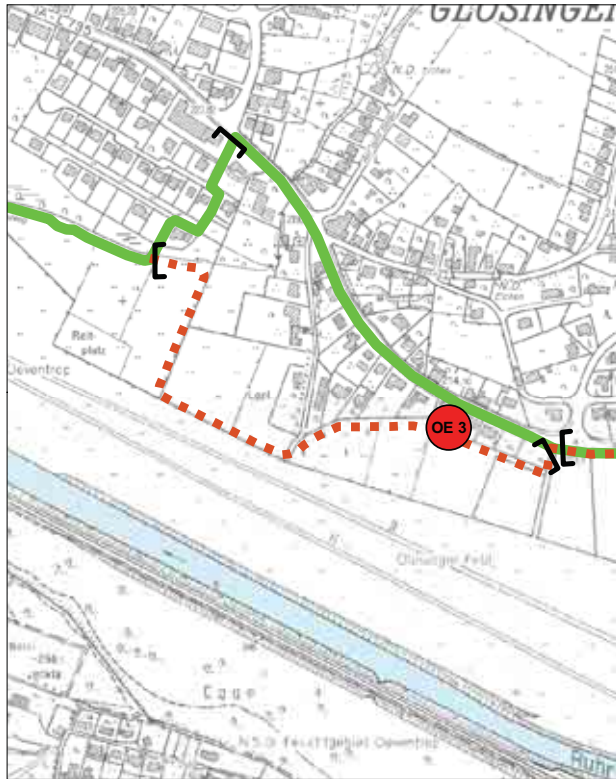

Ortsteil:	Oeventrop
Maßnahme:	OE 3
Bezeichnung:	Neuer Radwegeabschnitt zwischen Oeventrop Ortseingang und "Auf dem Kar"
Einzelprojekte:	Neubau eines eigenständigen Radweges auf ca. 400 m Länge, Anschluss „Auf dem Kar“
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☒ in Planung ☐ in Bau ☐ abgeschlossen
Nächste Schritte:	- Zuweisung des Landes NRW wird erwartet
Stand der Maßnahme:	15.03.2010



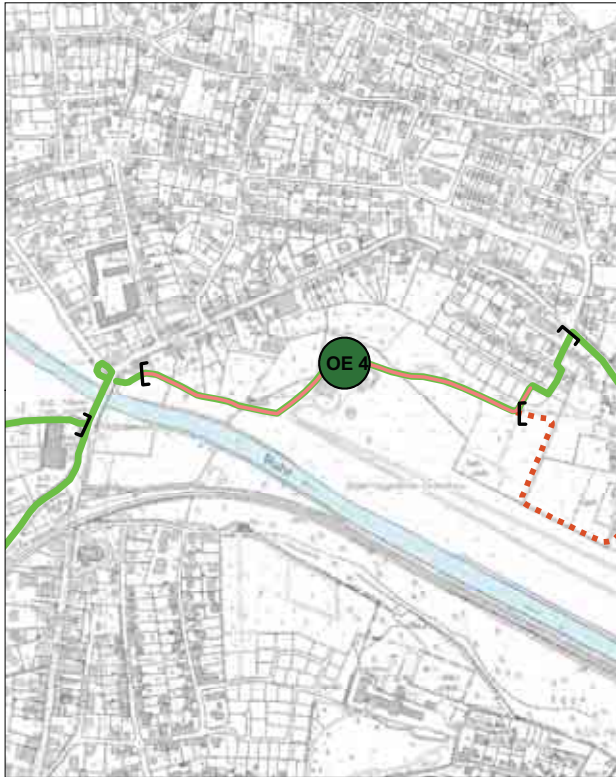


Ortsteil:	Oeventrop
Maßnahme:	OE 4
Bezeichnung:	Neuer eigenständig geführter Radweg zwischen "Auf dem Kar" und Segelflugheim (LSC)
Einzelprojekte:	- Neubau eines eigenständig geführten Radweges auf ca. 500 m Länge - Ausweisung als Fahrradstraße
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
Realisierungszeitraum:	Oktober / November 2007
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Jan. 2008
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	29.05.2009






Ortsteil:	Oeventrop
Maßnahme:	OE 5
Bezeichnung:	Aufenthalts- und Informationspunkt
Einzelprojekte:	a). Sitz- / Rastgelegenheit einrichten b). Aufstellen eines Infoportals c). Aufstellen einer Skulptur aus dem Kunstsommerprojekt
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☒ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	Okt./Nov. 2008
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen 2008
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	13.12.2008



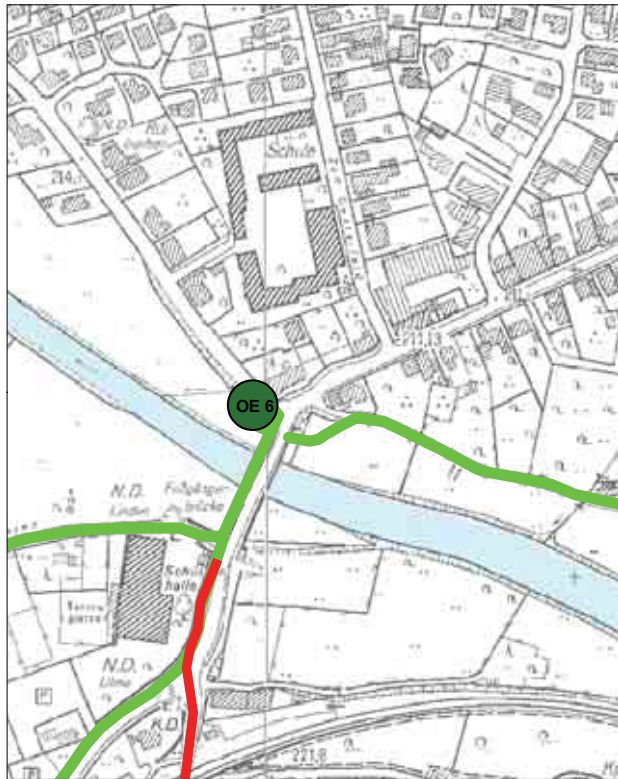

Ortsteil:	Oeventrop
Maßnahme:	OE 6
Bezeichnung:	Unterquerung der Dinscheder Brücke und kreuzungs-freie Querung Glöisinger Straße
Einzelprojekte:	a). Neuanlage Radweg b). Einmündung und Querungsstelle Dinscheder Straße
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Jan. 2008
Nächste Schritte:	- Querungsmöglichkeit auf der Dinscheder Straße prüfen (Schülerverkehr)
Stand der Maßnahme:	10.10.2009



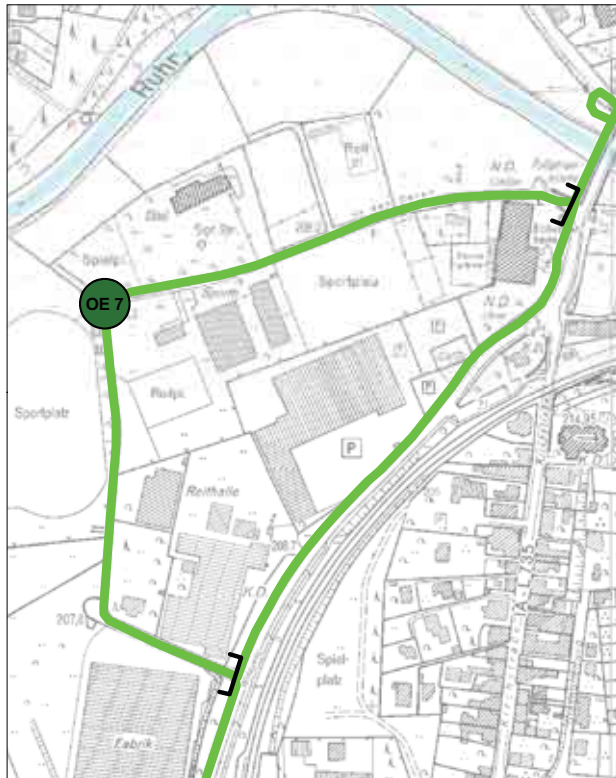


Ortsteil:	Oeventrop
Maßnahme:	OE 7
Bezeichnung:	Optimierung Führung des RuhrtalRadweges über „In den Oeren“
Einzelprojekte:	a). Neuausschilderung b). Aufnahme im Kartenmaterial etc.
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☒ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2008
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Juli 2008
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	24.07.2008



WP WESTFALENPOST Nr.: 172 vom 25.07.2008

Radweg wird jetzt neu geführt


Oeventrop. Der Ruhrtal-Radweg wird von freier Sicht Richtung Arnsberg jetzt quasi als Einbahnstraße durch die Stadt für „In den Oeren“ am Sportzentrum mit neuer Kunststoffschilderung und Reisanlage vorbei geführt. Er ist so attraktiv als der Radweg, wo der Fahrstreifen an der Einfahrt im Sportzentrum für Radler auch nicht ganz ungefährlich war, in der Gegenrichtung von Arnsberg nach Oeventrop hinein aber wie gefühlt. Vor dem Radweg zwang kein auf den Radweg ein. Mit dem Radweg an der Einfahrt auf die Sportanlage Recke zu, wo der Stadt am Ende-Punkt zudem die Recke aufgestellt hat, ist die

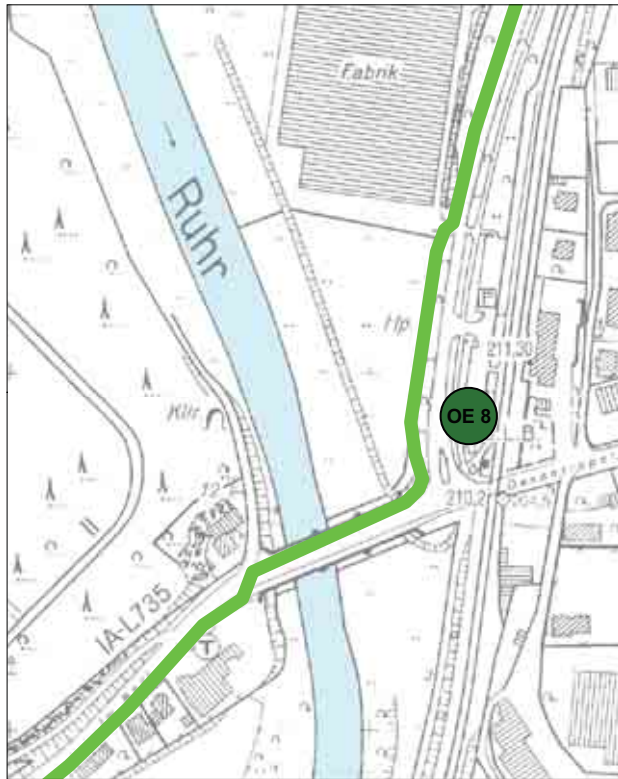


Ortsteil:	Oeventrop
Maßnahme:	OE 8
Bezeichnung:	Aufstellen von 3 Fahrradboxen am Bahnhof Oeventrop
Einzelprojekte:	Aufstellung der Fahrradboxen
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	Anfang 2008
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen April 2008
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	04.04.2008





Uentrop | Arnsberg

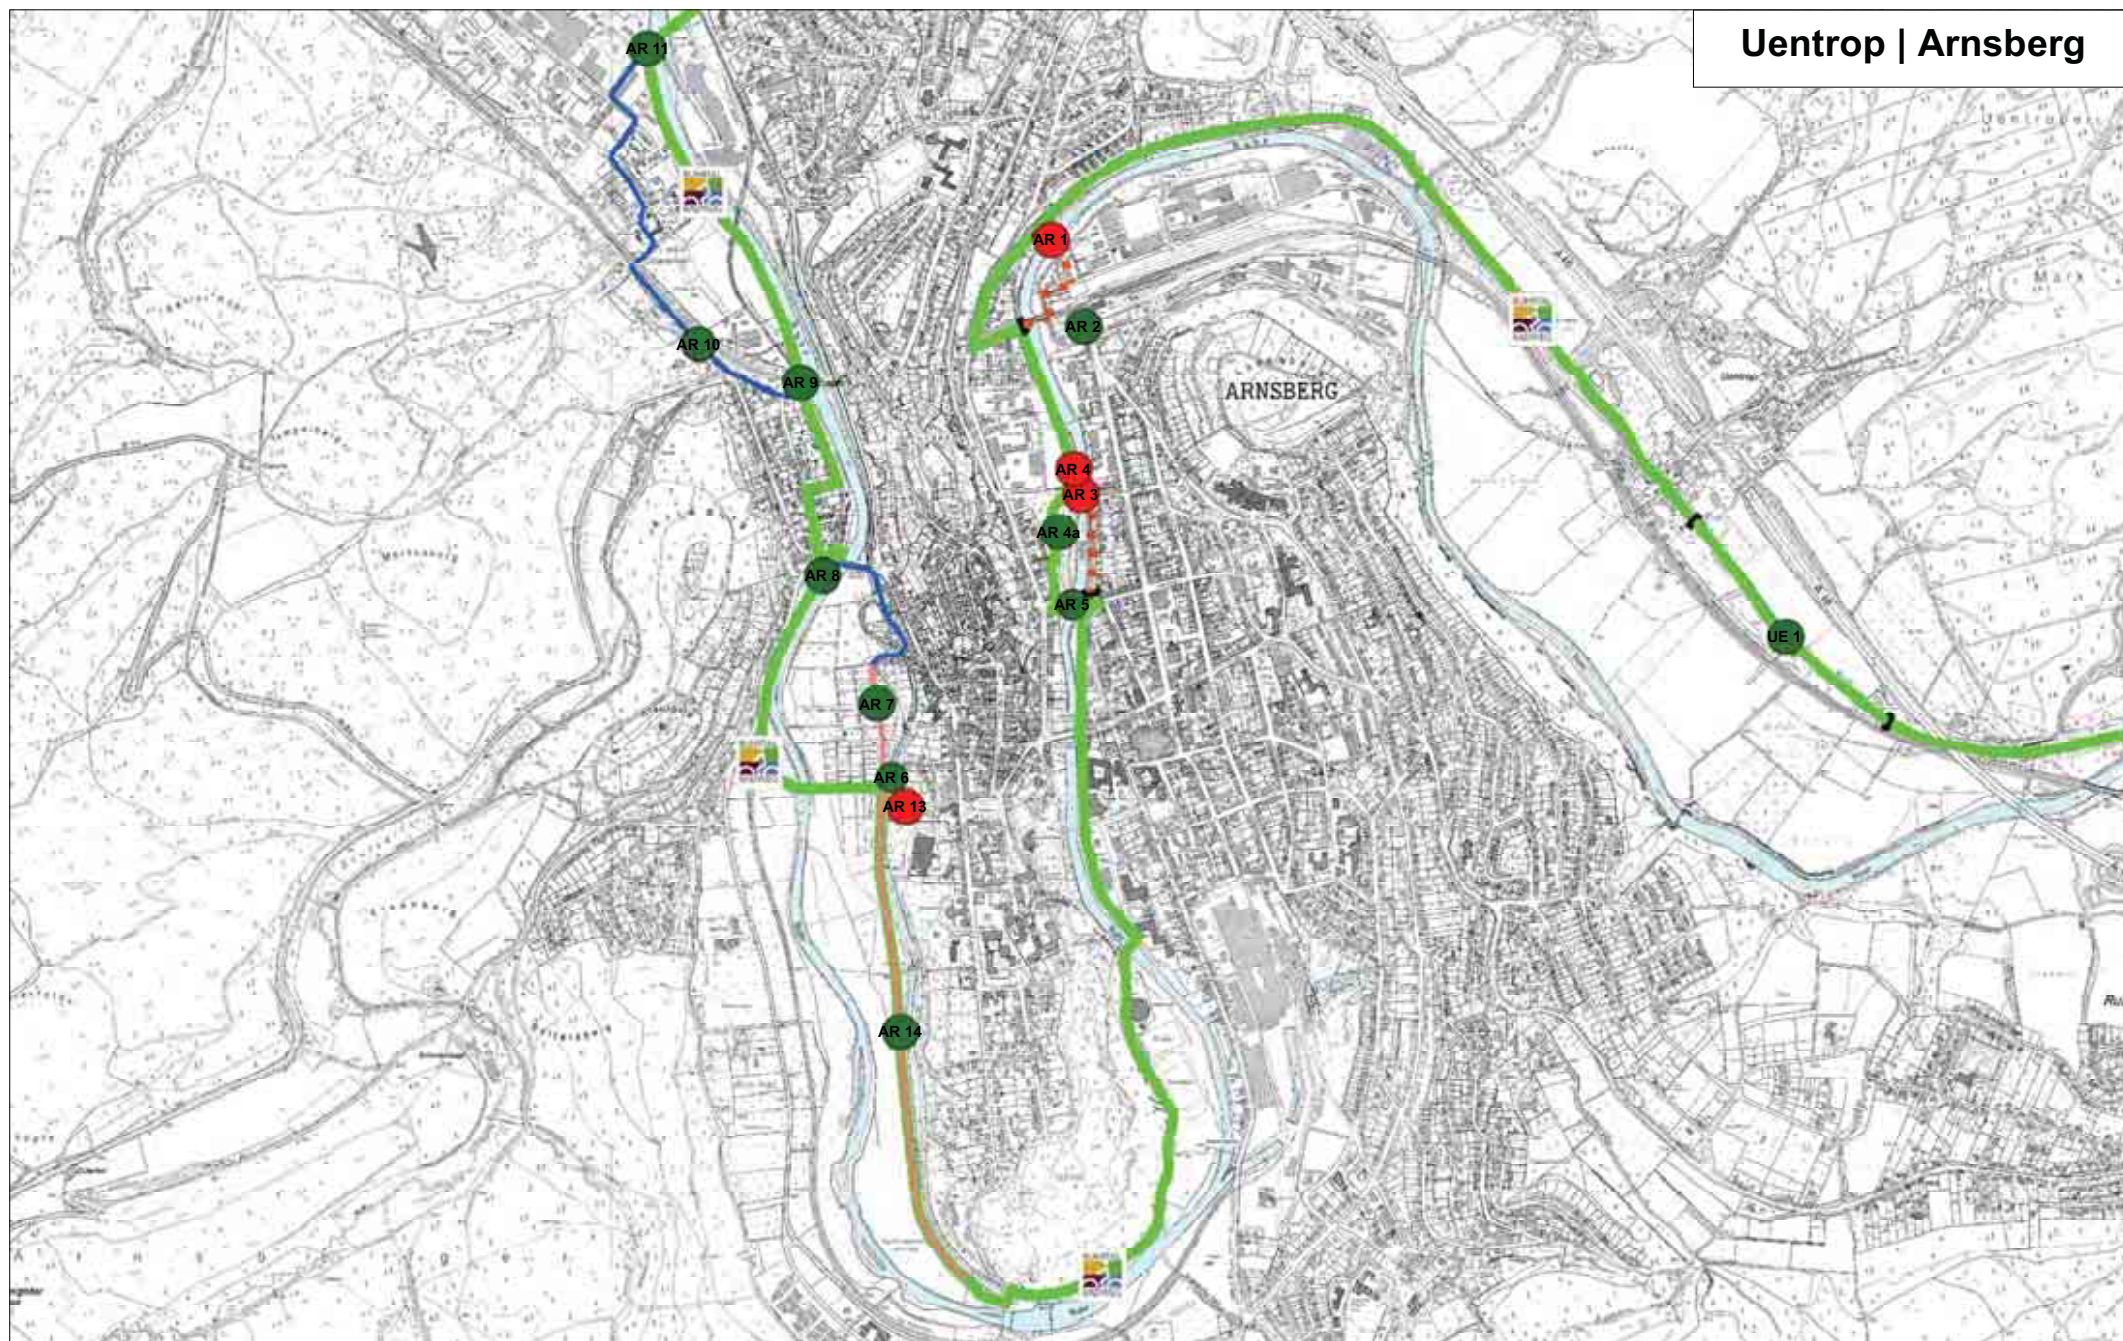

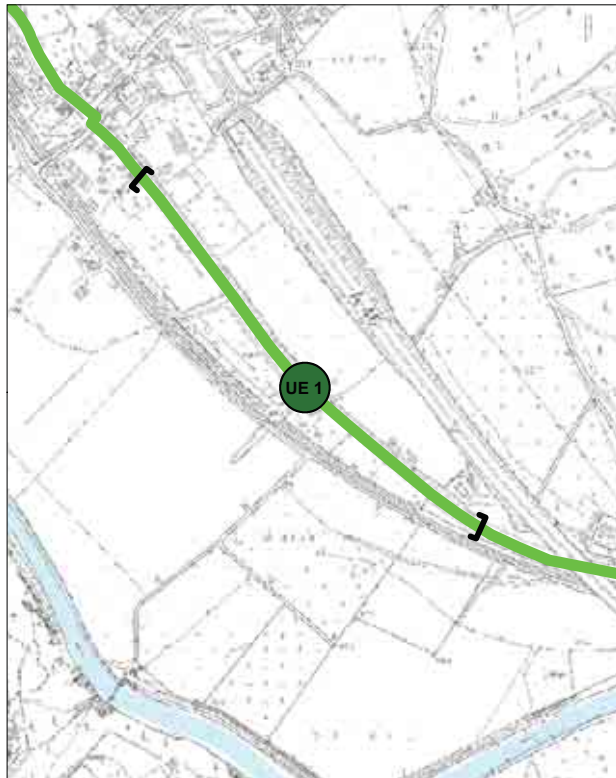


Ortsteil:	Uentrop
Maßnahme:	UE 1
Bezeichnung:	Lückenschluss „Östlich von Uentrop (L 735)“
Einzelprojekte:	- Straßenbegleitender Radweg auf Ruhrseite
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2009
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen September 2009
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	10.10.2009



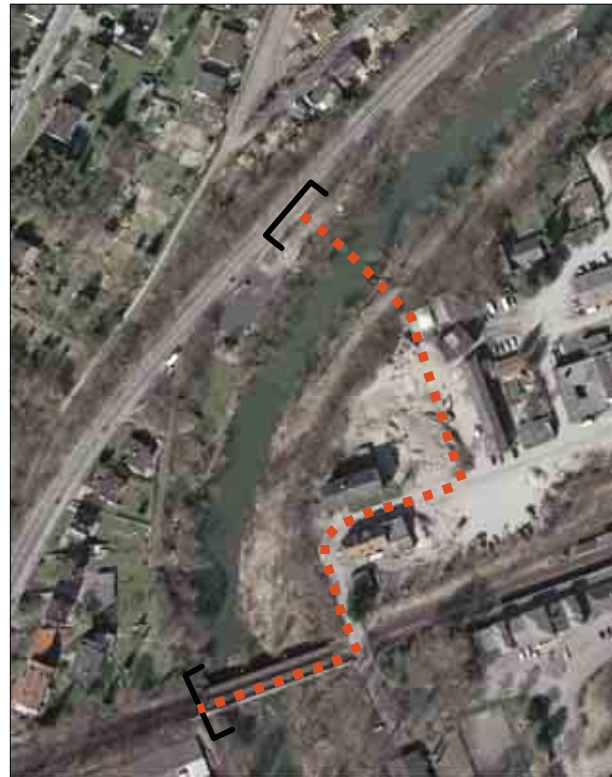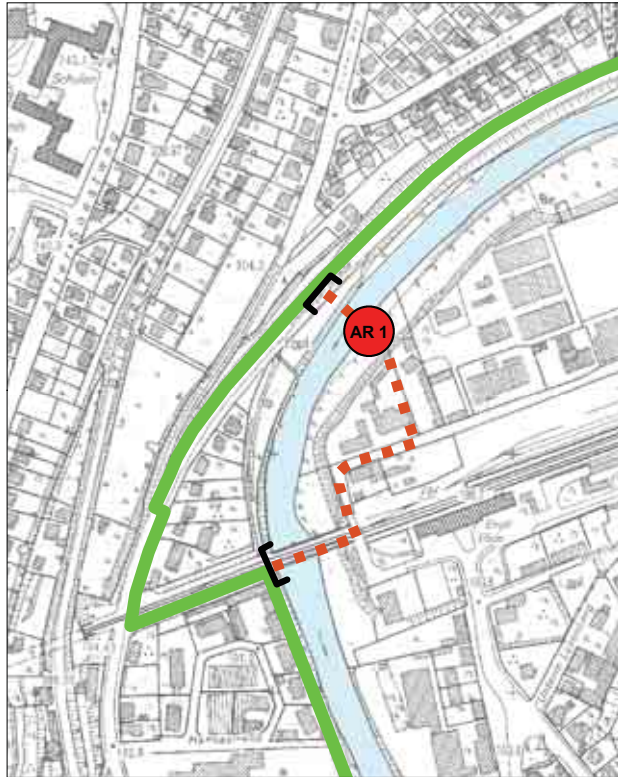


Ortsteil:	Arnsberg
Maßnahme:	AR 1
Bezeichnung:	Neue Wegeführung zum Bahnhof / Erschließung Gewerbegebiet
Einzelprojekte:	Planung und Bau einer neuen Ruhrbrücke zum Gewerbegebiet "Zu den Werkstätten" und zum Bahnhof
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☒ nicht vorhanden (Aufstellungsbeschluss des B-Plans A 22 besteht) ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2013 ff.
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☒ in Planung -Entwurfsplanung ☐ in Bau ☐ abgeschlossen
Nächste Schritte:	- Wasserrechtl. Regelung - Ausführungsplanung
Stand der Maßnahme:	15.03.2010




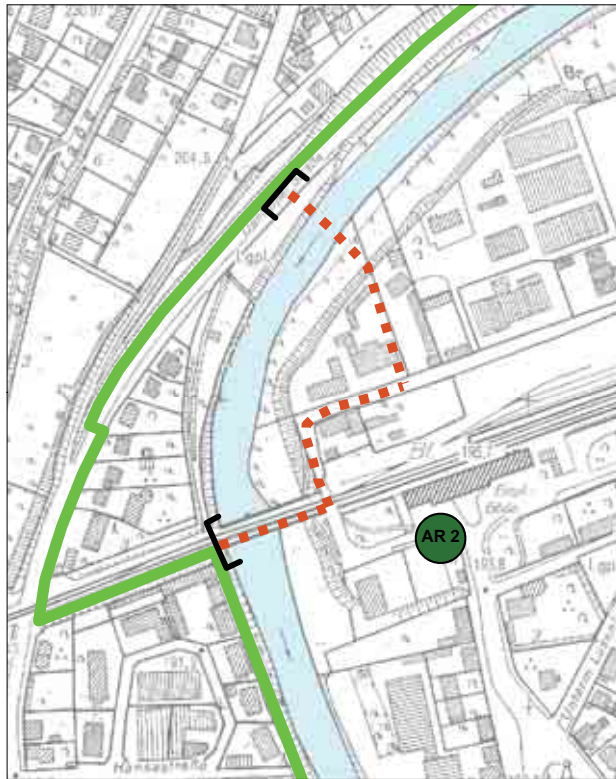



Ortsteil:	Arnberg
Maßnahme:	AR 2
Bezeichnung:	Aufstellen von 7 Fahrradboxen am Bahnhof Arnberg
Einzelprojekte:	Erwerb und Aufstellung der Fahrradboxen
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	Anfang 2008
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen April 2008
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	05.05.2008



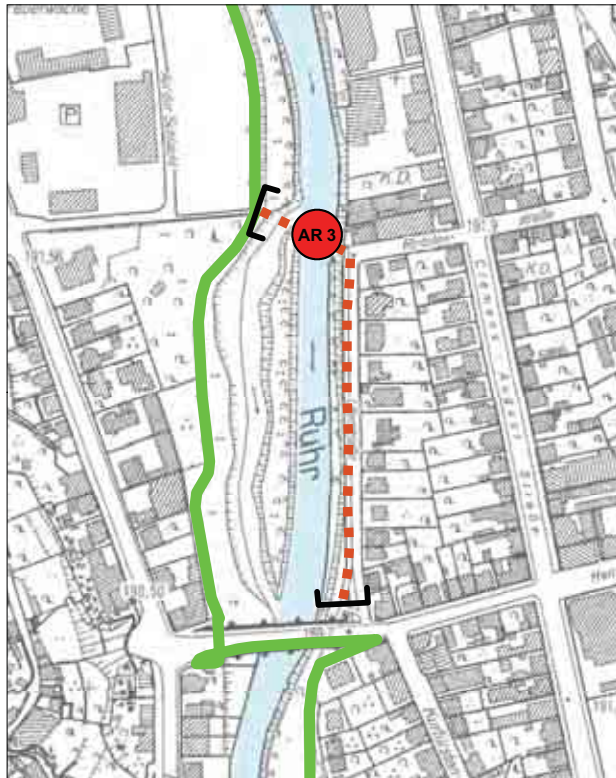


Ortsteil:	Arnsberg
Maßnahme:	AR 3
Bezeichnung:	Neubau Fuß- und Radwegebrücke Ruhrauen
Einzelprojekte:	Planung und Bau der Brücke
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☒ in Bau ☐ abgeschlossen
Nächste Schritte:	- Bauausführung
Stand der Maßnahme:	25.06.2010

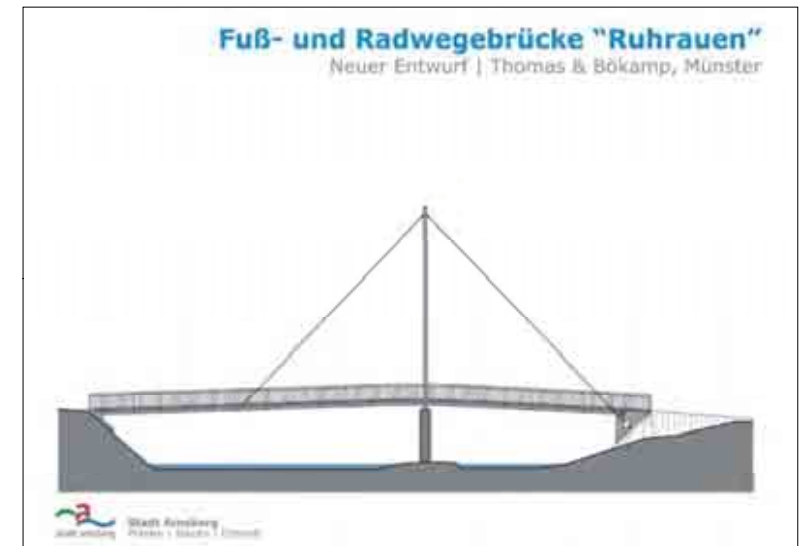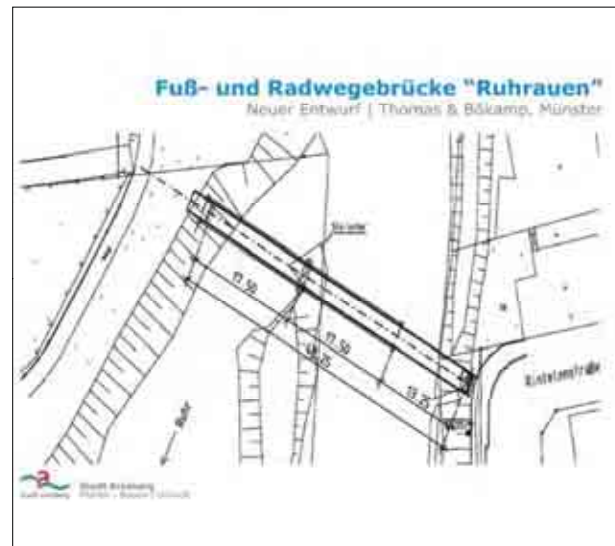

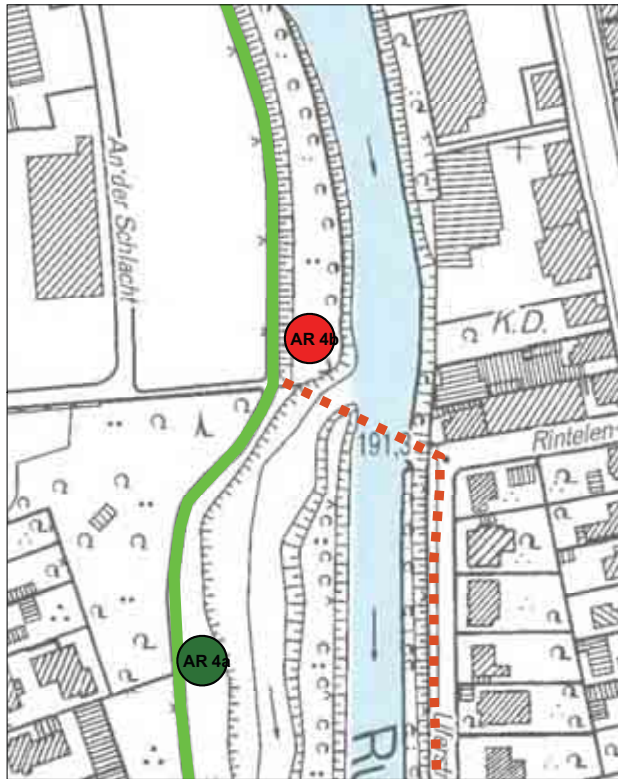

Ortsteil:	Arnsberg
Maßnahme:	AR 4 (i.V. mit AR 3)
Bezeichnung:	Info- und Aufenthaltspunkt Mengen Wiese
Einzelprojekte:	a). Aufstellen eines Infoportals b). Schaffung eines Aufenthaltsbereich
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☒ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung b) endgültiger Bau wird mit ☒ in Bau Maßnahme AR 3 abgestimmt ☒ abgeschlossen a) Juli 2008
Nächste Schritte:	- Finanzierungskonzept (Sponsoring etc.)
Stand der Maßnahme:	a) 28.06.2010



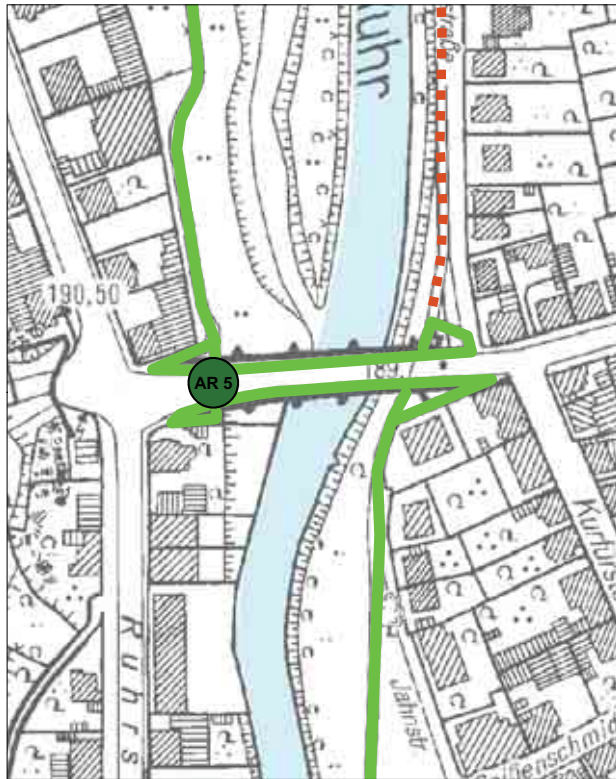



Ortsteil:	Arnsberg
Maßnahme:	AR 5
Bezeichnung:	Klare Wegeführung an der Marienbrücke
Einzelprojekte:	Bodenmarkierung / neue Schilderstandorte
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
Realisierungszeitraum:	Juni 2007
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen April 2008
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	08.04.2008






Ortsteil:	Arnberg
Maßnahme:	AR 6
Bezeichnung:	Klare Wegeführung über die "Twietebrücke" / Kleingartenanlage
Einzelprojekte:	neue Schilderstandorte / Bodenmarkierung
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
Realisierungszeitraum:	2008 / 2010
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Oktober 2008 / Juni 2010
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	28.06.2010



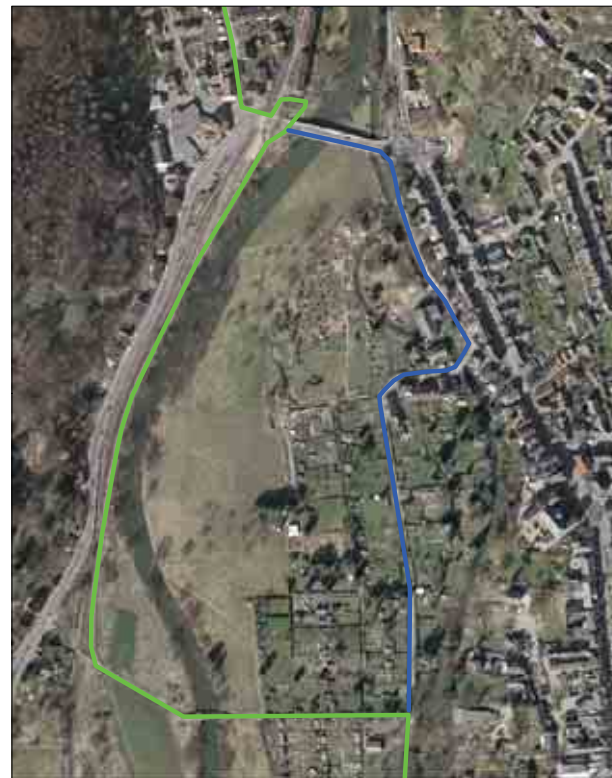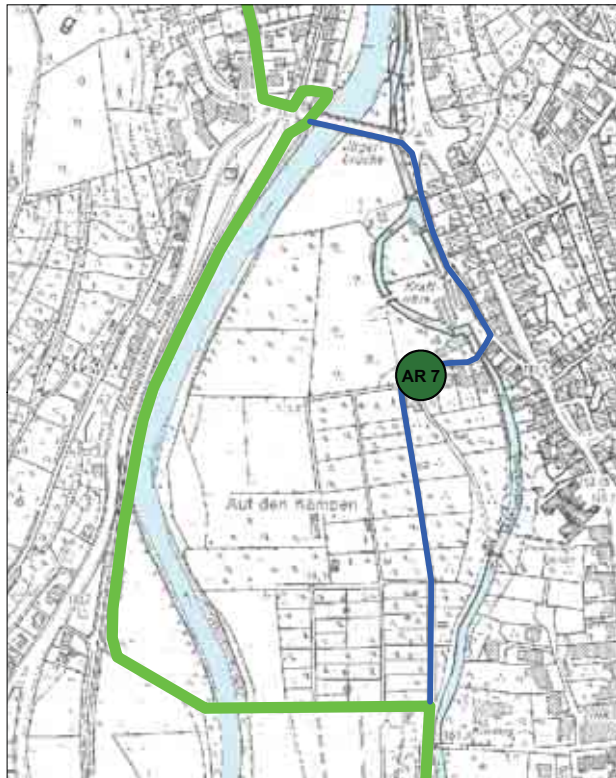


Ortsteil:	Arnsberg
Maßnahme:	AR 7
Bezeichnung:	Hochwasserumfahrung "Mühleninsel"
Einzelprojekte:	- Linienführung prüfen - Karte ins Netz (RuhrtalRadweg-Homepage)
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☒ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2007 / 2008
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Jan. 2008
Nächste Schritte:	- Beschilderung u. Anschlüsse prüfen (Jägerbrücke) - Umbau der Mühlenstraße
Stand der Maßnahme:	10.10.2009



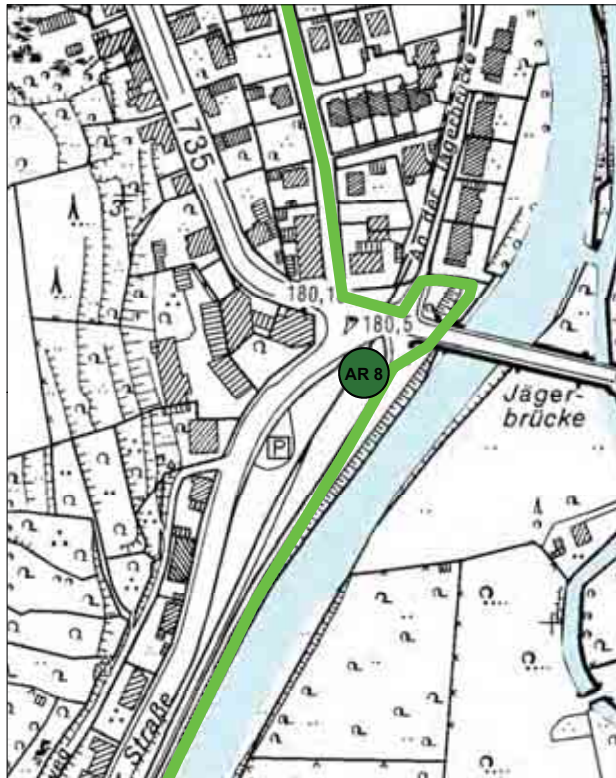


Ortsteil:	Arnsberg
Maßnahme:	AR 8
Bezeichnung:	Zentraler Info- / Aufenthaltspunkt Jägerbrücke
Einzelprojekte:	a). Aufstellung eines Infoportals b). Gestaltung eines Aufenthaltsbereichs c.) Aufstellen einer Skulptur aus dem Kunstsommerprojekt
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☒ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2009
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen August 2009
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	20.08.2009



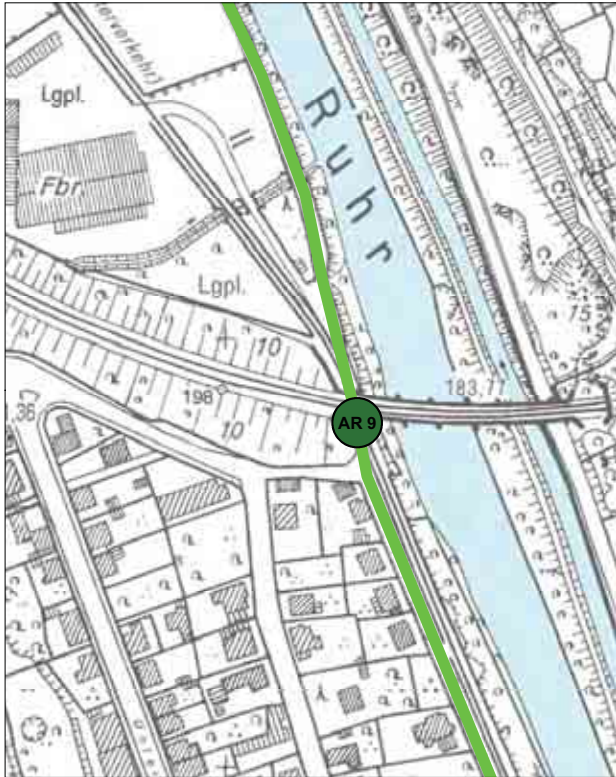


Ortsteil:	Arnsberg
Maßnahme:	AR 9
Bezeichnung:	Gefahrenpunkt Viadukt beseitigen
Einzelprojekte:	- Techn. Maßnahme zur Verhinderung von "Stürzen" der Radfahrer
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2009
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Oktober 2009
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	14.10.2009



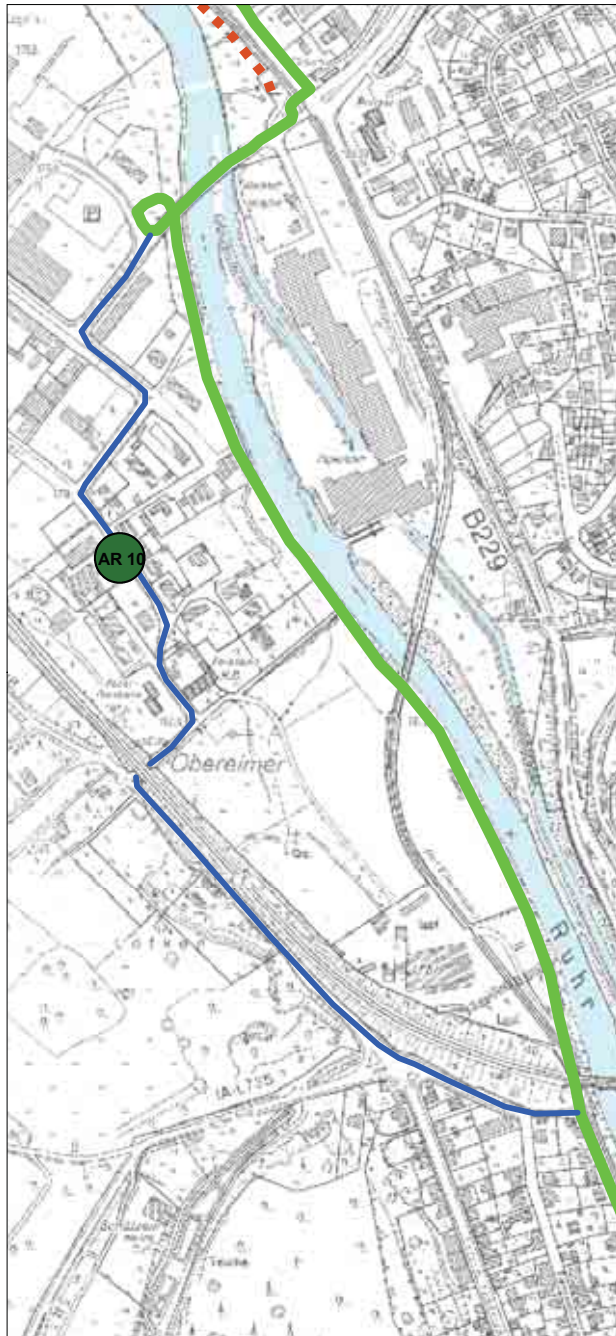


Ortsteil:	Arnsberg
Maßnahme:	AR 10
Bezeichnung:	Hochwasserumfahrung "Obereimer"
Einzelprojekte:	- Karte ins Netz (RuhrtalRadweg-Homepage)
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☒ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2007 / 2008
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Jan. 2008
Nächste Schritte:	- Beschilderung ; Information an Sauerlandtouristik
Stand der Maßnahme:	13.03.2008

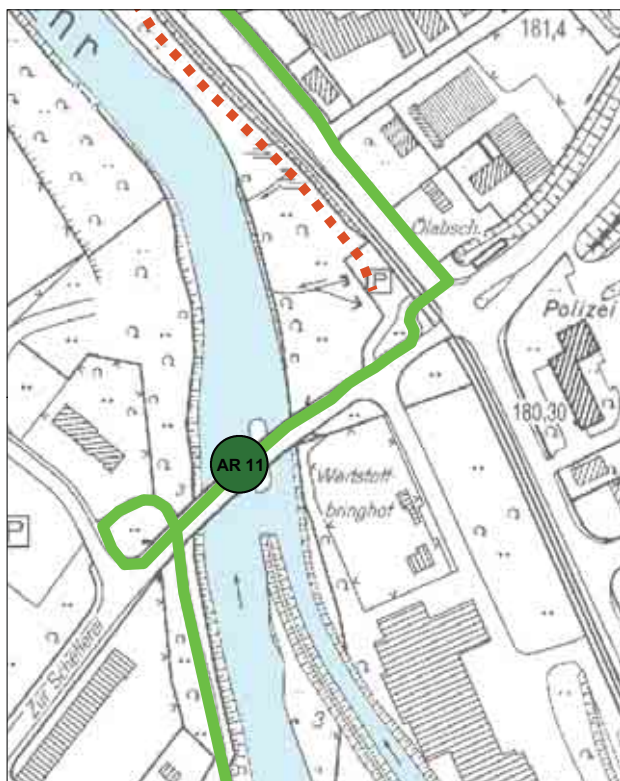


Ortsteil:	Arnsberg
Maßnahme:	AR 11
Bezeichnung:	Ruhrquerung Hammerweidebrücke
Einzelprojekte:	a.) Kreuzungsfreie Unterführung b.) Radverkehrsanlage auf der Brücke
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
Realisierungszeitraum:	2006
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Dez. 2006
Nächste Schritte:	Siehe PKT. NI 1
Stand der Maßnahme:	21.12.2006



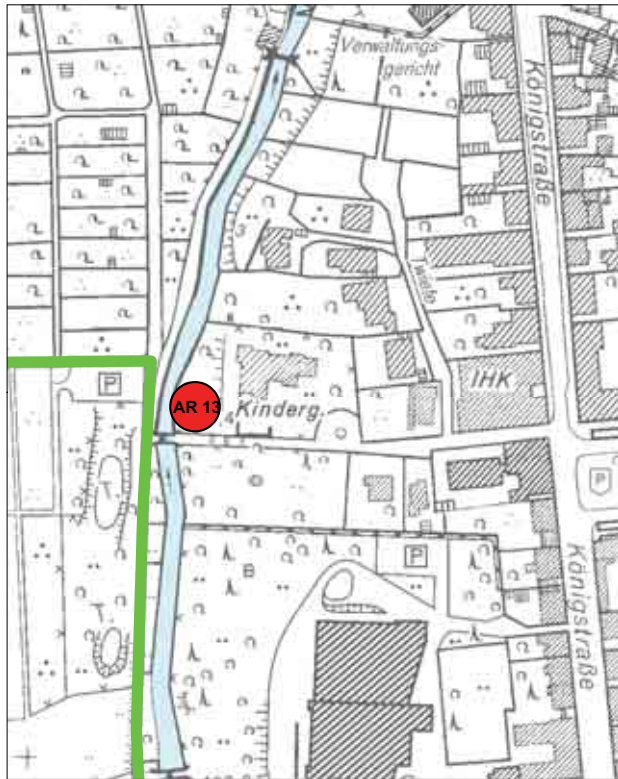

Ortsteil:	Arnsberg
Maßnahme:	AR 13
Bezeichnung:	Neugestaltung Gärten und Fußwegbrücke am Mühlengraben
Einzelprojekte:	- Bau einer Fahrradabstellanlage -boxen
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☒ in Planung ☐ in Bau ☐ abgeschlossen
Nächste Schritte:	- Bauausführung
Stand der Maßnahme:	15.03.2010





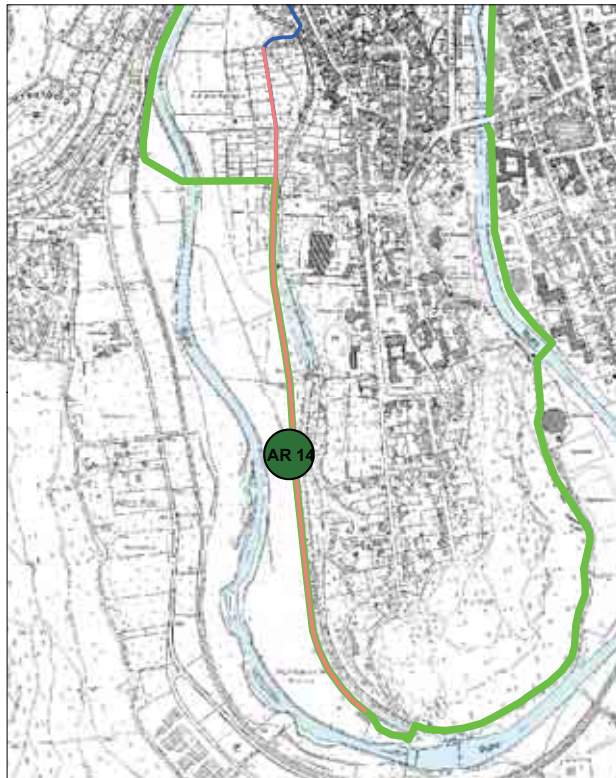


Ortsteil:	Arnsberg
Maßnahme:	AR 14
Bezeichnung:	Radverkehrsanlage „Auf den Kämpen“
Einzelprojekte:	- Fahrradstraße/Deckenerneuerung
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2009
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Okt. 2008 / Mai 2009
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	26.05.2009




Niedereimer | Bruchhausen

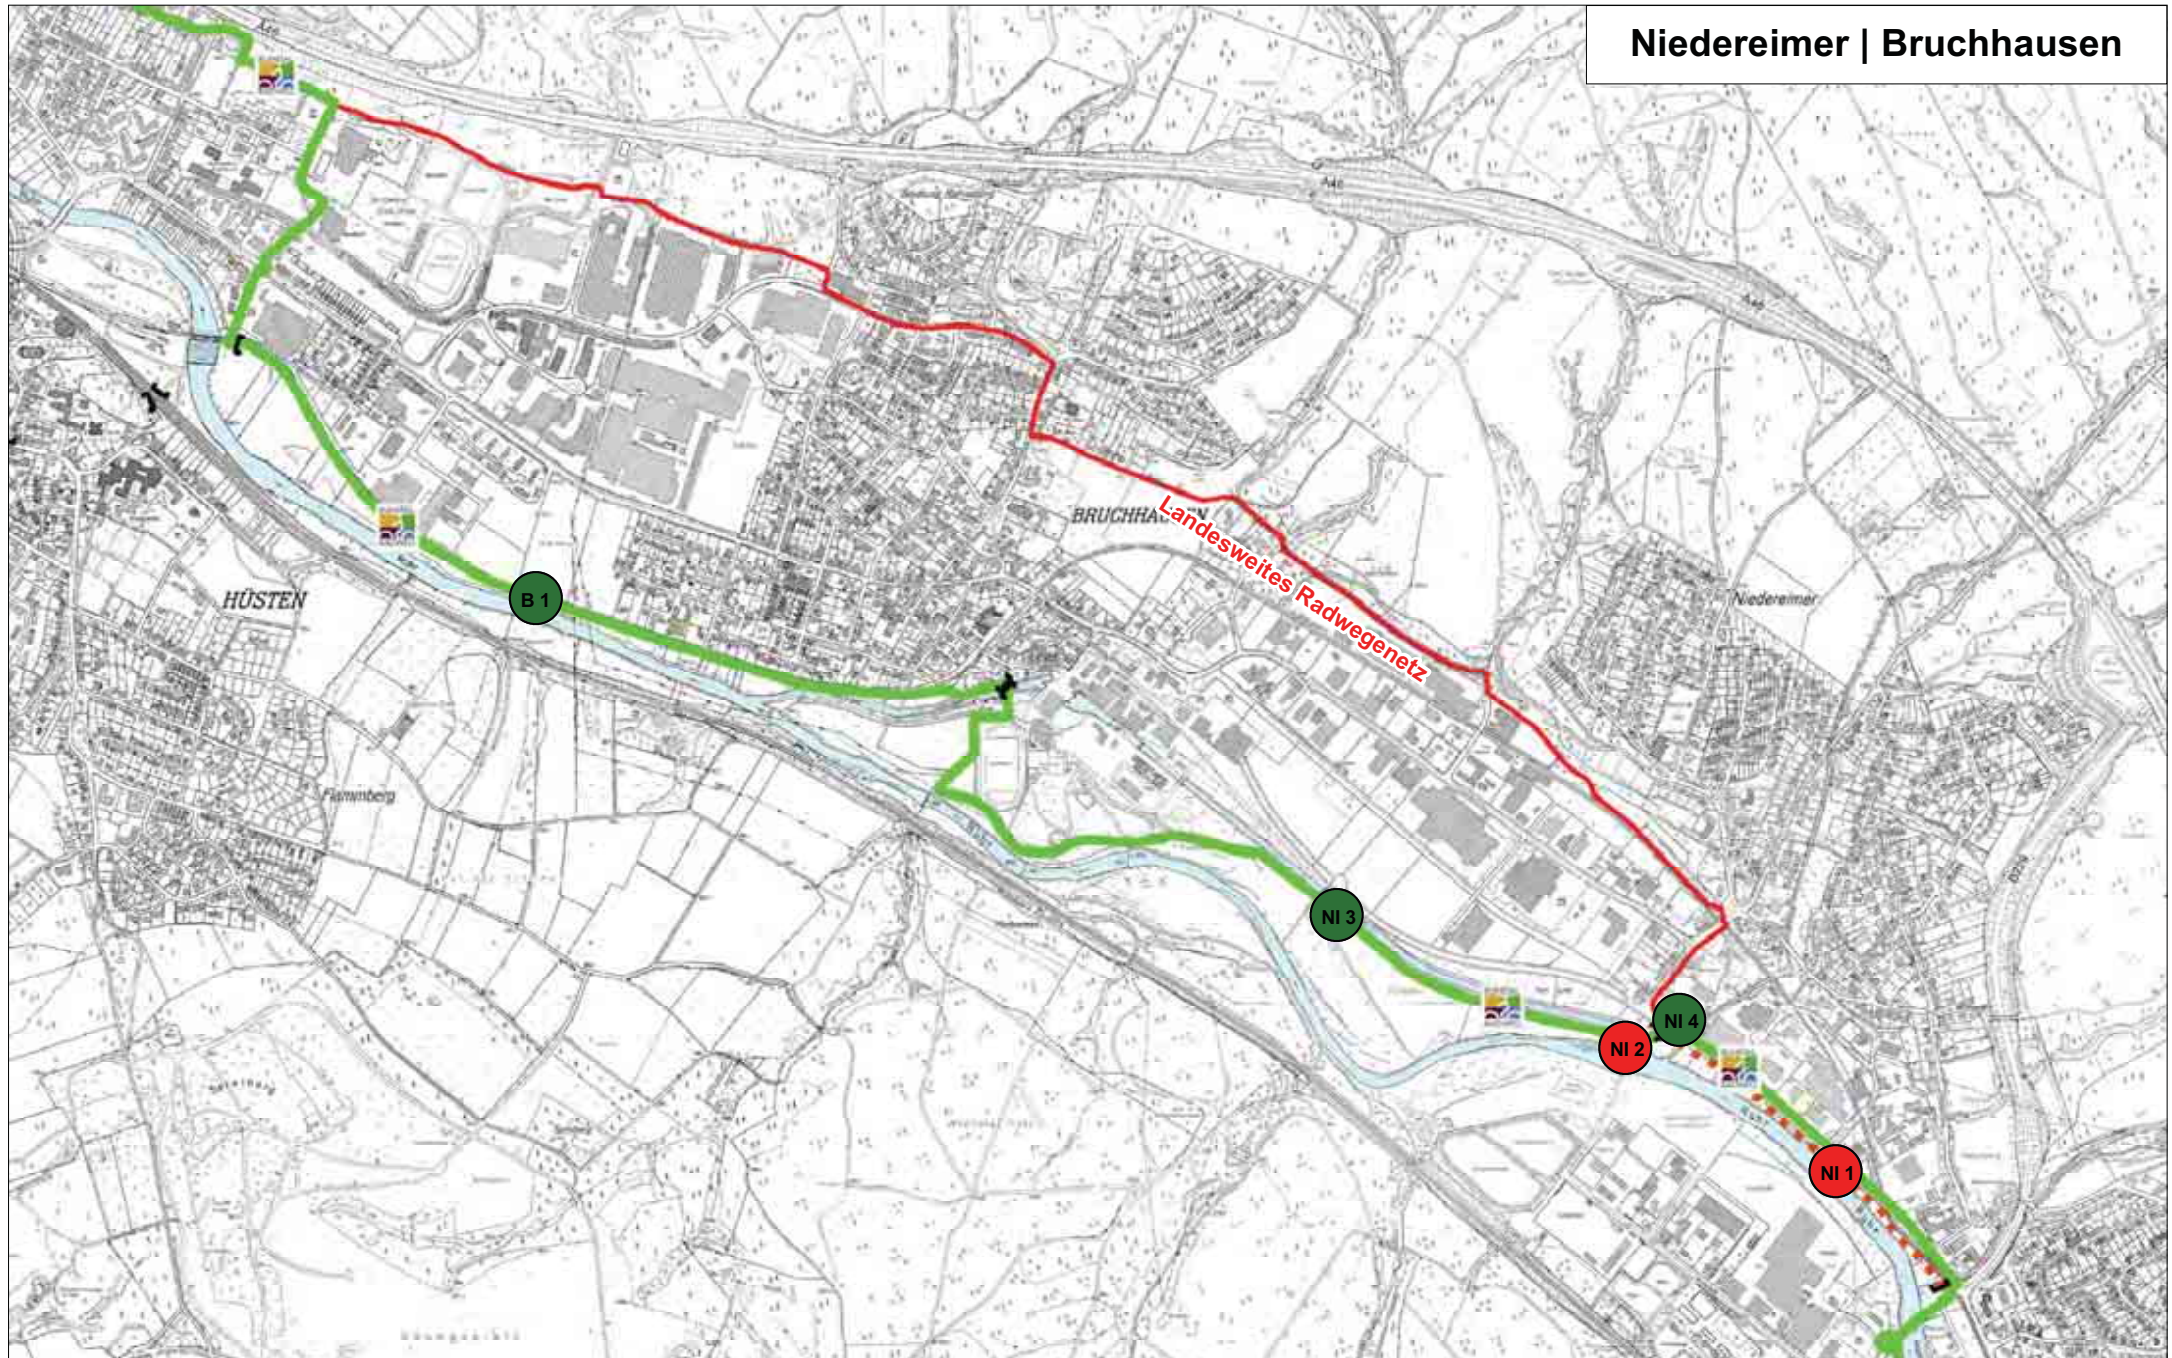

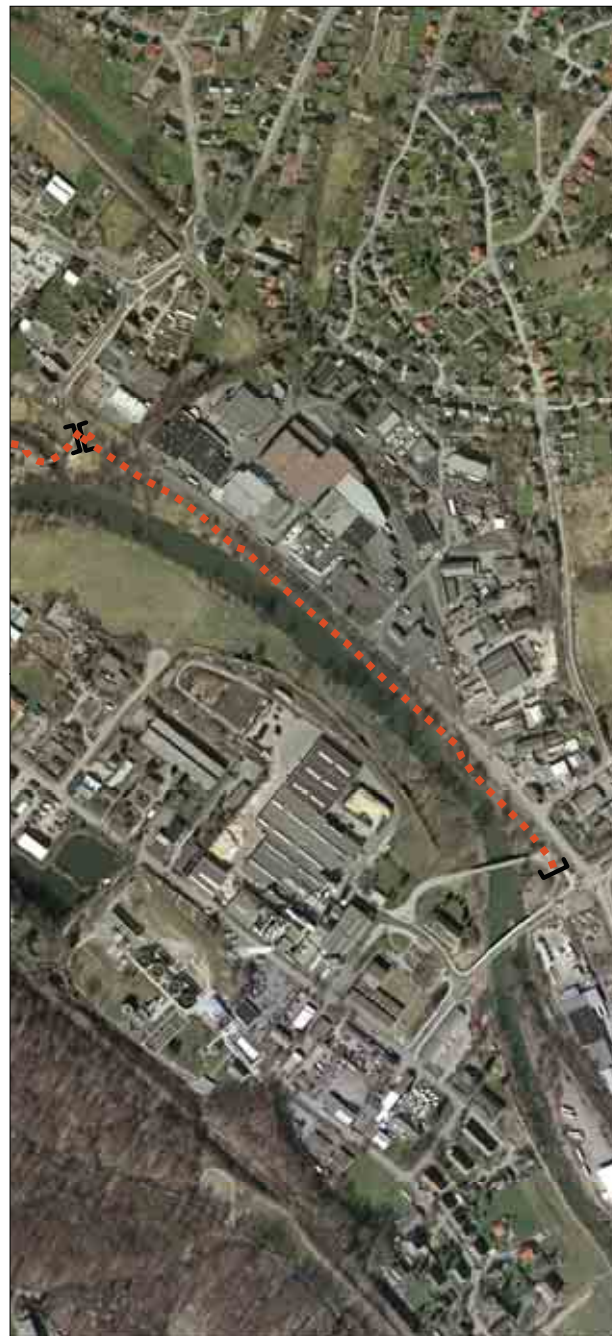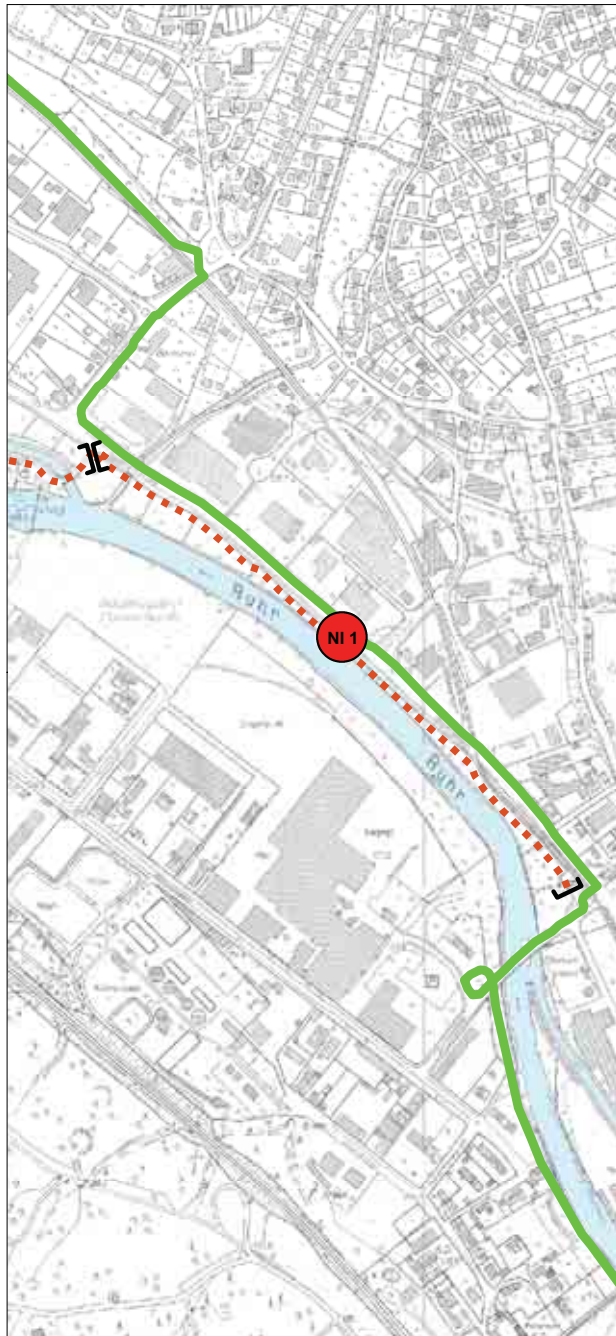


Ortsteil:	Niedereimer
Maßnahme:	NI 1
Bezeichnung:	Landesstraßenbegleitender Radweg zwischen Hammerweidebrücke und Haus Bienstein (auf der Ruhrseite)
Einzelprojekte:	- Planung und Neubau eines Radweges auf 800 m Länge ab P+R – Platz zwischen Gleisen und Ruhr bzw. parallel der Sauerlandstraße - Querungsstelle in Höhe Einmündung Weg zum Wehr
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☒ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	nur in Verbindung mit Maßnahme NI 3 sinnvoll, um verkehrssichere Führung zu erreichen
Stand der Umsetzung:	☒ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☐ abgeschlossen
Nächste Schritte:	- Machbarkeitsprüfung - Landschafts- u. wasserrechtl. Klärung
Stand der Maßnahme:	15.03.2010



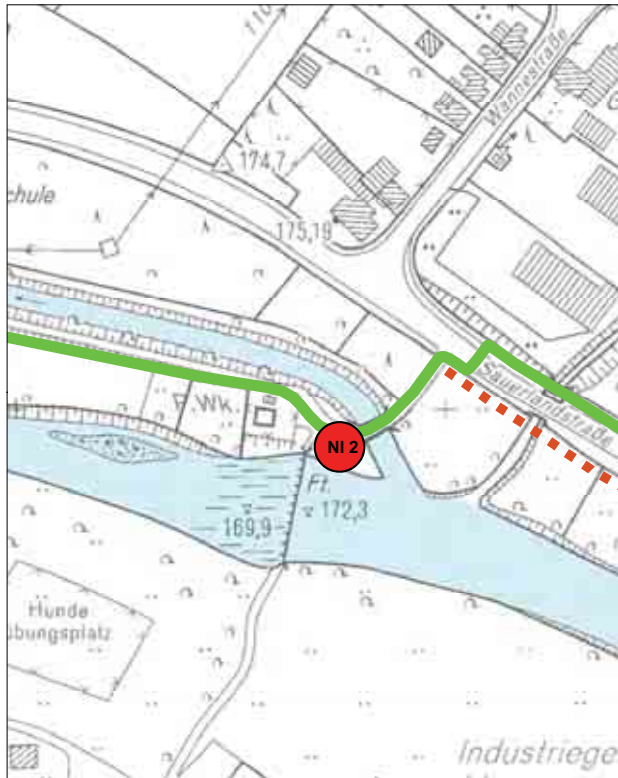



Ortsteil:	Niedereimer
Maßnahme:	NI 2
Bezeichnung:	Aufenthaltsbereich am Wehr Niedereimer
Einzelprojekte:	Planung und Bau eines Aufenthaltsbereichs am Wehr in Niedereimer (nur i. V. m Verlegung des Radweges Maßnahmen NI 1 und NI 3 zu realisieren)
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☒ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	☒ in Vorbereitung (Machbarkeitsprüfung erforderlich) ☐ in Planung ☐ in Bau ☐ abgeschlossen
Nächste Schritte:	- Idee wird bis auf weiteres zurückgestellt.
Stand der Maßnahme:	06.07.2010



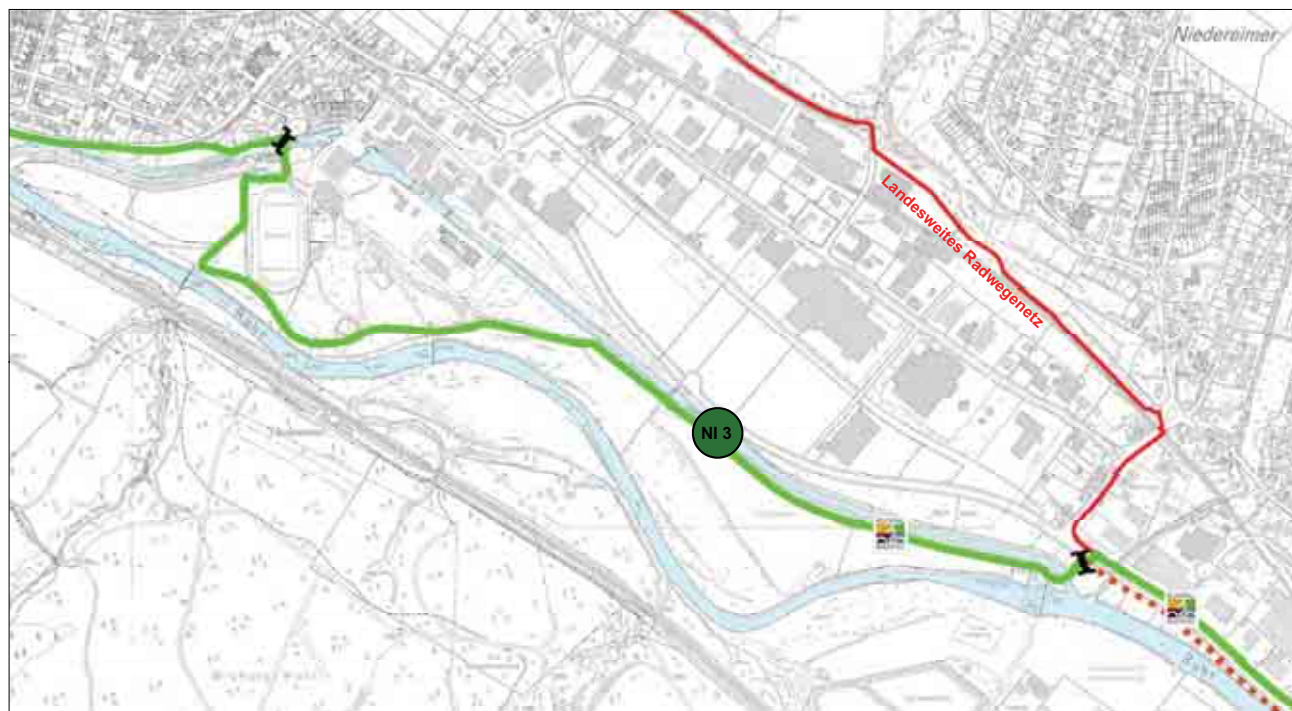


Ortsteil:	Niedereimer
Maßnahme:	NI 3
Bezeichnung:	Neuer eigenständiger Radweg zwischen Niedereimer – Wannestraße und Bruchhausen – Sportplatz auf ca. 1,8 km Länge
Einzelprojekte:	- Planung und Realisierung einer umweltverträglichen Trasse entlang des Obergrabens
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Juni 2010
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	28.06.2010



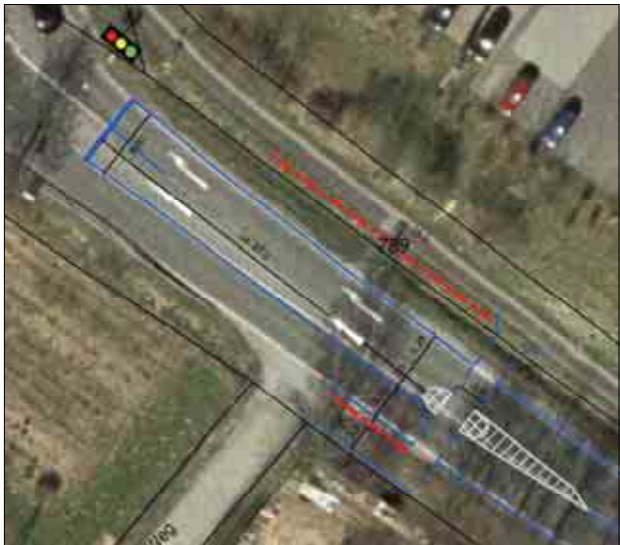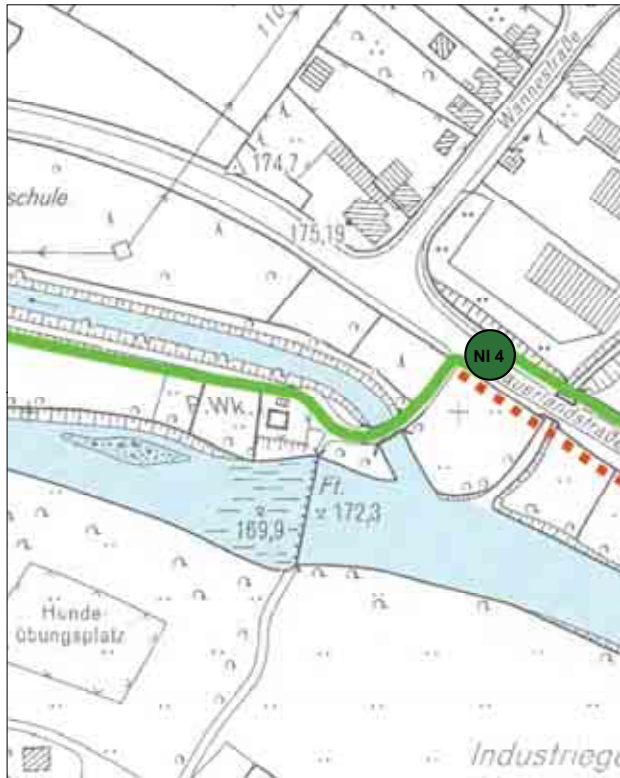


Ortsteil:	Niedereimer
Maßnahme:	NI 4
Bezeichnung:	Querungshilfe Sauerlandstraße Niedereimer
Einzelprojekte:	Planung und Bau einer Querungshilfe an der Sauerlandstraße Höhe Aldi
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Juni 2010
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	28.06.2010

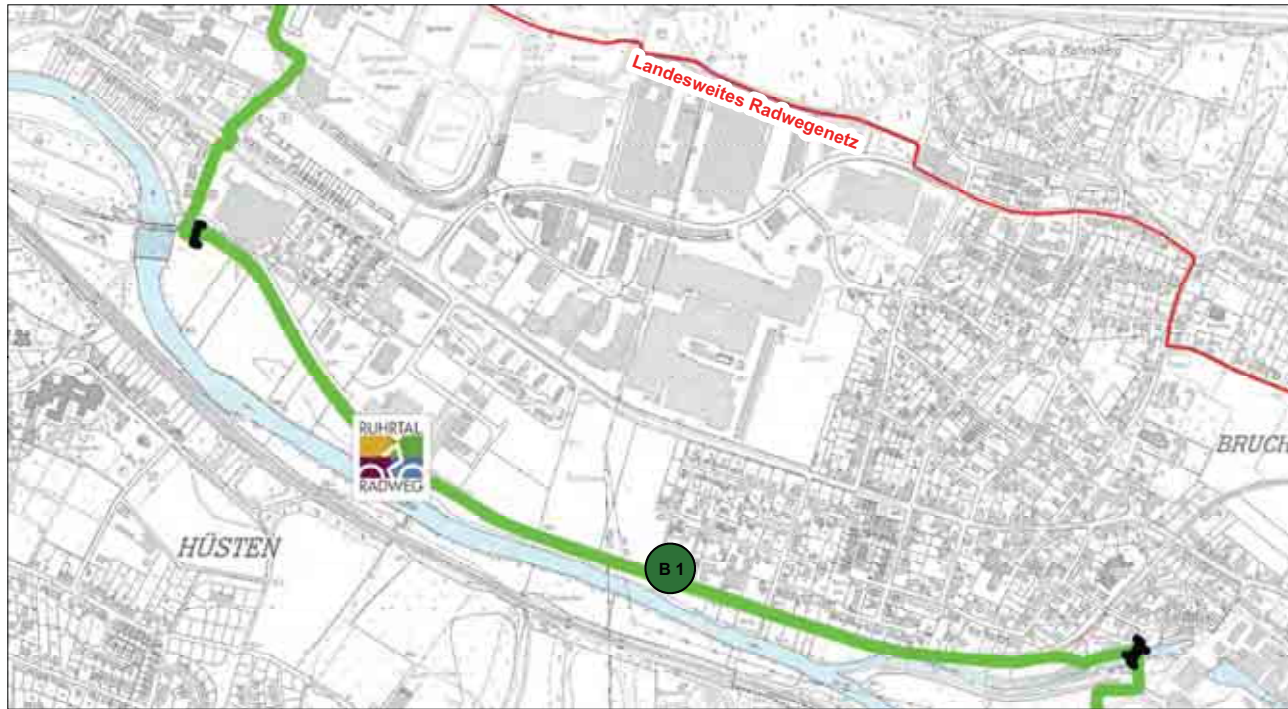

Ortsteil:	Bruchhausen
Maßnahme:	B 1
Bezeichnung:	Neuer Radweg Bruchhausen – Hüsten entlang RLG – Trasse (bis Möbel-Wortmann)
Einzelprojekte:	- Verlegung des Ruhrtalradweges (Beschilderung) - Öffnung der bestehenden Kanaltrasse für den Radverkehr (einschl. Sicherungsmaßnahmen und teilweise Deckenerneuerung)
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Juni 2010
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	29.06.2010




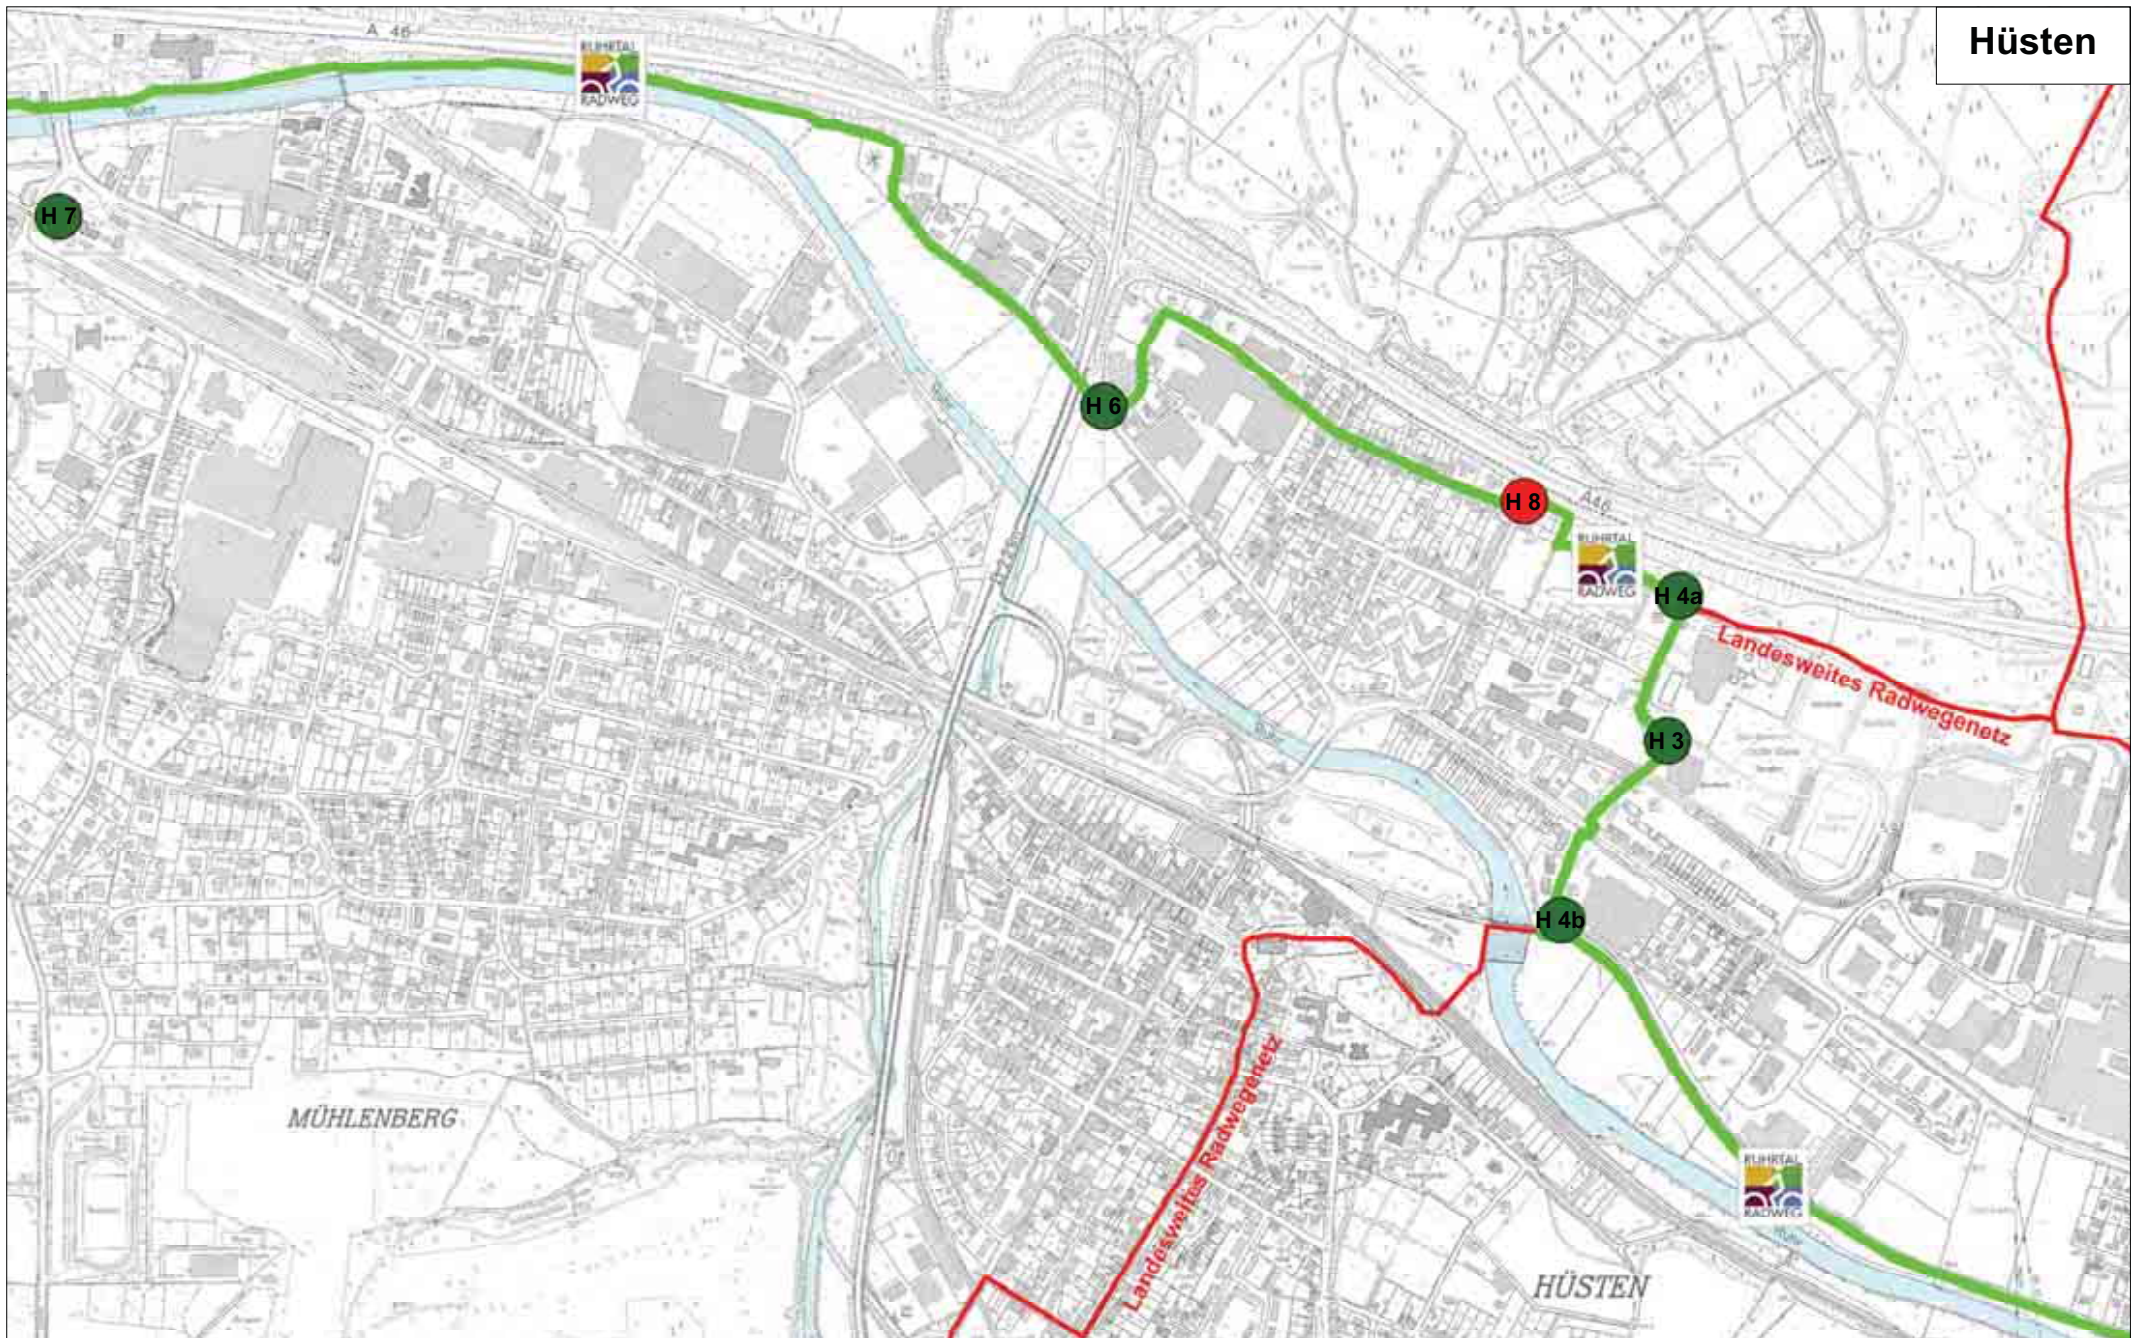



Ortsteil:	Hüsten
Maßnahme:	H 3
Bezeichnung:	Neue Linienführung des RuhrtalRadweges im Bereich Hüsten - Nass
Einzelprojekte:	- Änderung der Linienführung durch Beschilderung; - ggf. Maßnahmen zur besseren Querung der Amsberger Straße
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Juni 2010
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	29.06.2010



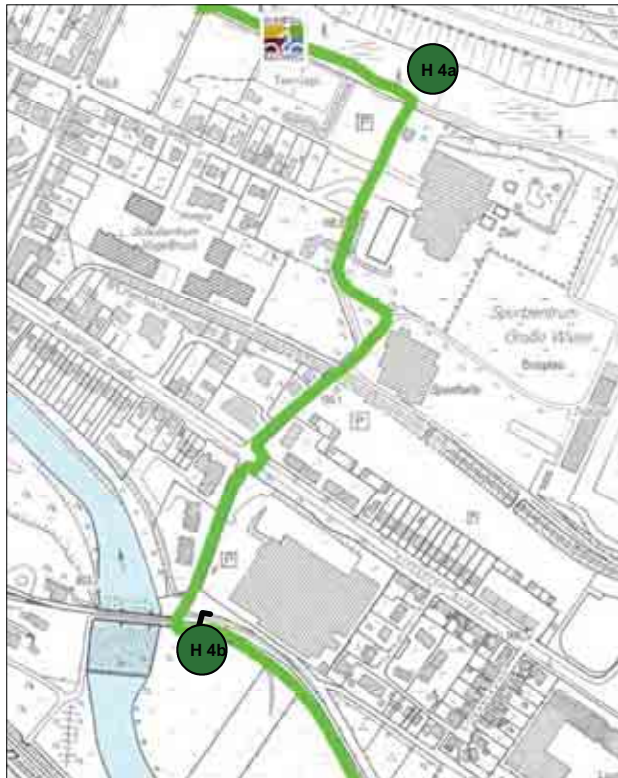


Ortsteil:	Hüsten
Maßnahme:	H 4a / 4b
Bezeichnung:	Aufstellung eines Infoportals
Einzelprojekte:	H 4a provisorisch (bis Verlegung des Radweges erfolgt) H 4b nach Verlegung RuhrtalRadweg auf neue Trasse
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2009
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung..... ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen a) Januar 2008 / b) Juni 2010
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	29.06.2010





Ortsteil:	Hüsten
Maßnahme:	H 6
Bezeichnung:	Verkehrssichere und autofreie Querung der B 229 n
Einzelprojekte:	- Unterführung im Zuge des Neubaus der B 229n und Brücke an der Wagenbergstraße
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2009
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Januar 2009
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	22.01.2009



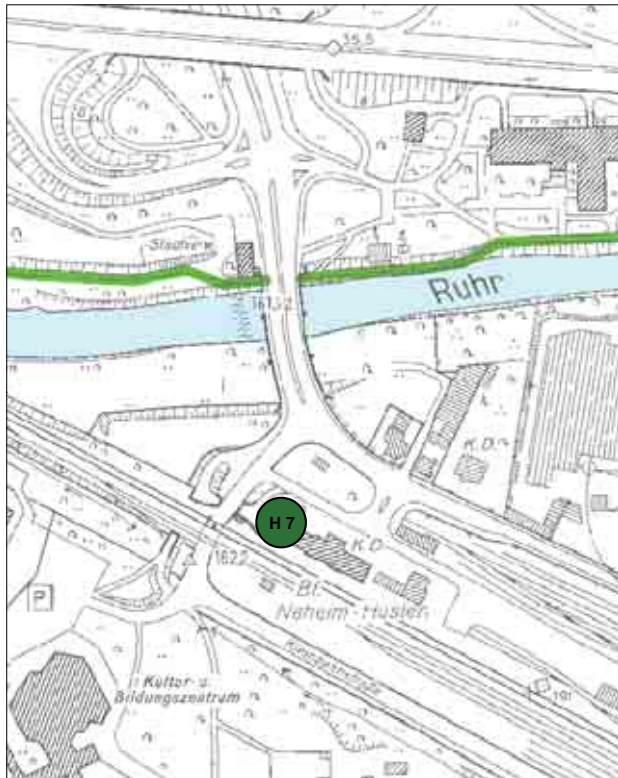

Ortsteil:	Hüsten
Maßnahme:	H 7
Bezeichnung:	Aufstellen von 7 Fahrradboxen am Bahnhof Neh.-Hüsten
Einzelprojekte:	Erwerb und Aufstellung der Fahrradboxen
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	Anfang 2008
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung..... ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen April 2008
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	02.04.2008




Bestand Delecker Straße




Beispiel Freiburg




Ortsteil:	Hüsten
Maßnahme:	H 8
Bezeichnung:	Radfahrerquerung Delecker Straße
Einzelprojekte:	RuhrtalRadweg Delecker Straße
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☒ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☒ in Planung ☐ in Bau ☐ abgeschlossen
Nächste Schritte:	- Straßenverkehrsrechtliche Abstimmung
Stand der Maßnahme:	10.10.2009

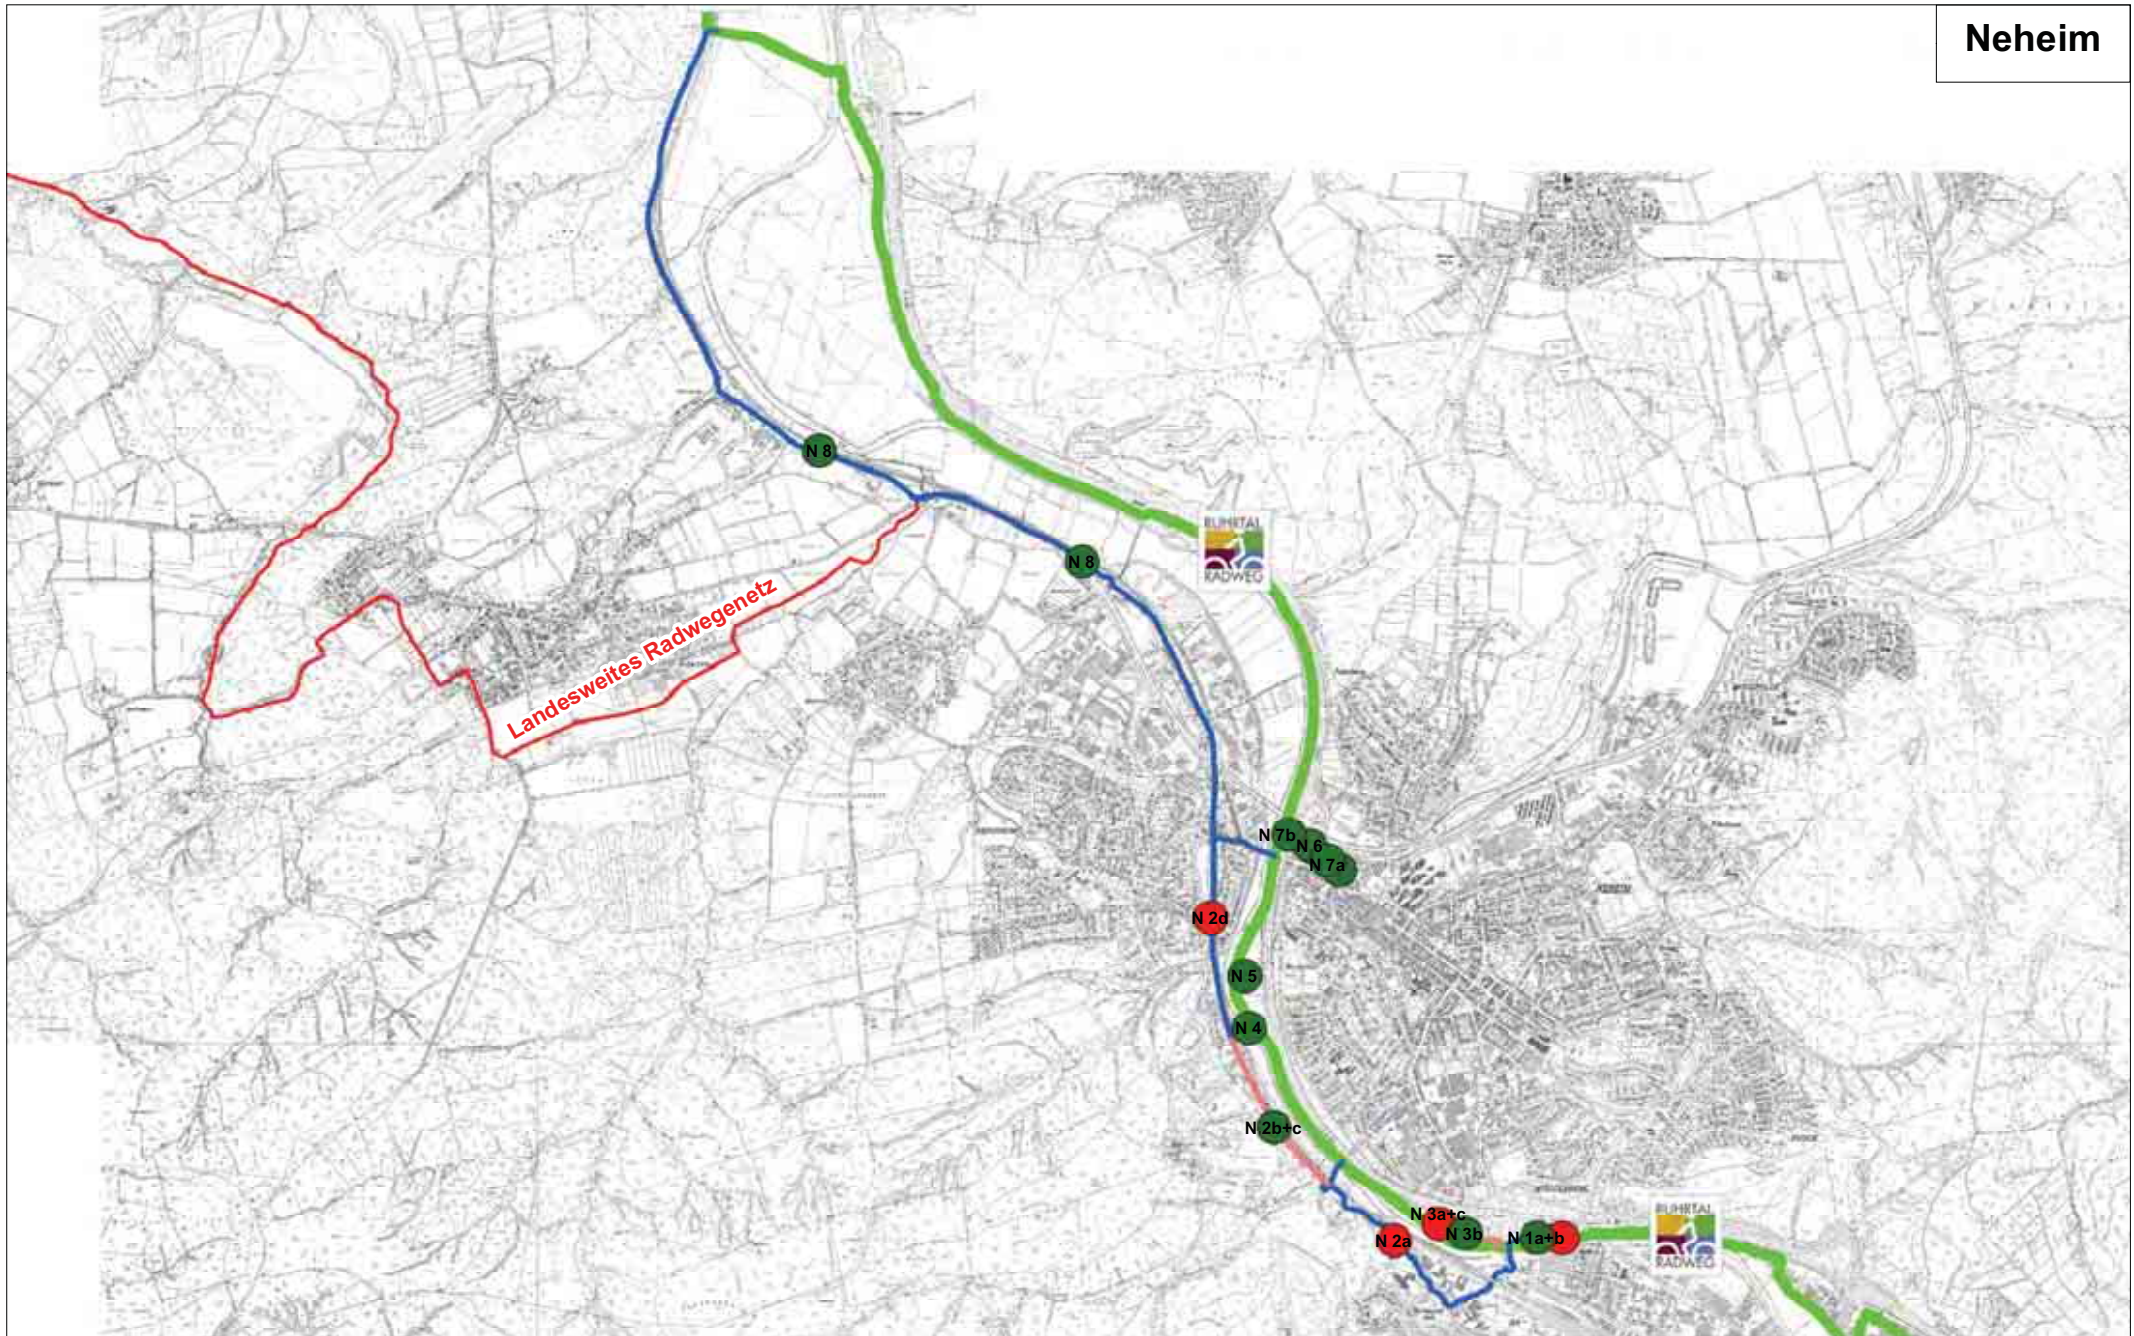

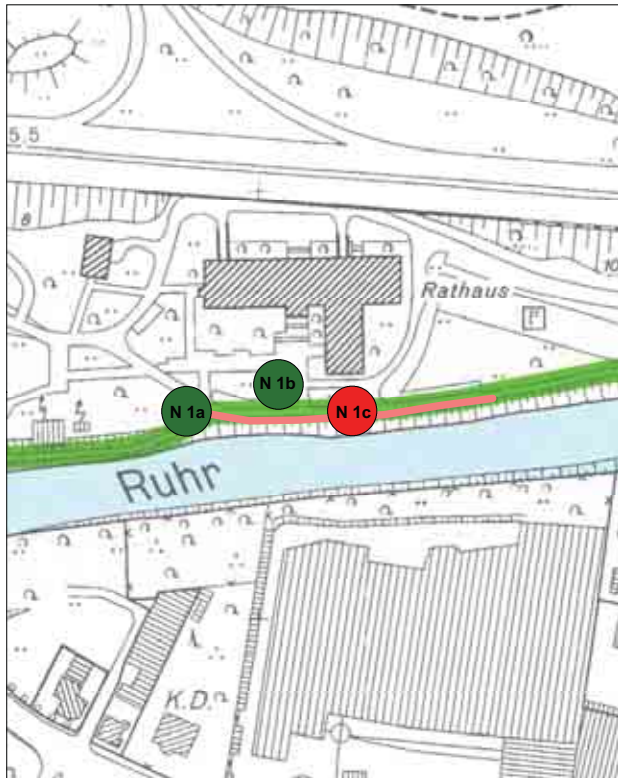



Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 1
Bezeichnung:	Zentraler Info -/ Aufenthaltspunkt Rathaus Neheim
Einzelprojekte:	a) Aufstellung Infoportal b) Fahrradabstellanlage für Rathausbesucher, Kanti- nengäste u. Mitarbeiter im Dezember 2007 c) Ausweisung eines Teilstücks als Fahrradstraße
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	a) und b) Anfang 2008 c) 2010 ff
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☒ in Planung c) ☐ in Bau ☒ abgeschlossen a) + b) Jan. 2008/ Jan. 2009
Nächste Schritte:	- Gesamtkonzept Verkehr am Rathausplatz erarbeiten und einleiten - Konzeption aus Masterplan Ruhr berücksichtigen - schrittweise Realisierung (Baustufen erarbeiten)
Stand der Maßnahme:	15.03.2010



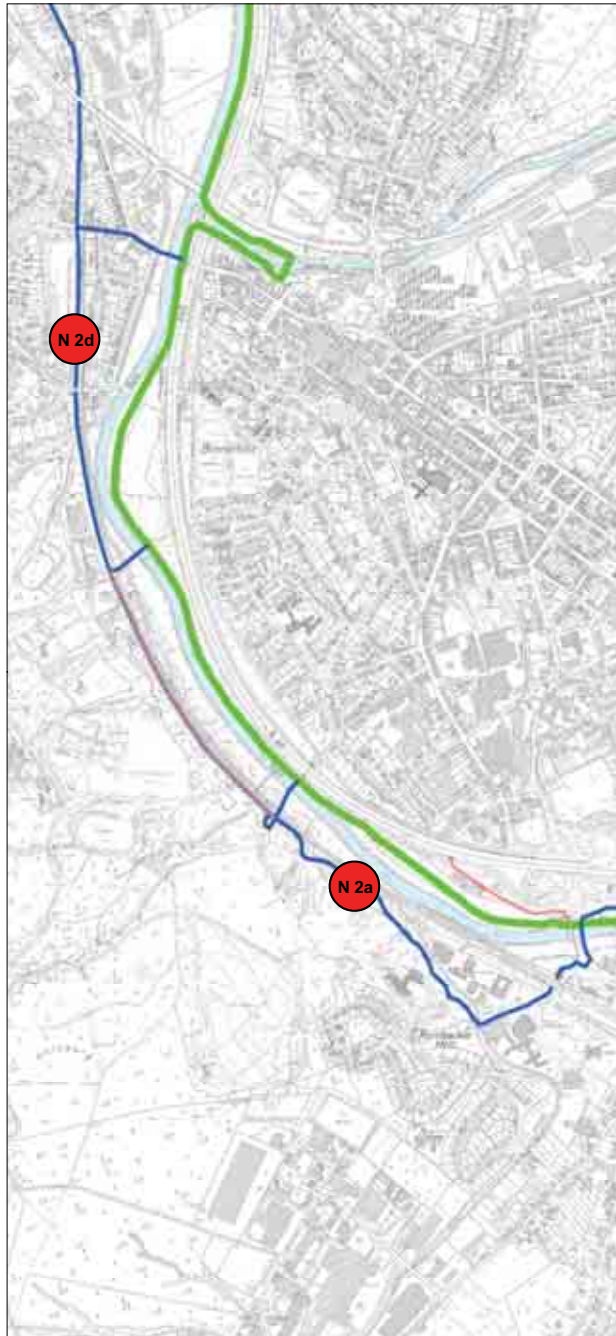


Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 2
Bezeichnung:	Hochwasserumfahrung "Binnerfeld"
Einzelprojekte:	- a.)Nebenstrecke Landesweites Radwegenetz (RVN – NRW) geplant - b.)Aufnahme im Kartenmaterial etc. - c.)Eintragung auf RuhrtalRadweg – Homepage - d.)Asphaltbelag zwischen Berghheimer Weg und Westfalenstraße
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☒ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010 ff
Stand der Umsetzung:	☒ in Vorbereitung a.) und d.) ☐ in Planung ☐ in Bau/Umsetzung..... ☒ abgeschlossen b.) Jan.2008 und c.) Juni.2008
Nächste Schritte:	- Anbindung des Bahnhofs prüfen
Stand der Maßnahme:	a.) + d.) 25.06.2010



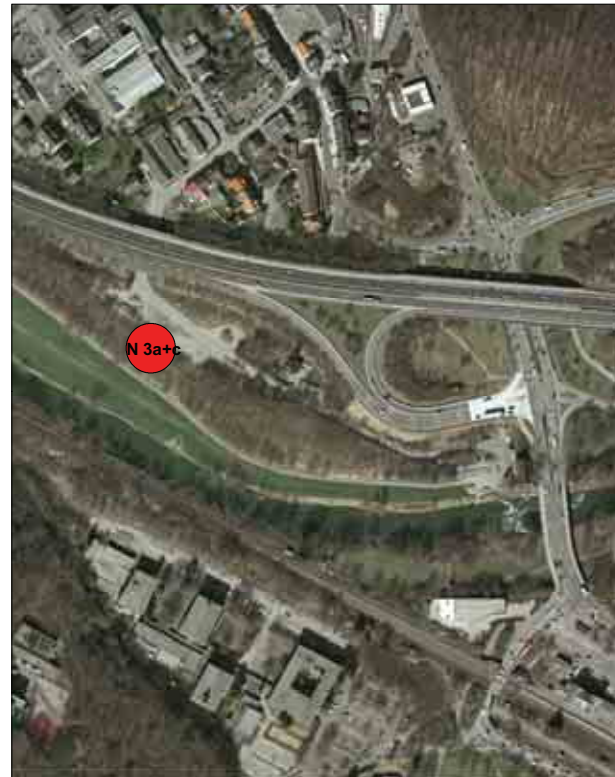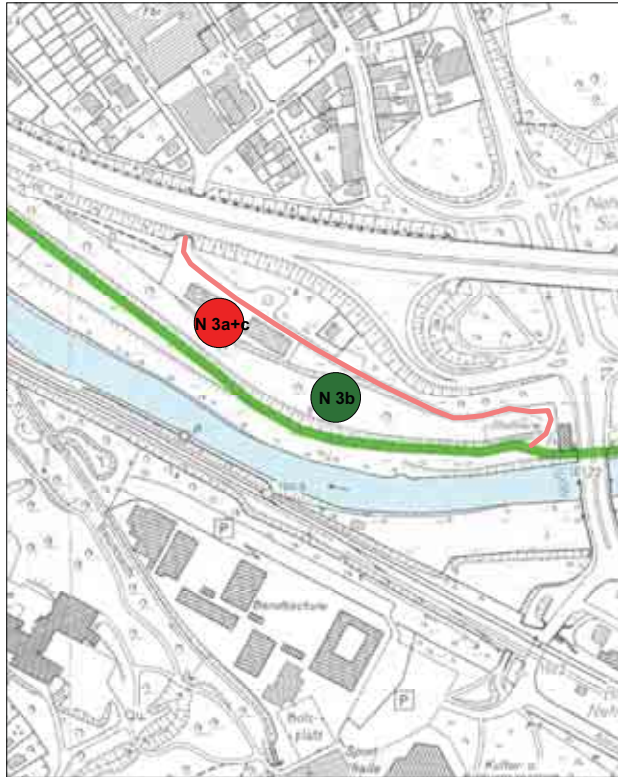


Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 3
Bezeichnung:	Anbindung Binnerfeld - RuhrtalRadweg
Einzelprojekte:	a) Wegeverbindung Schillerstraße über HW-Deich am RuhrtalRadweg b) Anlage eines Bolzplatzes (Masterplan Ruhr) c) Ergänzendes gastronomisches Angebot
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2010ff
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☒ in Bau a.) + c.) ☒ abgeschlossen b) Juni 2008
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	25.06.2010



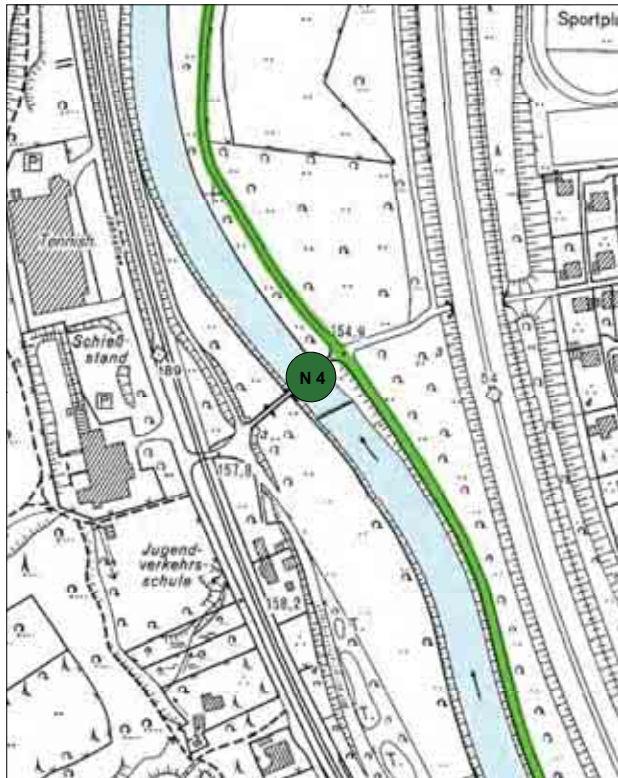

Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 4
Bezeichnung:	Ruhrquerung durch neue Rampe "Denzbrücke"
Einzelprojekte:	a) "Verlängerung" der Brücke (Anrampung)
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2009
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau/ ☒ abgeschlossen September 2009
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	21.09.2009



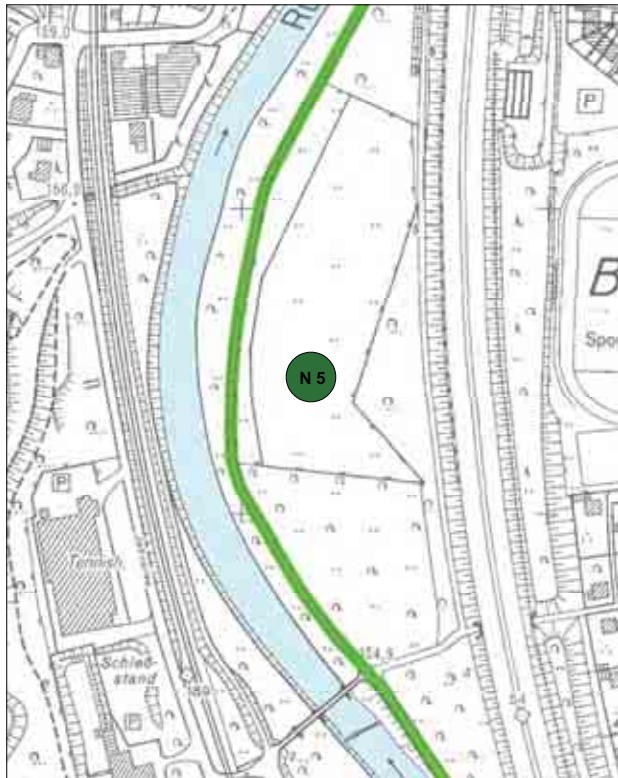

Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 5
Bezeichnung:	Schaffung von Aufenthaltsbereichen
Einzelprojekte:	testweise Aufstellen von "Sitzflößen" / Sitzplätze
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☒ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2009
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen September 2009
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	08.10.2009





Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 6
Bezeichnung:	Deckenerneuerung beiderseits der Möhne
Einzelpunkte:	Asphaltierung des Streckenabschnitts
Planungs- und Baurecht:	☒ vorhanden Befreiung vom Landschaftsplan ☐ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	2008
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Jan 2008
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	31.01.2008





Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 7
Bezeichnung:	Zentraler Info- / Aufenthaltspunkt Möhnepforte
Einzelprojekte:	a) Er-/ Aufstellung Infoportal b) Planung zur Neugestaltung Möhnepforte und Möhne- nemmündung c) Umgestaltung ehem. Spielplatz
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☒ nicht vorhanden ☐ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	a) Anfang 2008 b) und c) 2010
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen a) 16.03.2010 b)+c) Mai 2010
Nächste Schritte:	
Stand der Maßnahme:	20.05.2010





Ortsteil:	Neheim
Maßnahme:	N 8
Bezeichnung:	Hochwasserschutzumfahrung Im Ohl
Einzelprojekte:	a) Neue Ausschilderung R 12 über Voßwinkel – Bahnhof b) Plan ins Internet (RuhrtalRadweg – Homepage)
Planungs- und Baurecht:	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☒ nicht erforderlich
voraussichtl. Realisierungszeitraum:	a) 2007 / 2008
Stand der Umsetzung:	☐ in Vorbereitung ☐ in Planung ☐ in Bau ☒ abgeschlossen Jan. 2008
Nächste Schritte:	- Info an Sauerlandtouristik
Stand der Maßnahme:	30.01.2008
