

I. Quartal sbericht 201 2

Schulaus schuss
28.03.2012

Projektmanagement



Inhaltsverzeichnis

▪ Jahresarbeitsprogramm Schulbau	Seite 2
▪ HS Mengede Sanierung	Seite 3
▪ Anne-Frank-GES Sanierung	Seite 4
▪ Brüggmann-Zentrum Sanierung / Neubau	Seite 5
▪ SZ Grüningsweg Sanierung Immanuel-Kant-GYM / Max-Born-RS	Seite 6
▪ Gutenberg-OGS Neubau	Seite 7
▪ Gebundener Ganzttag Heinrich-Heine-GYM / Albert-Schweitzer-RS	Seite 8
▪ Gebundener Ganzttag Heisenberg-GYM	Seite 9
▪ Sporthalle Reinoldus-Schiller-GYM Neubau	Seite 10
▪ Sporthalle Goethe-GYM Neubau	Seite 11
▪ Sporthallenprogramm NOE (Nutzerorientierte Ertüchtigung)	Seite 12
▪ Brandschutz an Dortmunder Schulen	Seite 13-15
▪ GES Scharnhorst Brandschutzmaßnahmen	Seite 16
▪ Instandhaltungsrückstellung	Seite 17-18
▪ Bezirksvertretungsmaßnahmen	Seite 19




Jahresarbeitsprogramm an Dortmunder Schulen

(diverse Stadtbezirke)

Gesamtinvestitionsvolumen StA 65 in Bearbeitung (mehrjährig) 166 Mio €
Anteil StA 40 98 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen 82 Mio € (49 %)
68 BV Maßnahmen in Bearbeitung bei StA 65 mit einem Investitionsvolumen von 5,4 Mio € im Bereich Schulbau.

Projektanzahl nach Fachbereichen

32 %
(Stückzahl Projekte)
sind derzeit dem
Schulbau
zuzuordnen.

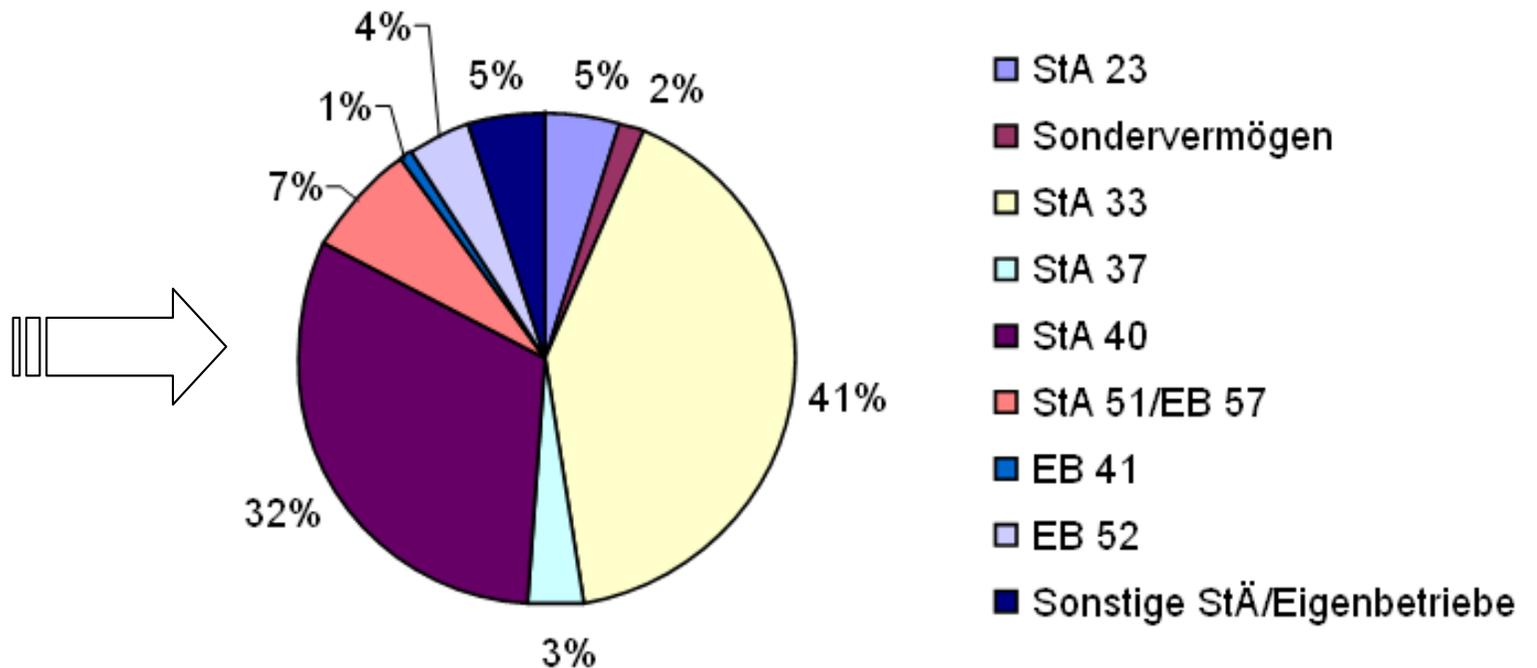

HS Mengede Sanierung

(Stadtbezirk Mengede)


- Beginn der Maßnahme Juni 2011
- Schadstoffsanierung und komplette Entkernung abgeschlossen
- Fensteraustausch in Abstimmung mit der Denkmalbehörde
- Erneuerung der Datenverkabelung, Elektroinstallation und HLS
- Erneuerung von Speiseraum und Küche
- Fachräume komplett neu
- Kellerwandabdichtung außen neu
- Erneuerung der Entwässerungsleitungen
- Fertigstellung Dezember 2012

Kosten:


- Maßnahme Gesamtsanierung 5.25 Mio. €
- Begleitmaßnahmen 1000-Schulen 200.000 €

Aktuelles:

- Derzeit erfolgt der Innenausbau (Rohinstallationen Elektro, HLS, Innenputz, Trockenbau, etc.)
- Die Vergabe zur Rissanierung (Rohbau) erfolgt zur Zeit
- Die Vergabe zur Untergrundverbesserung (Düsenstrahlverfahren) erfolgt in Kürze

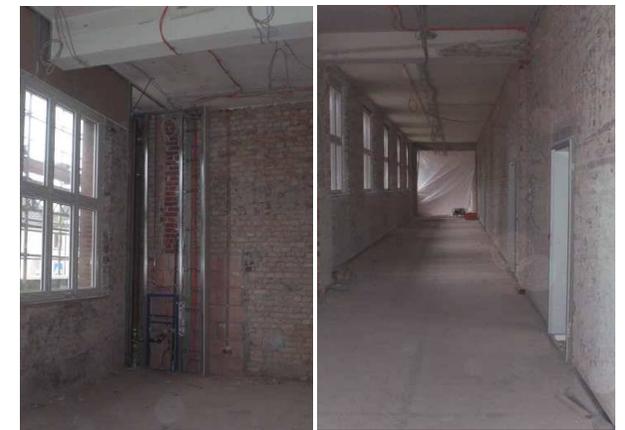

Stand gem. Ablauforganisation Hochbaumaßnahmen



Anne-Frank-GES

Sanierung Bauteil A+B

(Stadtbezirk Innenstadt-Nord)




- Voraussetzung für eine Sanierung der Anne-Frank-Gesamtschule war der Neubau der Vincke-Grundschule und damit verbunden der Umzug in das neue Gebäude.
- Der Altbau der Vincke-Grundschule wird als Ausweichquartier für die einzelnen Sanierungsabschnitte der Anne-Frank-Gesamtschule am Standort Burgholzstraße 120 benötigt.
- Im Anschluss an den Freizug des bisherigen Bestandsgebäudes der Grundschule wird dieses für eine Zwischennutzung durch die Anne-Frank-Gesamtschule hergerichtet.
- Anpassungsbedarf besteht darüber hinaus beim Forum.

Kostenrahmen: ca. 15.850.000 Euro

Aktuelles:

- Planung: Übertragung der Anne-Frank-Gesamtschule in das Sondervermögen
- Bauteile A + B werden barrierefrei ertüchtigt
- Freigabe durch die Schulleitung für die vorgestellte Entwurfsplanung
- Die Schulkonferenz lehnte die Entwurfsplanung kompromisslos ab.
- Die beiden Vorlagen Baubeschluss und Einlagebeschluss sind im Gremienlauf zur Ratssitzung am 24.05.2012



Brügmann-Zentrum Grundsanierung

(Stadtbezirk Innenstadt-West)




- Mit der Sanierung des Berufsschulkomplexes werden die Gebäude den schulischen Erfordernissen angepasst.
- Die erforderliche Barrierefreiheit wird bei der Planung der Maßnahmen berücksichtigt.
- Teile der Haustechnik sind auf den aktuellen Stand zu bringen bzw. zu ertüchtigen
- Oberflächen von Wänden, Decken und Böden, die aufgrund veränderter Raumzuschnitte von baulichen Maßnahmen betroffen sind, werden mit dem Standard eines Neubaus saniert.

Kosten: Die Kosten von 46 Mio. € gemäß bestehender Beschlussfassung müssen fortgeschrieben werden.

Aktuelles:

- Konrad-Klepping-BK: fertiggestellt
- Karl-Schiller-BK: fertiggestellt
- Fritz-Henßler-BK: Zur Zeit wird aus dem Forderungskatalog der Denkmalpflege die Untersuchung der Flächen- und Nutzungsbedarfe durch ein externes Ingenieurbüro erstellt. Mit der Festlegung der Flächen- und Nutzungsbedarfe wird die Denkmalpflege in die Lage versetzt, den Grad der baulichen Erhaltung und den Anteil von möglichen Neubauf Flächen festzulegen.

Stand gem. Ablauforganisation Hochbaumaßnahmen

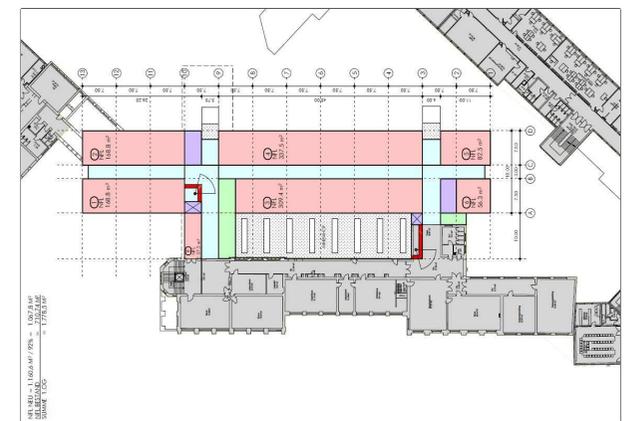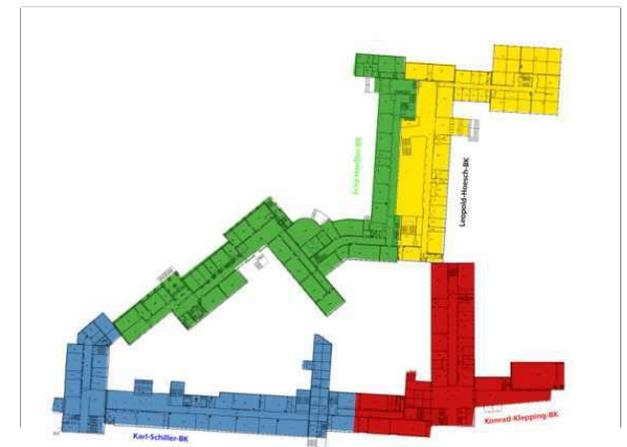

Immanuel-Kant-Gymnasium / Max-Born-Realschule Schulzentrum Grüningsweg Sanierung (Stadtbezirk Brackel)

Auftrag des Sondervermögens 03.02.2011

Voruntersuchungen und Informationen für Sanierungsmaßnahmen aus den Bereichen:

- Schadstoffsanierung
- Statische Untersuchungen
- Energetische Untersuchungen
- Heizung- Lüftung, Sanitär und Klimatechnik
- Schmutzwasserkanaluntersuchung

Brandschutzsanierung (Beauftragung Sondervermögen):


- Architekturplanung
- Datenverkabelung
- Elektroplanung
- Ergänzung des Brandschutzkonzeptes

Kosten:


- Grundsanierung 20.6 Mio. €

Aktuelles:

- StA 23 Planungsauftrag für die Grundsanierung steht noch aus.

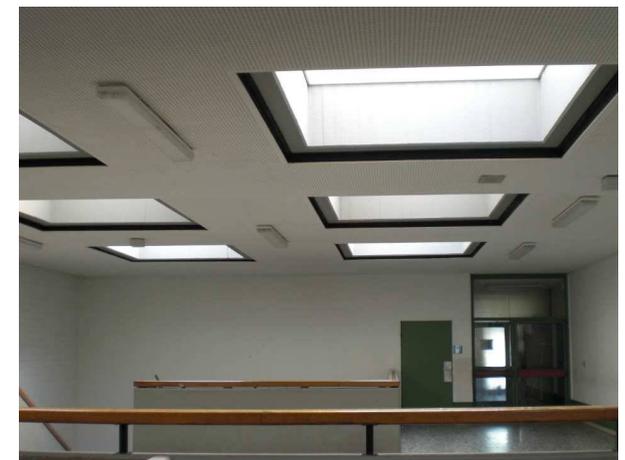

Stand gem. Ablauforganisation Hochbaumaßnahmen




Gutenberg-OGS

Neubau

(Stadtbezirk Innenstadt-West)

- Der Neubau der OGS ist nach nutzerspezifischen Wünschen und nach Vorgaben des Bebauungsplans als langgestreckter eingeschossiger Baukörper entlang der Grundstücksgrenze konzipiert.
- Er orientiert sich entsprechend der planungsrechtlichen Vorgaben mit seinen Betreuungsräumen nach Norden zum Schulhof bzw. zum Schulgebäude.
- Der überdachte Eingangsbereich der OGS liegt direkt gegenüber dem Schuleingang, dieses ermöglicht den Schüler/innen kurze Wege zwischen beiden Gebäuden und signalisiert zugleich den Eingang zu OGS und Schule.
- Im Süden grenzt der Neubau das Schulgelände ab.



Kosten:


- Maßnahme **998.000 Mio. €**

Aktuelles:

- der Innenausbau und die Installation der Haustechnik sind in vollem Gang.
- die DEW stellt den Hausanschluss im März fertig.
- das Möblierungs- und Farbkonzept sowie die Gestaltung der Außenanlagen wurden mit dem Nutzer abgestimmt (Ausführung im Frühjahr).
- für den REWE-Markt gibt es eine Baugenehmigung (Baubeginn ist ungewiss).



Stand gem. Ablauforganisation Hochbaumaßnahmen



Gebundener Ganztag SZ Nette Heinrich-Heine-GYM / Albert-Schweitzer-RS (Stadtbezirk Mengede)


- Errichtung einer Küche mit Mensa im ehem. Verwaltungstrakt der HS Nette
- Einrichtung eines Selbstlernzentrums für die Schüler
- Umnutzung von Klassenräumen in Betreuungs- & Freizeiträumen
- Schaffung von Lehrer-Arbeitsbereichen, Beratungs- & Besprechungsräume

Kosten:


- Begleitmaßnahme GT ca. 755.000 €
- Hauptmaßnahme Brandschutz + DV ca. 3.93 Mio. €

Aktuelles:

- Die Vorplanung zum GT ist abgeschlossen
- Die Umsetzung soll im Zuge der Brandschutzsanierung erfolgen
- Weitere Begleitmaßnahmen sind: Sanierung und Erweiterung der NW-Fachräume sowie Flachdachsaniierungen über den Kunsträumen und vom PZ

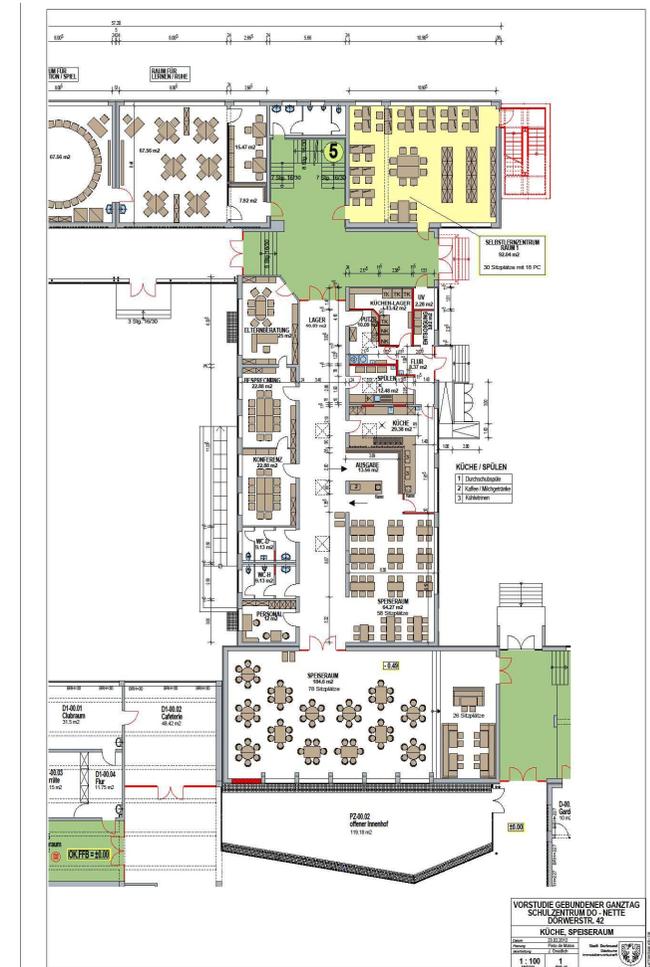

Stand gem. Ablauforganisation Hochbaumaßnahmen



Gebundener Ganztag Heisenberg-GYM

(Stadtbezirk Eving)


- Aufstellung Raumprogramm in Abstimmung mit Nutzern u. Fachämtern ist erfolgt
- Flächenerweiterung ist notwendig
- Variantenuntersuchungen im Rahmen der Vorplanung für Erweiterungsflächen der Mensa und der Klassenräume
 - Variante 1: Neubau als Solitär im Schulhofbereich (Verlegung Schulhof notwendig)
 - Variante 2: Anbau an Bestandsgebäude
- Umbau im Bestand (Ganztag und Verwaltung)

Kosten:

- Gesamtmaßnahme 4.4 Mio. €
(Neubau 2.985.000 € / Umbau 1.095.000 € / Schulhofverlegung 260.000 €)

Aktuelles:

- Variantenuntersuchungen laufen zur Zeit für den Anbau
- nach der Variantenentscheidung:
Fortsetzung der Planung und Vorbereitung des Planungsbeschlusses

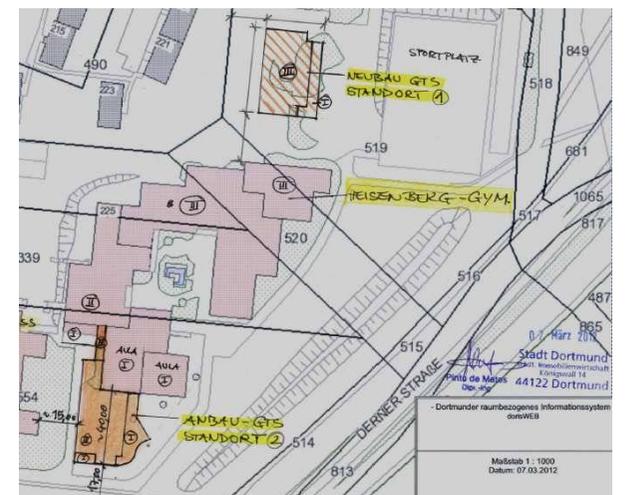

Stand gem. Ablauforganisation Hochbaumaßnahmen




Sporthalle Reinoldus-Schiller-Gymnasium

(Stadtbezirk Innenstadt-West)

Grundlage für die Strukturplanung zur systemoffenen Funktionalausschreibung und der Nutzungskostenanalyse ist das Standard-Raumprogramm für Sporthallen mit Klapptribünenanlage. Gemäß der Nutzungskostenanalyse wurde die Wertung der Angebote nach der wirtschaftlich günstigsten dynamischen Kostenberechnung für einen Betrachtungszeitraum des Lebenszyklus von 40 Jahren vorgenommen.

Geplanter Gebäudestandort ist die nördliche Fläche des Hauptgebäudes des Reinoldus-Schiller-Gymnasiums. Die maximale Zuschauerzahl beträgt 199 Personen und liegt damit nicht im Geltungsbereich der Versammlungsstätten-Verordnung. Die Konstruktion von Wänden und Decken des Umkleieriegels sind massiv (Stahlbeton oder Mauerwerk nach statischen Erfordernissen). Die Stahltrapezprofile des Hallendaches werden von Fachwerkbindern (Stahl) getragen. Die Fassade der Halle wird in 170 mm dicken Sandwichpaneelen ausgebildet, so dass die Sporthalle einen zum Referenzgebäude nach EnEV 2009 in Verbindung mit DIN V 18599 40 % niedrigeren Endenergiebedarf Q_h, f aufweisen wird.

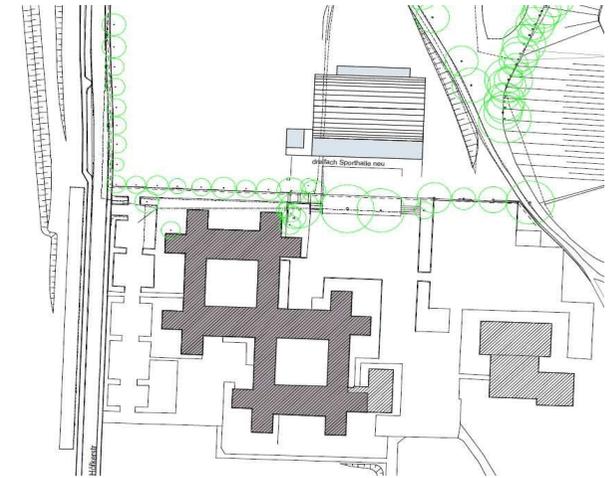

Kosten:

- Kostenschätzung 3.94 Mio. €
- Kostenberechnung 2.85 Mio. € (Vergabephase / Auftrag)

Aktuelles:

- Beschluss Rat Neubau per Funktionalausschreibung 21.07.2011
- Fertigstellung Auslobungsunterlagen StA 65 / Übergabe an StA 19 29.09.2011
- Veröffentlichung 21.10.2011
- Submission 20.01.2012
- Beauftragung in 11. KW
- gepl. Fertigstellung zum Schuljahreswechsel der Sommerferien 2013



Stand gem. Ablauforganisation Hochbaumaßnahmen



Sporthalle Goethe-Gymnasium Neubau

(Stadtbezirk Hörde)


- Goethe-Gymnasium ist Sportgymnasium NRW mit besonderer Ausstattung
- Bau einer neuen 3-fach-Sporthalle (80% Fördermittel)
- auch Vereinsnutzung
- Lage: nord-westlich der bestehenden Halle
- barrierefreie Nutzung
- Umkleide / Sporthalle haben eine Fläche von ~ 2600 m² (erhöhtes Raumangebot)
- die Konstruktion von Umkleide und Halle ist massiv
- das Dach der Halle ist aus Stahl
- Fassaden: Vormauerziegel, Faserzementplatten, Aluminiumfenster und Profilstabfenster

Kosten:


- 4.73 Mio € Diese Maßnahme wird zu 80 % vom Land gefördert.

Aktuelles:

- öffentliche Grundsteinlegung 20.9.2011
- Fertigstellung Rohbauarbeiten zum Ende 2011
- Fassade, Ausbau und Beginn der Montage technischer Gewerke seit Jan. 2012

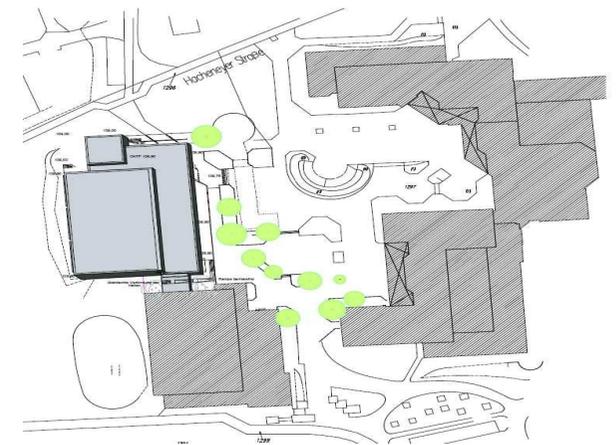

Stand gem. Ablauforganisation Hochbaumaßnahmen



NOE – Nutzerorientierte Ertüchtigung Turn- und Sporthallen

Bei den zu planenden Maßnahmen handelte es sich um eine nutzungsorientierte Ertüchtigung im wesentlichen bestehend aus:

- Erneuerung bzw. Instandsetzung des Sportbodens
- ggf. Aufbringung Spielfeldmarkierungen
- Erneuerung bzw. Instandsetzung Bodenbeläge
- Ersatz bzw. Instandsetzung der Tribünenanlage
- Instandsetzung Sportgeräte / fest
- Erneuerung bzw. Instandsetzung Estrich
- Erneuerung bzw. Instandsetzung Prallschutz
- Erneuerung bzw. Instandsetzung Tore
- Erneuerung bzw. Instandsetzung Innentüren und Außentüren
- ggf. Sanierung Sanitäranlagen
- ggf. Sanierung Umkleiden
- ggf. Anstrich Innenbereich

Wobei die dargestellten Leistungen auf die einzelnen abgestimmt wurden

Kosten:

- Spoha Renninghausen
- Spoha Nette
- Spoha Lütgendortmund

Fertigstellung:

- 495.000 € Februar 2012
- 525.000 € 1. Quartal 2012
- 710.000 € 2. Quartal 2012



Spoha Renninghausen



Spoha Nette



Spoha Lütgendortmund

Stand gem. Ablauforganisation Hochbaumaßnahmen



Brandschutz an Dortmunder Schulen (diverse Stadtbezirke)

Es handelt sich um bauliche Maßnahmen, die den vorbeugenden baulichen Brandschutz an den Schulen sicherstellen. Der Grad des vorbeugenden baulichen Brandschutzes wird vom Brandschutzsachverständigen in Absprache mit dem Eigentümer und der Bauordnung (letztendlich der Feuerwehr) gemäß DIN 4102 abgestimmt.

Der vorbeugende bauliche Brandschutz setzt sich aus zwei Bereichen zusammen:

1. Baulicher Brandschutz (Hochbau)

- Fluchtwegplanung mit Erstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges, z. B. durch Erstellung von außenliegenden Fluchttreppenanlagen, ggf. Schaffung einer neuen Grundriss-Situation
- bauliche Erstellung von Brandabschnitten (Erstellung von Brandwänden)
- Ertüchtigung oder Austausch von vorh. Wänden (z. B. Flurwände in der Qualität F30)
- Ertüchtigung oder Austausch von vorhandenen Deckenkonstruktionen (grundsätzlich F90-Qualität gefordert)
- Entfernung von Brandlasten aus Fluchtbereichen (z. B. Bodenbeläge, Abhangdecken etc.)
- Einbau von Rauchschutz- und Feuerschutztüren

2. Anlagentechnischer Brandschutz (TGA)

- Flucht- und Rettungswegbeleuchtung (Notbeleuchtung)
- Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) / Alarmierungsanlagen (Brandmeldeanlage und/oder ELA-Anlage) / Feststellanlagen für Rauchschutztüren / Brandschutzklappen in Lüftungskanälen / Verlegung von Unterverteilungen (ELT) in gesicherte Bereiche / Nachinstallation von Brandschotts

Kosten:

Die Kosten für die Einzelobjekte liegen zwischen 580.000 € und 5.3 Mio €

Das Gesamt-Bauvolumen für die anstehenden Maßnahmen beläuft sich auf ca. 67 Mio €


Fertigstellung:

Die Fertigstellungstermine der Einzelobjekte liegen zwischen Ende 2012 und Mitte 2015.

Aktuelles:

- Die Planungen für die Brandschutzsanierungen werden fortgeführt.
- Diverse Ausschreibungsverfahren laufen; einzelne Vergaben haben bereits stattgefunden.
- Die Installation von Datenkabeln wird parallel entsprechend Medienentwicklungsplan durchgeführt.
- Begleitmaßnahmen (BV, IH etc.) sind, soweit vorhanden, ebenfalls berücksichtigt.
- **Die Gremien werden noch vor der Sommerpause mit einem eigenständigen Sachstandsbericht zum Brandschutz informiert.**



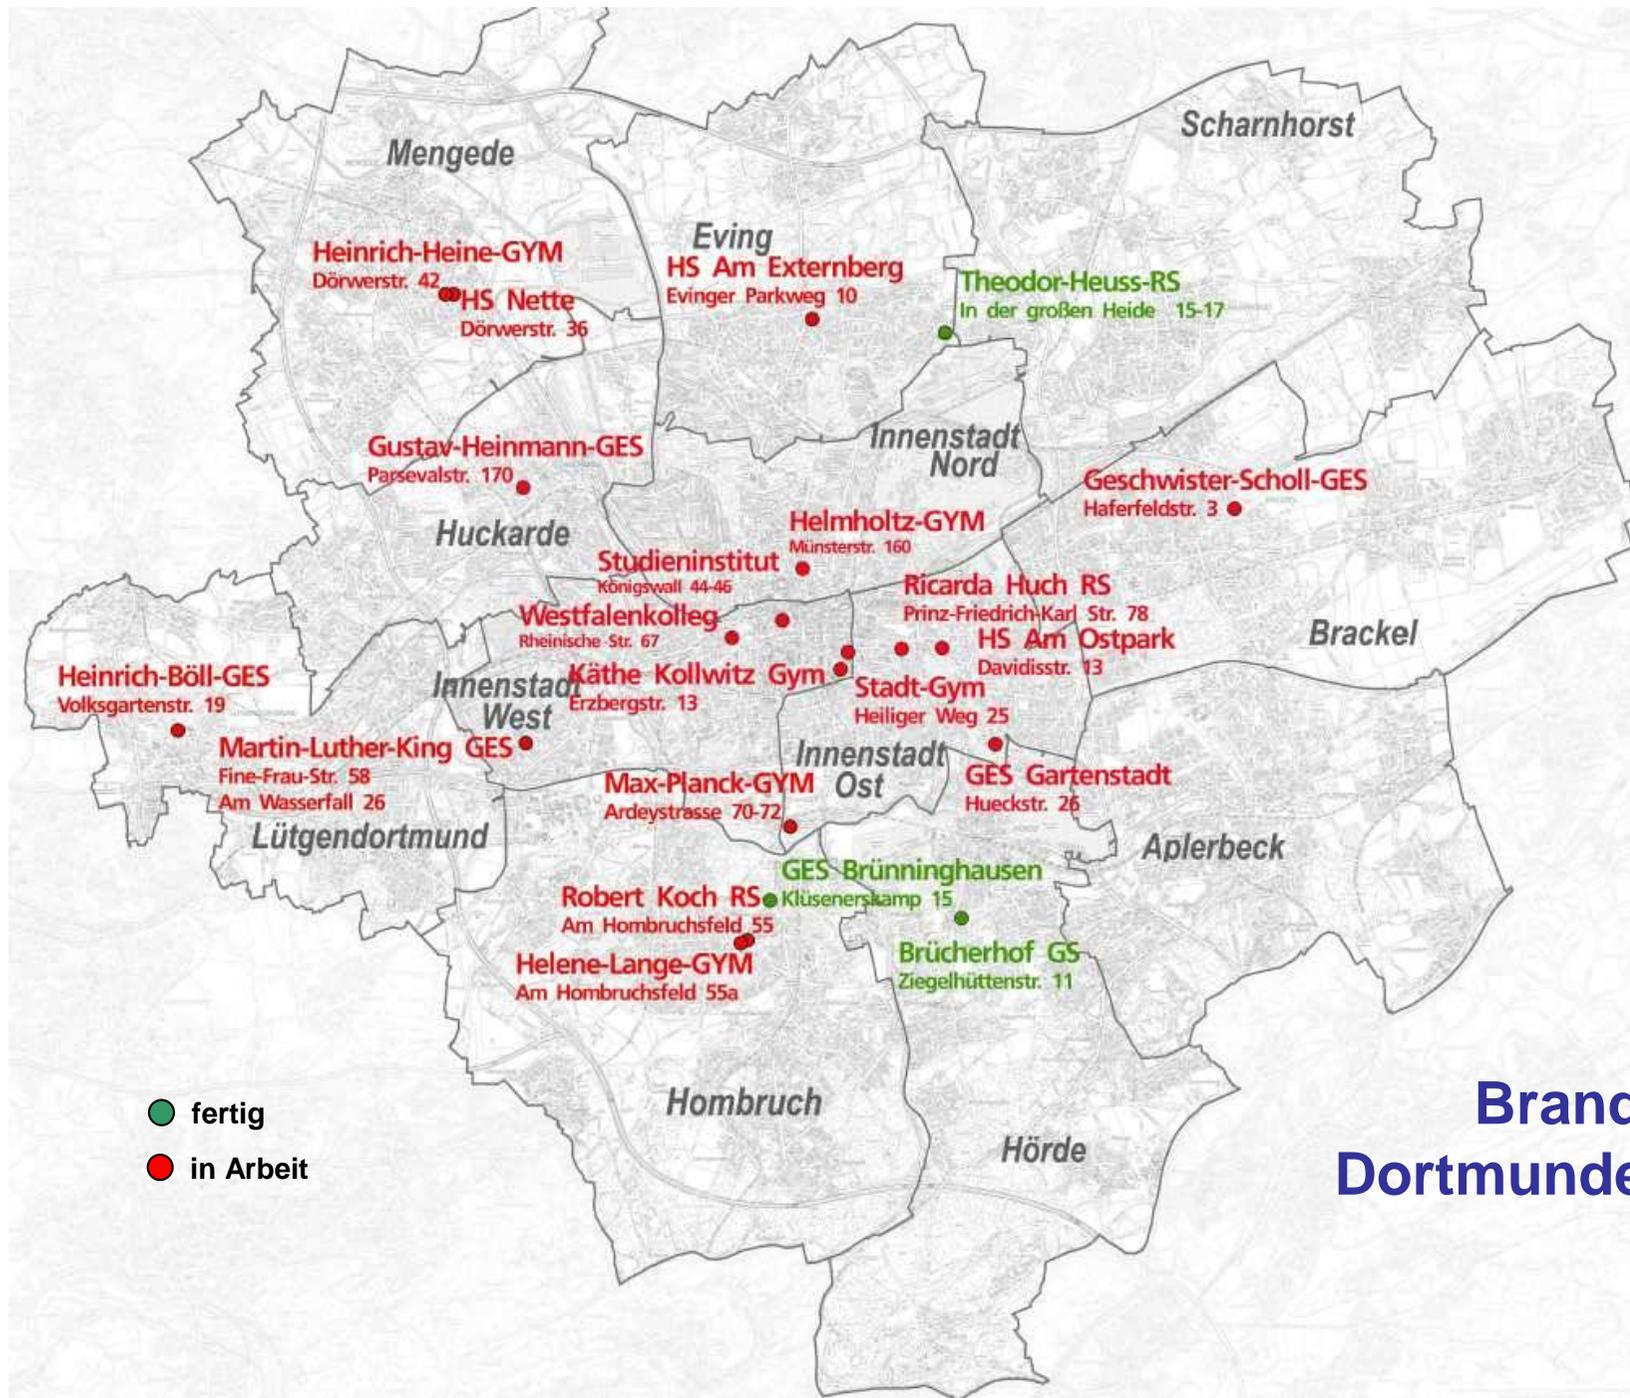

Brandschutz an Dortmunder Schulen





GES Scharnhorst Brandschutz einschl. Begleitmaßnahmen (Stadtbezirk Scharnhorst)

- Beginn der Maßnahme mit Block 1 im Dezember 2008
- Fertigstellung Block 1 im Sommer 2009
- Beginn der Planung Block 2 im Sommer 2011
- Brandschutzsanierung Block 2 - aktuell
- Sanierung Blöcke 3+4
- Datenverkabelung
- Sanierung Sporthallendach
- Behindertengerechte Ertüchtigung
- Erneuerung Fachraum Biologie
- Austausch der Bodenbeläge
- Fenster- und Dachsanierung Block 1

Kosten:

- Brandschutz **8.3 Mio. €**
- Begleitmaßnahmen **2.4 Mio. €**

Aktuelles:

- Die jetzt anstehenden Arbeiten liegen im Zeitplan und erfolgen in enger Abstimmung mit der Schulleitung
- Die vorgeschaltete Schadstoffsanierung ist zu 70 % abgeschlossen.
- Ausbau erfolgt derzeit (Elektro, HLS, Trockenbau, etc.)




Stand gem. Ablauforganisation Hochbaumaßnahmen



Instandhaltungsrückstellungen unter 250.000 €

Bezirk	Objekt	Maßnahme
Aplerbeck	Gerhard-Hauptmann GS	Sanierung der maroden Grundleitungen
Hombruch	Turnhalle Kirchhörder GS	Erneuerung Dachfläche Turnhalle
Innenstadt-West	Wilhelm Busch RS Sporthalle	Sanierung Trennvorhänge
Innenstadt-West	Petri GS	Erneuerung Türanlage (Glasfront neben der Türanlage des Haupteingangs)
Innenstadt-West	Reinoldus- Schiller- Gymnasium	Erneuerung Flachdachaufbau Turnhalle F23 (Begleitmaßnahme Brandschutz)
Innenstadt-West	Martin- Luther- King Gesamtschule	Dachsanierung Gebäude A (Begleitmaßnahme Brandschutz)
Innenstadt-West	Robert Bosch BK	Erneuerung Fördertechnik
Innenstadt Ost	Turnhalle GES Gartenstadt	Dachfläche Turnhalle 5 sanieren (Begleitmaßnahme Brandschutz)
Lütgendortmund	Marienborn Grundschule	Sanierung der Schulhofmauer
Lütgendortmund	Turnhalle Dellwig Schule	Sanierung der Dachfläche
Mengede	Hauptschule Westerfilde	Dacherneuerung
Scharnhorst	Hauptschule Husen	Grundleitungen Entwässerung
Scharnhorst	Sporthalle Gesamtschule Scharnhorst	Sporthalle Dach (Begleitmaßnahme Brandschutz)
Scharnhorst	Gesamtschule Scharnhorst	Bodenbeläge (Begleitmaßnahme Brandschutz)
Huckarde	Grafen Grundschule	Erneuerung der Toilettenanlage
Huckarde	Gustav Heinmann GES Sporthalle	Sanierung Trennvorhänge
Huckarde	Gustav- Heinemann-Gesamtschule	Dachsanierung (Begleitmaßnahme Brandschutz)

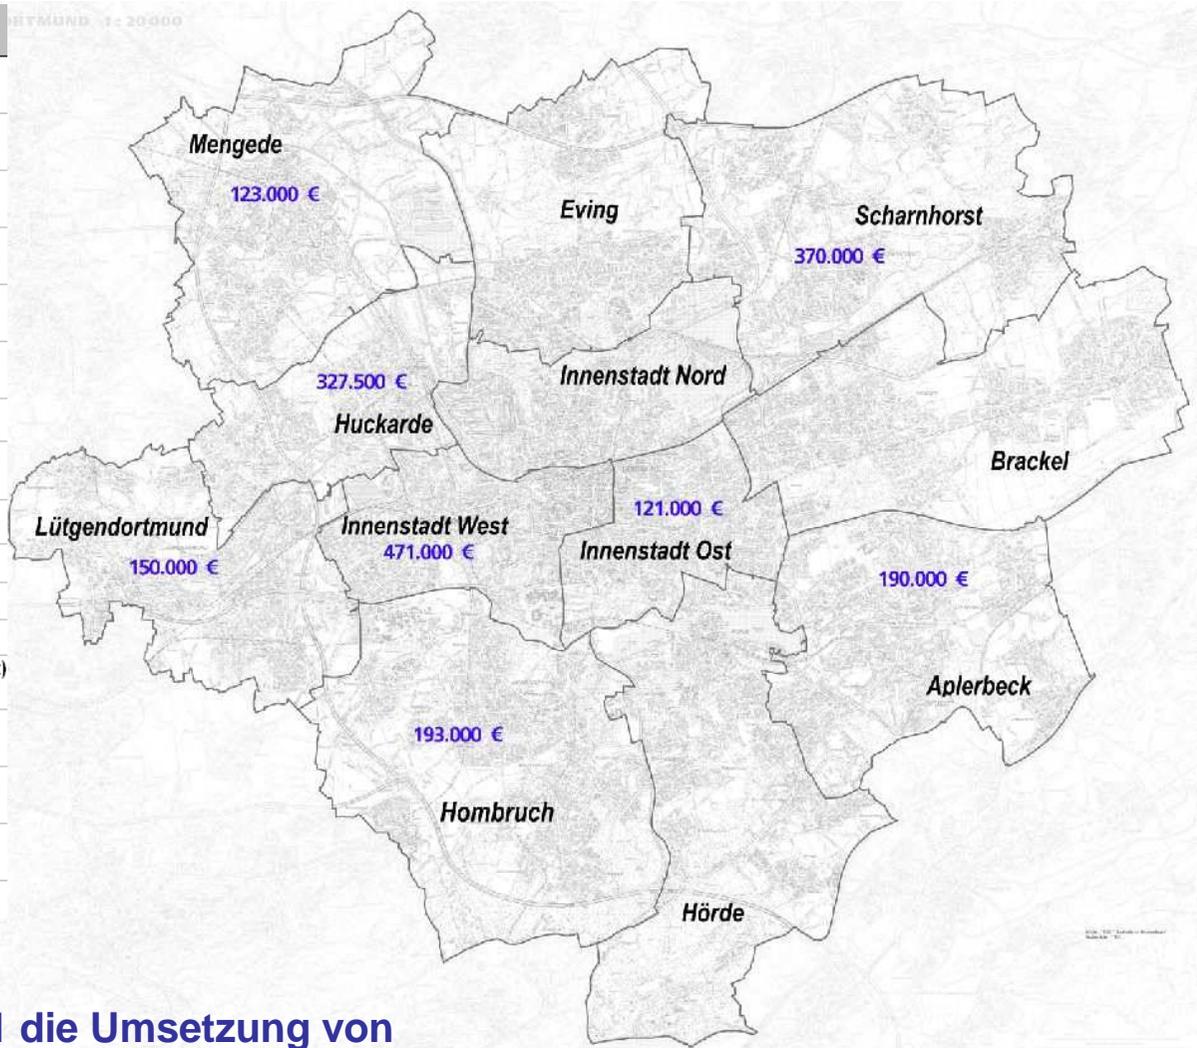


Der Rat der Stadt Dortmund hat am 21.07.2011 die Umsetzung von Instandhaltungsrückstellungen beschlossen (Drucksache Nr. 04255-11).



Instandhaltungsrückstellungen über 250.000 €

Bezirk	Objekt	Maßnahme
Aplerbeck	Sporthalle Gymnasium An der Schweizer Allee	Erneuerung der Dacheindeckung der Sporthalle
Eving	Sporthalle Heisenberg Gymnasium	Dachsanie rung (NOE wurde hier bereits durchgeführt)
Hombruch	Robert Koch RS	Erneuerung der Dachflächen (Begleitmaßnahme Brandschutz)
Hörde	Berufskolleg Hachene y Paul Ehrlich und Gisbert von Romberg	Nutzungsorientierte Ertüchtigung der Sporthalle
Hörde	Johann-Gutenberg-RS	Flachdachssanie rung (Begleitmaßnahme Brandschutz)
Innenstadt-Nord	Albrecht Brinkmann Grundschule Restfinanzierung Maßnahme 2010/ neu: Standort Schulzentrum Nord / Helmholtz-Gymnasium	Heizungsanlage Helmholtz-Gymnasium (Begleitmaßnahme Brandschutz)
Innenstadt Ost	Ricarda-Huch Realschule	Schulgebäude: Erneuerung Heizungsanlage, sämtlicher Rohrleitungen, Decken, Fußböden und Wänden in den Klassen; Turnhalle: Erneuerung Fenster, Hallenboden, Sanierung der Umkleide- und Duschbereiche
Innenstadt Ost	Ricarda-Huch RS	Aufstockung der bestehenden Rückstellun g
Mengede	Heinrich-Heine-Gymnasium (Begleitmaßnahme Brandschutz)	Sanierung Flachdach
Scharnhorst	Albert-Einstein-Realschule	Dachfläche über Verwaltung

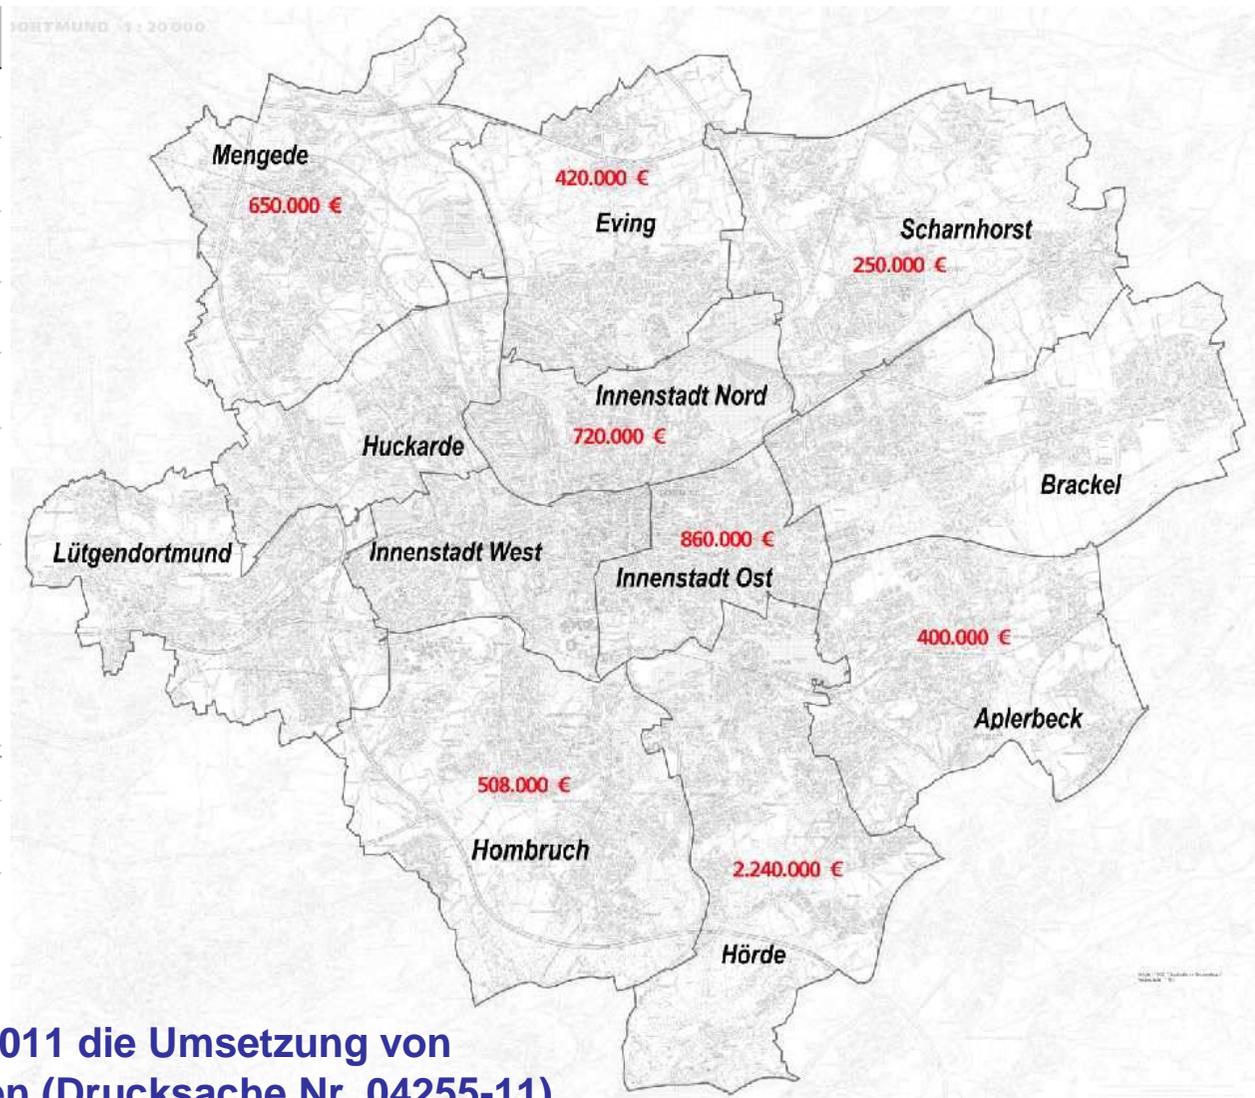


Der Rat der Stadt Dortmund hat am 21.07.2011 die Umsetzung von Instandhaltungsrückstellungen beschlossen (Drucksache Nr. 04255-11).



Bezirksvertretungsmaßnahmen an Dortmunder Schulen

Schulen nach Bezirken	Beschreibung	Summe BV	Summe IiH
Aplerbeck			
Aplerbecker GS (auch TH)		107.200 €	34.000 €
SZ + GYM Schweizer Allee SPOHA		181.250 €	
Busenberg GS		15.000 €	
Gerhard Hauptmann GS		800 €	
Brackel			
Immanuel Kant GYM TH		136.750 €	
Reichshof GS (auch TH)		41.563 €	
Fröbelschule TH		17.500 €	
Comenius GS		238.138 €	
Geschwister Scholl GES			63.750 €
Eving			
Brechtener GS (auch TH)		105.469 €	
Herder GS TH	JAP 2013		102.240 €
HS am Externberg TH		78.300 €	
Hörde			
Benninghofer GS TH		44.800 €	
Höchstener GS TH		15.000 €	
Wichlinghofer GS TH		28.000 €	
Johann Gutenberg RS			490.000 €
Phoenix GYM		34.000 €	
Weingarten GS		27.750 €	
SK Hörde	JAP 2013		388.750 €
Brücherhof GS TH		26.200 €	
Hombruch			
Robert Koch RS		87.840 €	
Helene Lange GYM		96.100 €	
Schubert GS		184.500 €	
Schulbiologisches Zentrum		11.700 €	
GES Brünninghausen	JAP 2013		200.820 €
Huckarde			
Grafen GS		20.000 €	
Wildey GS		39.840 €	
Innenstadt Nord			
Albrecht Brinkmann GS		120.000 €	
Gertrud Bäumer RS TH		186.000 €	
Heimholtz GYM (auch TH)		59.000 €	240.000 €
Lessing GS		33.750 €	
HS in der Landwehr		80.000 €	
Innenstadt Ost			
Landgrafen GS		142.800 €	
Libori GS TH		20.625 €	
Uhland GS TH		12.500 €	
GES Gartenstadt TH			200.625 €
Max-Planck GYM		31.740 €	
Winfried GS (auch TH)	JAP 2013		193.450 €
Kerschensteiner GS		43.200 €	
Innenstadt West			
Petri GS		54.500 €	
HS Innenstadt West		25.000 €	
Leibniz GYM SPOHA		33.000 €	110.000 €
Martin Luther King GES		108.000 €	210.000 €
Kreuz GS		30.000 €	
Wilhelm Röntgen RS	JAP 2013		130.000 €
Lüttgendortmund			
Holte GS TH		130.000 €	
Freiligrath GS		100.000 €	
Heinrich Böll GS			72.000 €
Mengede			
HS Westerflide		27.060 €	123.000 €
Heinrich Heine GYM		90.000 €	
Regenbogen GS	JAP 2013		
Scharnhorst			
Kirchdamer GS TH		203.000 €	275.000 €
GES Scharnhorst (auch SPOHA)		40.000 €	40.000 €
Elchwald GS TH	JAP 2013		43.750 €
Kautsky GS	JAP 2013		52.500 €
Buschel GS	JAP 2013		18.750 €
Siegfried Drupp GS	JAP 2013		

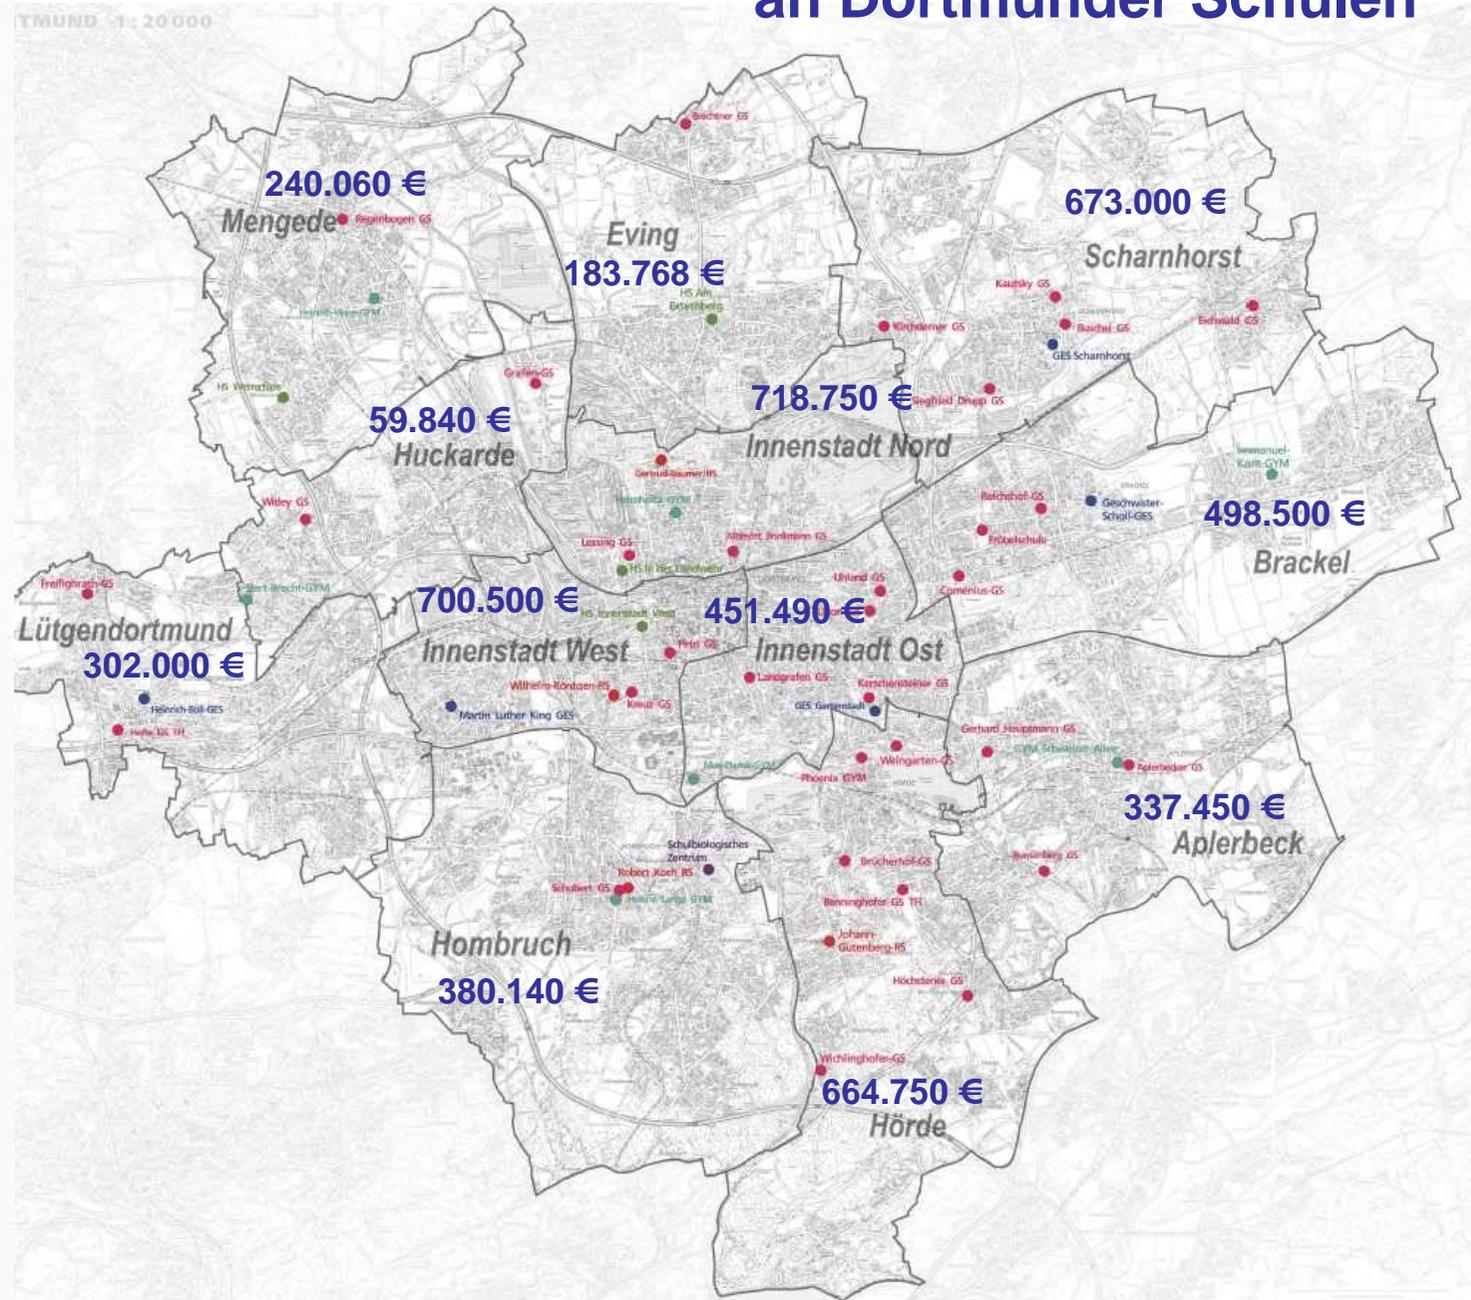

SchulA

Termine Quartalsberichte 2012

(SchulA)

QB1	28. März 2012 SITZUNG Schulausschuss
	23. Mai 2012 SITZUNG Schulausschuss
QB2	13. Juni 2012 SITZUNG Schulausschuss
QB3	26. September 2012 SITZUNG Schulausschuss
	7. November 2012 SITZUNG Schulausschuss
QB4	12. Dezember 2012 SITZUNG Schulausschuss

